



सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि
नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको)



नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु (स्वतःप्रकाशन) को विवरण
(२०८० वैशाख देखि असार मसान्तसम्म)



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
दरबारमार्ग काठमाडौं ।

विषय सूची

१.	पृष्ठभूमी	२
२.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य, एवं अधिकारहरु	२
३.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी	३
	३.१ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना	३
	३.२ कर्मचारीको दरबन्दी ववरण	४
४.	नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र नोडल अधिकृतको नामतथा टेलिफोन नं	५
५.	नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण	६
	५.१ प्रशासन निर्देशनालय	६
	५.२ अर्थ निर्देशनालय	९
	५.३ उत्पादन निर्देशनालय	१२
	५.४ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय	२१
	५.५ प्रसारण निर्देशनालय	४८
	५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	८६
	५.७ आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९४
	५.८ ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	११४
६.	ऐन, नियम एवं विनियमको सूची	१२२

१. पृष्ठभूमि :


विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण २०४२ साल भाद्र १ मा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयले संचालन तथा उत्पादन गरेको जम्मा जलविद्युत क्षमता ग्रिडमा जोडीएको ५७८.६२ मेगावाट र ग्रिडमा नजोडिएको ४.५४ मेगावाट गरी जम्मा जलविद्युत क्षमता ५८३.१६ मेगावाट, थर्मल विद्युत ५३.४१ मेगावाट, सोलार विद्युत २५ मेगावाट गरी जम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उत्पादित विद्युत ६६१.५७ मेगावाट छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू बाट ४७८.१ मेगावाट र निजि क्षेत्रको जलविद्युत १,४७७.०१ मेगावाट निजि क्षेत्रको सोलार विद्युत ६१.९४ मेगावाट र बगासबाटबाट उत्पादित ६ मेगावाट गरी नेपालमा जम्मा २,६८४.६२ मे.वा. विद्युत उत्पादन भएको छ । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू मार्फत आ.व. २०७९/०८० सम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५१,३४,०५८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरि ५६,४८,०४२ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।

२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम, कर्तव्य एवं अधिकारहरू :

- (क) विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।
- (क_१) प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने ।
- (ख) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली तथा तत् सम्बन्धी अन्य कार्यको योजना तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सबस्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धी सुविधाहरूको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।
- (ग) औद्योगिक, कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने।
- (घ) विद्युत महशुल बाहेक ग्राहकबाट मिटर जडान मिटर ठाउँसारी नामसारी क्षमता वृद्धि लगायतका सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने।
- (ङ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कार्य गर्ने, गराउने।
- (च) विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने।
- (च_१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक सल्लाह र परामर्श प्रदान गर्ने ।
- (छ) प्राधिकरणको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक अन्य कामहरू गर्ने, गराउने।

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचनातथा दरबन्दी :

३.१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना :

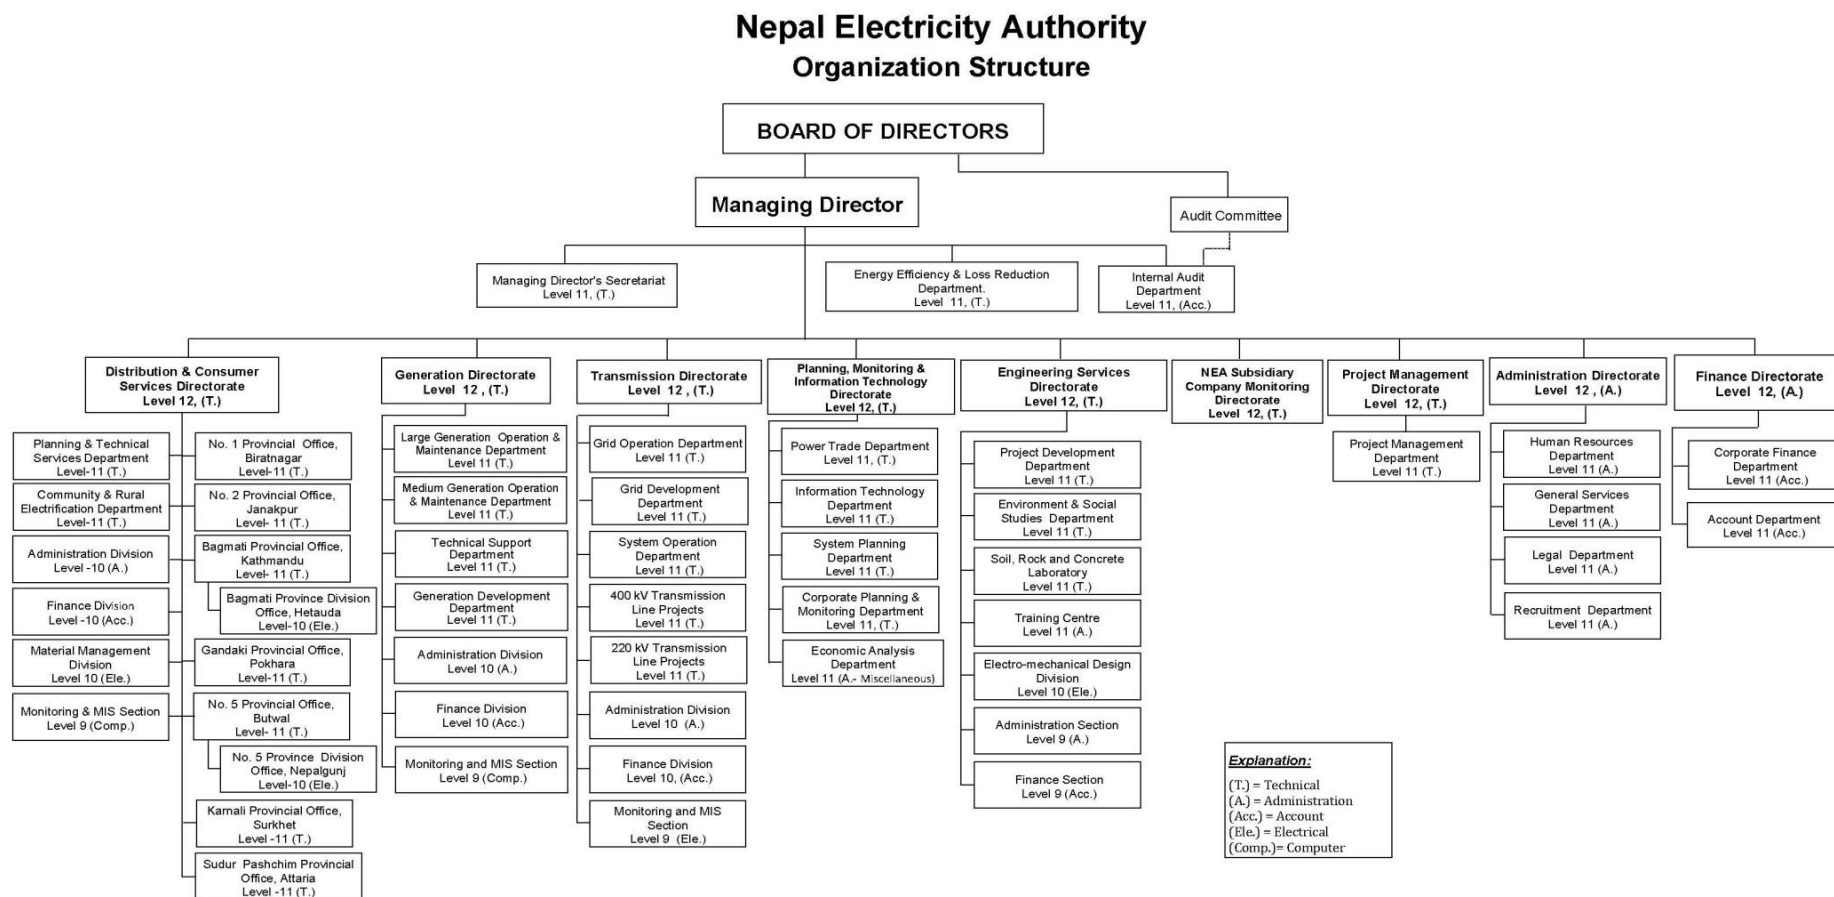

३.२. कर्मचारी दरबन्दी विवरण :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रशासन निर्देशनालय
जनसाधन विभाग
केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन शाखा
२०८० अषाढ मसान्त

पद	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			मौजुदा कर्मचारी		
		नियमित	आयोजना	जम्मा	स्थायी	म्यादी/करार/ ज्यालादारी कर्मचारी संख्या	जम्मा
कार्यकारी निर्देशक		१	०	१	१	०	१
उप कार्यकारी निर्देशक	(प्राविधिक/प्रशासन)	९	०	९	९	०	९
अधिकृत स्तर (तह ६ देखि ११ सम्म)	प्राविधिक	१२७६	११३	१३८९	१२०५	०	१२०५
	प्रशासन	५९७	२३	६२०	५८४	२	५८६
	जम्मा	१८७३	१३६	२००९	१७८९	२	१७९१
सहायक स्तर (तह १ देखि ५ सम्म)	प्राविधिक	६०८१	०	६०८१	४३५६	११७	४४७३
	प्रशासन	३३३३	०	३३३३	२४०७	९४	२५०१
	जम्मा	९४१४	०	९४१४	६७६३	२११	६९७४
	कुल जम्मा	११२९६	१३६	११४३३	८५६२	२१३	८७७५

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, र नोडल अधिकृतको नाम तथा टेलिफोन नं.

सि.नं.	पद	नाम	टेलिफोन नं.
१	कार्यकारी निर्देशक	श्री कुलमान घिसिङ	०१ ४१५३००७
२	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९
३	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री तारा प्रसाद प्रधान	९८५१३३७०६८
४	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री रामजी भण्डारी	०१ ४१५३०२५
५	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मनोज सिलवाल	९८५१२०२३६३
६	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री लोकहरी लुईटेल	०१ ४१५३११६
७	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री प्रदीप कुमार थिके	९८४१३५४६६४
८	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दिर्घायु कुमार श्रेष्ठ	९८४१२५१३१६
९	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिम्लीना	०१ ४१५३०१४
१०	प्रवक्ता	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	०१-५१९८१७६
११	सूचना अधिकारी	श्री भगवान ढकाल	०१ ४१५३०२२
१२	नोडल अधिकृत	पुनम जोशी	०१ ४१५३२१५

५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशनालयहरुको कार्य विवरण

५.१. प्रशासन निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्यमान ९ वटा निर्देशनालयहरु मध्ये प्रशासन निर्देशनालय पनि एक हो । यस निर्देशनालयको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक तह १२ (प्रशासन) बाट हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समग्र कर्मचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासन यसै निर्देशनालय अन्तर्गत संचालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यस निर्देशनालय अन्तर्गत जनसाधन विभाग, पदपूर्ति विभाग, सामान्य सेवा विभाग र कानून विभाग गरी चार वटा विभागहरु रहेका छन् । निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सामान्य सेवा विभाग अन्तर्गत जनसम्पर्क तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखामा यस आ.व. को चौथो त्रैमासिक सम्ममा जम्मा १२ वटा सूचना माग गरिएकोमा ११ वटा सूचना सम्बन्धित सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराईएको छ भने एउटा सूचना उपलब्ध गराउने प्रकृत्यामा छ । त्यसैगरी उक्त अवधिमा जम्मा ४६,२८५ वटा गुनासाहरु प्राप्त भएकोमा ४५,७४२ गुनासाहरु फछ्यौट भएका छन् भने ५४३ वटा गुनासाहरु फछ्यौटको प्रकृत्यामा रहेका छन् ।

५.१.१. प्रशासन निर्देशनालयका कार्यहरु :

प्रशासन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी, पारदर्शी, सहभागिता मूलक बनाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्न समग्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने सहयोगी निकायको रुपमा कार्यसम्पादन गर्दछ । त्यसका लागि यस निर्देशनालयले आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, अन्तर निर्देशनालय समन्वय तथा संचालक समितिका निर्णयहरु कार्यन्वयन गरी प्राधिकरणलाई सुशासनको मार्गमा डोच्याउने जमर्को गर्दछ । उपरोक्त बाहेक यस निर्देशनालयले सम्पादन गर्ने अन्य कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

१. पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य: प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा रिक्त हुन आएका पदहरुमा नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण तथा पद बाँडफाँड गरी लोकसेवा आयोगको सहमतीमा नयाँ नियुक्ति र बढुवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने, दरखास्त छानविन गर्ने, बढुवा सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्ने, आयोगबाट लिखित परिक्षाको परिणाम प्राप्त भएपछि मौखिक परिक्षा संचालन गर्ने र सफल उमेदवारहरुलाई नियुक्ति र बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने ।

२. जनसाधन सम्बन्धी कार्य: सिफारिश भै आएका नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीहरुको हाजिरी व्यवस्थापन, अभिलेखाङ्कन, विभागीय कारवाही तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने साथै कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी कार्य (विमा, औषधी उपचार खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन) गर्ने ।

३. सामान्य सेवा सम्बन्धी कार्य: देशभर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेका जग्गाहरुको अभिलेखाङ्कन तथा संरक्षण गर्ने, प्राधिकरणका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार Logistic Support

उपलब्ध गराउने, सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने, कार्यालय माल सामान खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, माग भएका सूचना उपलब्ध गराउने, प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गुनासो सुन्ने र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक भैपरि आउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने ।


४. कानून सम्बन्धी कार्य: नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरु, प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको बहस पैरवी गर्ने, प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई कानूनी सल्लाह उपलब्ध गराउने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विनियमावली, निर्देशिका आदिको निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी समग्र प्राधिकरणको कानूनी समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने ।

५.१.२. प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गतका विभागिय प्रमुखहरु र महाशाखा प्रमुखहरुका नाम तथा सम्पर्क नं. :

सि.नं	निर्देशनालय /विभाग/महाशाखा	पद	नाम	मोवाइल नं.	मेल ठेगाना
१	प्रशासन निर्देशनालय	उप-कार्यकारी निर्देशक	श्री तुलाराम गिरी	९८५११६८२१९	tularamgiri1@gmail.com
२	कानून विभाग	निर्देशक	वलराम सिलवाल	९८५११३५१३८	legal@nea.org.np
३	जनसाधन विभाग	निर्देशक	श्री शिव कुमार अधिकारी	९८५१०४५८३६	sadhikary361@gmail.com
४	पदपूर्ति विभाग	निर्देशक	श्री बेल प्रसाद शर्मा	९८५११७७९०७	belpdsharma@gmail.com
५	सामान्य सेवा विभाग	प्रमुख	श्री शिव प्रसाद आचार्य	९८४९३२६७४०	spacharya77@gmail.com
६.	कर्मचारी प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री तुलसी प्रसाद सापकोटा	९८४९६४९५३३	tulsisapkota2030@gmail.com
७.	बहुवा सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री चुमान सिंह के.सी.	९८४९५३१५०९	chumansinghkc@gmail.com
८	नियुक्ति सिफारिस महाशाखा	सह निर्देशक	श्री शोभा पौडेल भुसाल	९८४३७६६९४४	shobhapaudel22@gmail.com
९	कर्मचारी कल्याण महाशाखा	सह निर्देशक	श्री गोपाल प्रसाद पाठक	९८५११५८३३६	gopalpathak7@gmail.com
१०	कानून महाशाखा	सह निर्देशक	श्री रमेश कुमार घिमिरे	९८५११९८५९८	rameshkgchimire@yahoo.com
११	सामान्य प्रशासन महाशाखा	सह निर्देशक	श्री भगवान ढकाल	९८४५३६८६३०	Bhagwandhakal2031@gmail.com

५.१.३ संगठन संरचना:

Organisation Structure of Administration Directorate

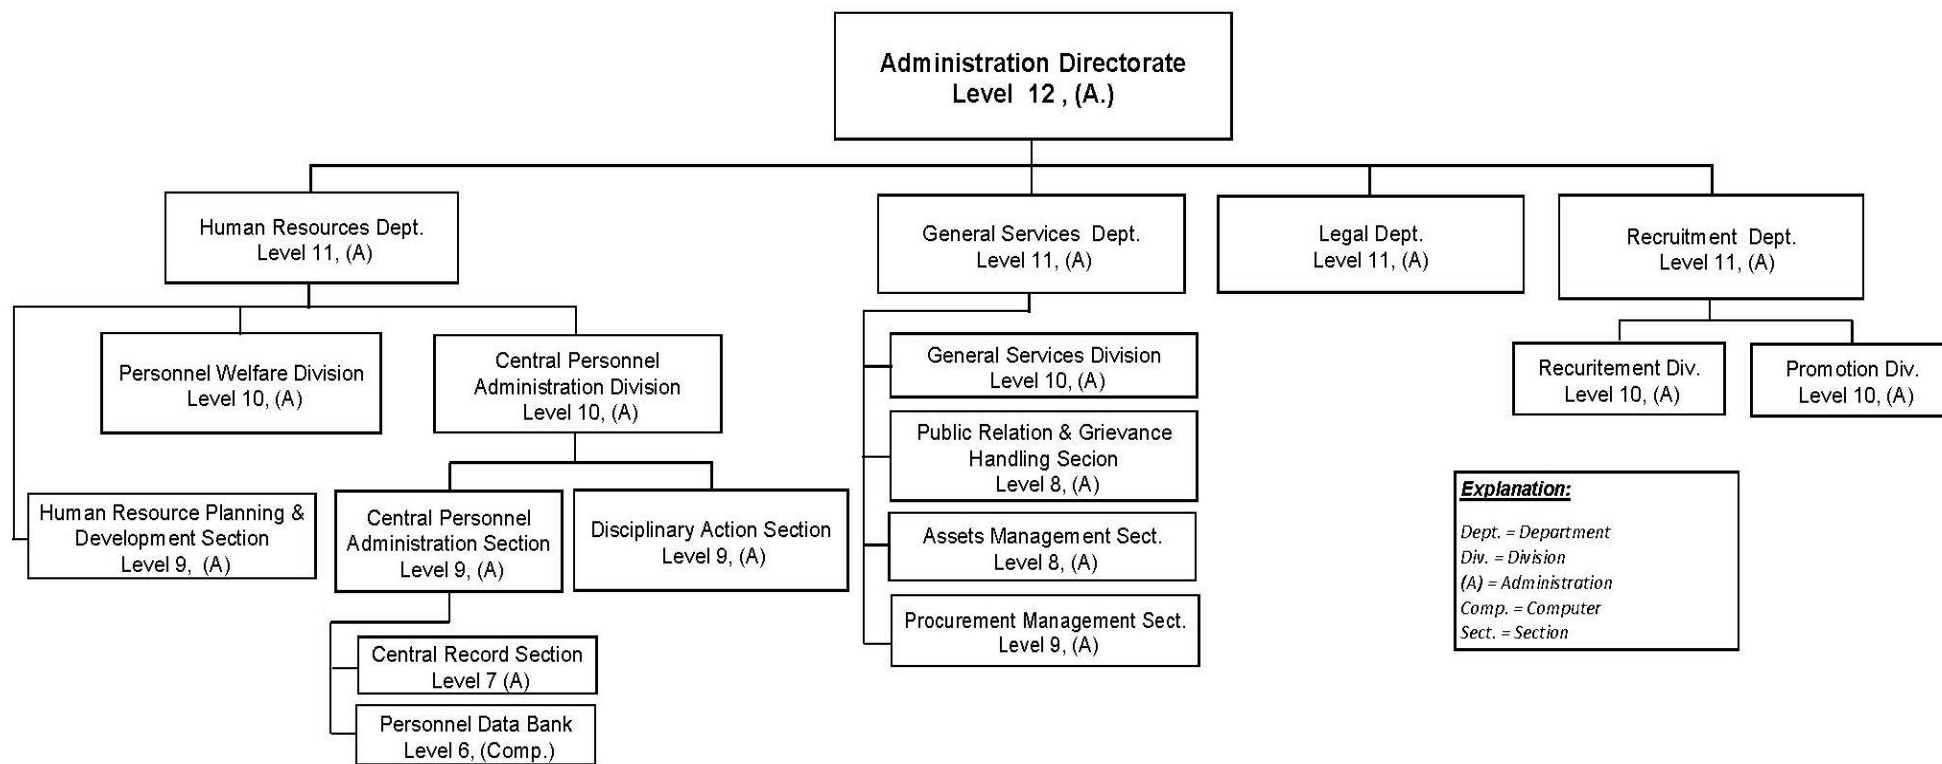

५.२. अर्थ निर्देशनालयः


५.२.१ अर्थ निर्देशनालयका कार्य :

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी सोको कार्यान्वयन, अनुगमन निरीक्षण तथा नियन्त्रण, आय व्यय विवरण तयारी तथा लगानी व्यवस्थापन सहित केन्द्रीय कोष संचालकको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने ।
२. यस निर्देशनालय अन्तर्गत संस्थागत वित्तीय विभाग र लेखा विभाग गरी दुई वटा विभाग रहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कोष संचालकका रुपमा रहेको संस्थागत वित्तीय विभागबाट आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भए अनुसार विभिन्न उत्पादन केन्द्र, प्रसारण केन्द्र, वितरण केन्द्र, विभाग र आयोजनाको वार्षिक बजेट तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृति गराई सो अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । सो कार्यान्वयनका क्रममा स्वीकृत बजेट अनुसारको बजेट निकासा गर्ने तथा सोको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न क्रियाकलापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण आय रकम केन्द्रीय कोषमा जम्मा गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
४. नेपाल सरकारबाट विकास बजेटका रुपमा प्राप्त हुने बजेट समेतको लगानी व्यवस्थापनका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुमा हुने शेयर तथा ऋण लगानीको पनि व्यवस्थापन गर्ने ।
५. लेखा विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने सम्पूर्ण आय व्ययको विवरण तयार गरी अर्ध-वार्षिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय विवरण तयार गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो क्रममा देखिएका बेरुजुहरु सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी फछ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्ने ।

५.२.२ संगठनात्मक संरचना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

अर्थ निर्देशनालयको संगठन तालिका

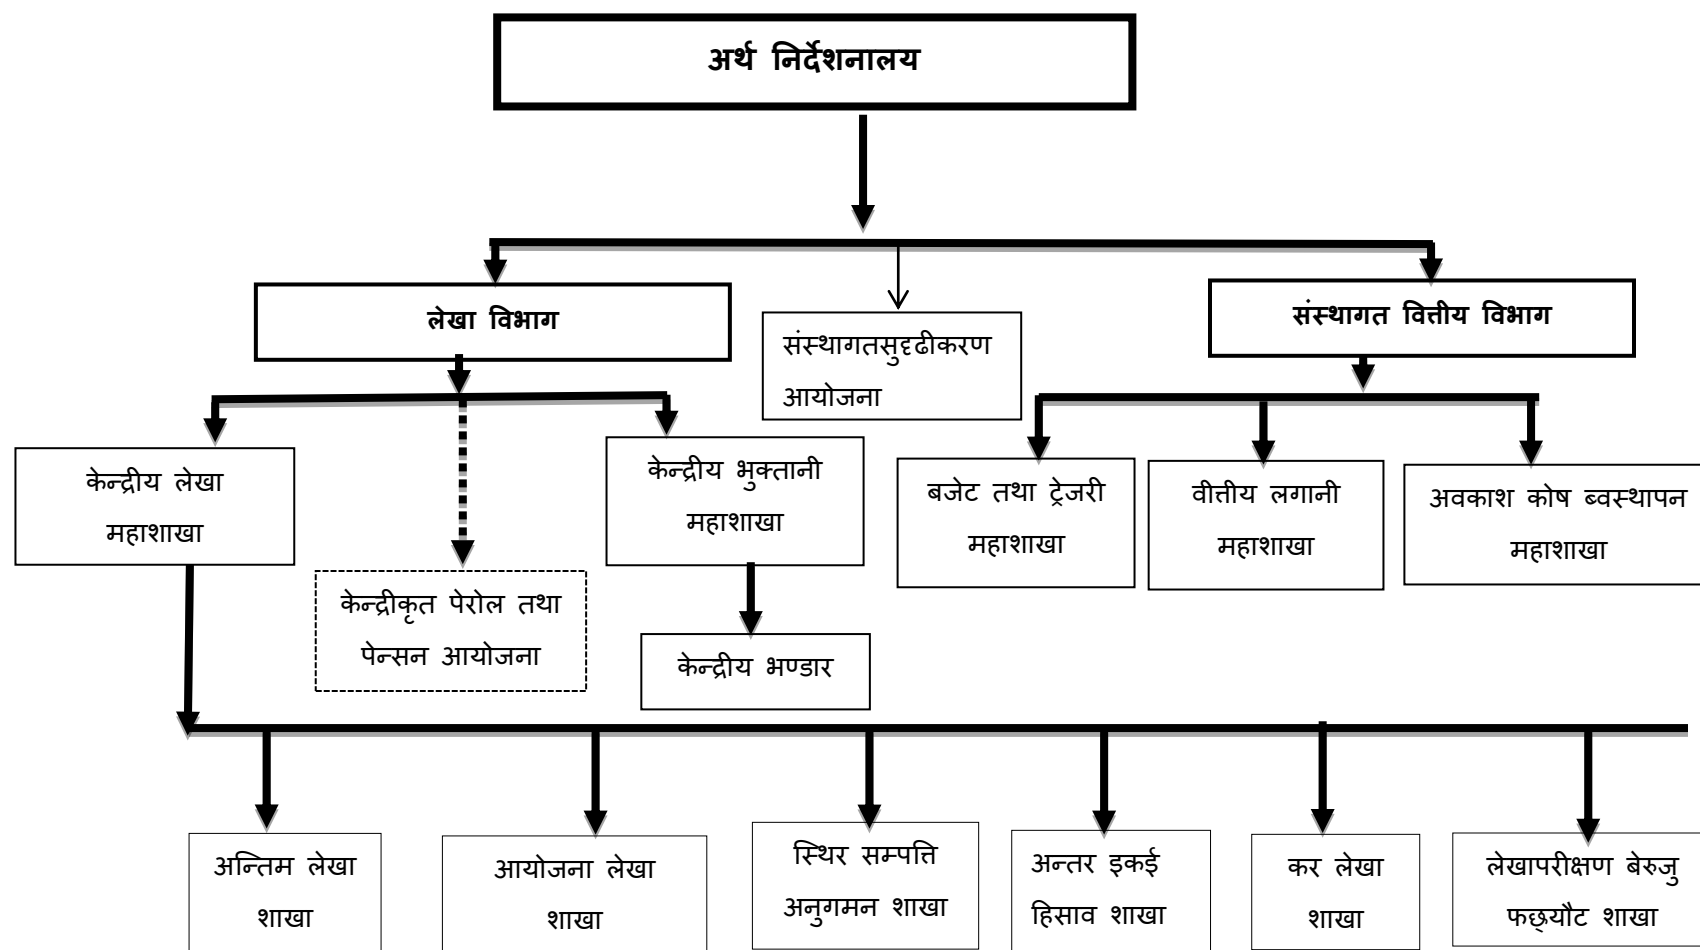

५.२.४. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७९/२०८० असार मसान्त सम्म भएका गतिविधिहरु

सि.नं.	कार्य विवरण	क्रियाकलाप
१.	नेपाल सरकार मार्फत विकास बजेट प्राप्त	आ.व.२०७९।८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म वैदेशिक तर्फ रु.२३ अर्ब ७७ करोड २३ लाख र नेपाल सरकार तर्फ ११ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख गरी कुल जम्मा रु.३५ अर्ब ५५ करोड ६६ लाख नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
	नेपाल सरकार मार्फत विकास बजेट खर्च	नेपाल सरकारबाट प्राप्त विकास बजेट अन्तर्गत चालू आ.व.२०७९।८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म विभिन्न आयोजना र ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि शेयर लगानी र ऋण लगानी समेत जम्मा रु.३५ अर्ब ५५ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ ।
	नेपाल सरकारको राजस्वमा दाखिला गरिएको रकम	आ.व. २०७९।८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म रोयल्टी वापत १ अर्ब ६३ करोड, व्याँज वापत ७ अर्ब ४४ करोड, अग्रिम कर वापत २ अर्ब ८३ करोड, साँवा वापत ४ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर वापत ४३ करोड र TDS वापत १ अर्ब ८६ करोड गरी जम्मा रु.१८ अर्ब १९ करोड नेपाल सरकारलाई भुक्तानी भएको छ ।
२	भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म १ अर्ब ३४ करोड ६० लाख युनिट विद्युत निर्यात गरी जम्मा रु. १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख विद्युत बिक्री वापत आम्दानी गरिएको छ ।
३	भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको विवरण	आ.व.२०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख युनिट आयात भई जम्मा रु. १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
४	नेपालका उत्पादकबाट खरिद	आ.व. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म ने.वि.प्रा.को सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरुबाट २ अर्ब ४८ करोड १० लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीहरुबाट ५ अर्ब ११ करोड ८० लाख गरी जम्मा ७अर्ब ५९ करोड ९० लाख युनिट खरिद गरी जम्मा रु. ४२ अर्ब १२ करोड रुपैया बराबरको रकम भुक्तानी भएको छ ।
५	विद्युत बिक्री वापतको आय रकम संकलन	आ.व. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म विद्युत बिक्रीवापत रकम संकलन गर्न विभिन्न संकलन केन्द्रहरुका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता भई विभिन्न वितरण केन्द्रहरुको विद्युत बिक्री रकम रु. १०० अर्ब ०३ करोड २० लाख रहेकोमा सो वापत नगद खुद संकलन रकम रु. ९६ अर्ब २८ करोड ३० लाख रहेको छ ।
६	बजेट तथा खर्च तर्फ	आ.व. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्तसम्म संचालन संभार खर्च तर्फ रकम रु.१ खर्ब ५ अर्ब ७ करोड ५० लाख खर्च भएको छ ।
७	आय-व्यय विवरण	आ.व.२०७९/०८० को २०७९ श्रावण देखि २०८० असार मसान्त सम्म व्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कुल आम्दानी रकम रु.१ खर्ब १७ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रहेकोमा जम्मा खर्च रु.१ खर्ब ५ अर्ब ७ करोड ५० लाख हुनगई अप्रशोधित नाफा (करकट्टी गनुअघि) रु.१२ अर्ब ३९ करोड ३० लाख हुने अनुमान रहेको छ ।

५.३. उत्पादन निर्देशनालय :


५.३.१. पृष्ठभूमी :

नेपाल हिमाल, पहाड र तराई सहितको भौगोलिक विविधता युक्त जलश्रोतको धनी देश भएकोले यहाँका नदी नालाहरुबाट प्रचूर मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको शुरुवात वि.स. १९६८ जेठ ९ गते फर्पिङ हाउसको सुरुवात भएको ११२ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा संचालनमा आएको ५०० कि. वा. क्षमताको जलविद्युत गृह नै नेपालको पहिलो जलविद्युत गृह हो । मुलुकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य विस्तार हुदै जाँदा कार्य विशिष्टिकरणका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशनालयहरु मध्ये उत्पादन निर्देशनालय पनि एक हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृह एवं Fuel Plant बाट आ.व. ०७९/८० को अन्त्य सम्म विद्युतकोकुल जडित क्षमता ६२७.०३ मेगावाट (Including large, Medium, small isolated, Thermal and solar power plants) रहेको छ । उत्पादन निर्देशनालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरुको संचालन संभार गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यको रेखदेख र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

२. निर्देशनालयका कार्यहरु :

- क) नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयंले प्रवर्धन गर्ने नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यको अनुगमन, व्यवस्थापन, निर्देशन लगायत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नको लागि कार्य प्रगतिको समिक्षा गर्दै आयोजना संचालनमा आइपर्ने समस्याहरुको निराकरणको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- ख) आयोजना संचालनमा वजेटको अभाव हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
- ग) निर्देशनालय अन्तर्गतका तापीय तथा जलविद्युत गृहहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
- घ) आवश्यकता अनुसार जलविद्युत गृहहरुको मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउने, वजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
- ङ) आफ्नो अन्तर्गतका जलविद्युत गृहहरु अधिकतम क्षमतामा संचालन गरी बढी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न पहल गर्ने ।
- च) जलविद्युत केन्द्रहरुको दक्षतापूर्वक संचालनको लागि आधुनिकीकरण गर्दै जाने।
- छ) जलविद्युत केन्द्रमा रहेका सम्पत्तिहरुलाई दीर्घकाल सम्म संचालन गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि गर्ने ।
- ज) उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि पुराना जलविद्युत केन्द्रहरुलाई सुदृढीकरण गर्दै लैजाने।
- झ) ज.वि.केन्द्रहरुमा नबिनतम सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै जाने ।
- ञ) निर्देशनालय मातहत रहेका भौतिक सम्पत्तिको अभिलेखिकरण तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- ट) निर्देशनालय मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

५.३.३.निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

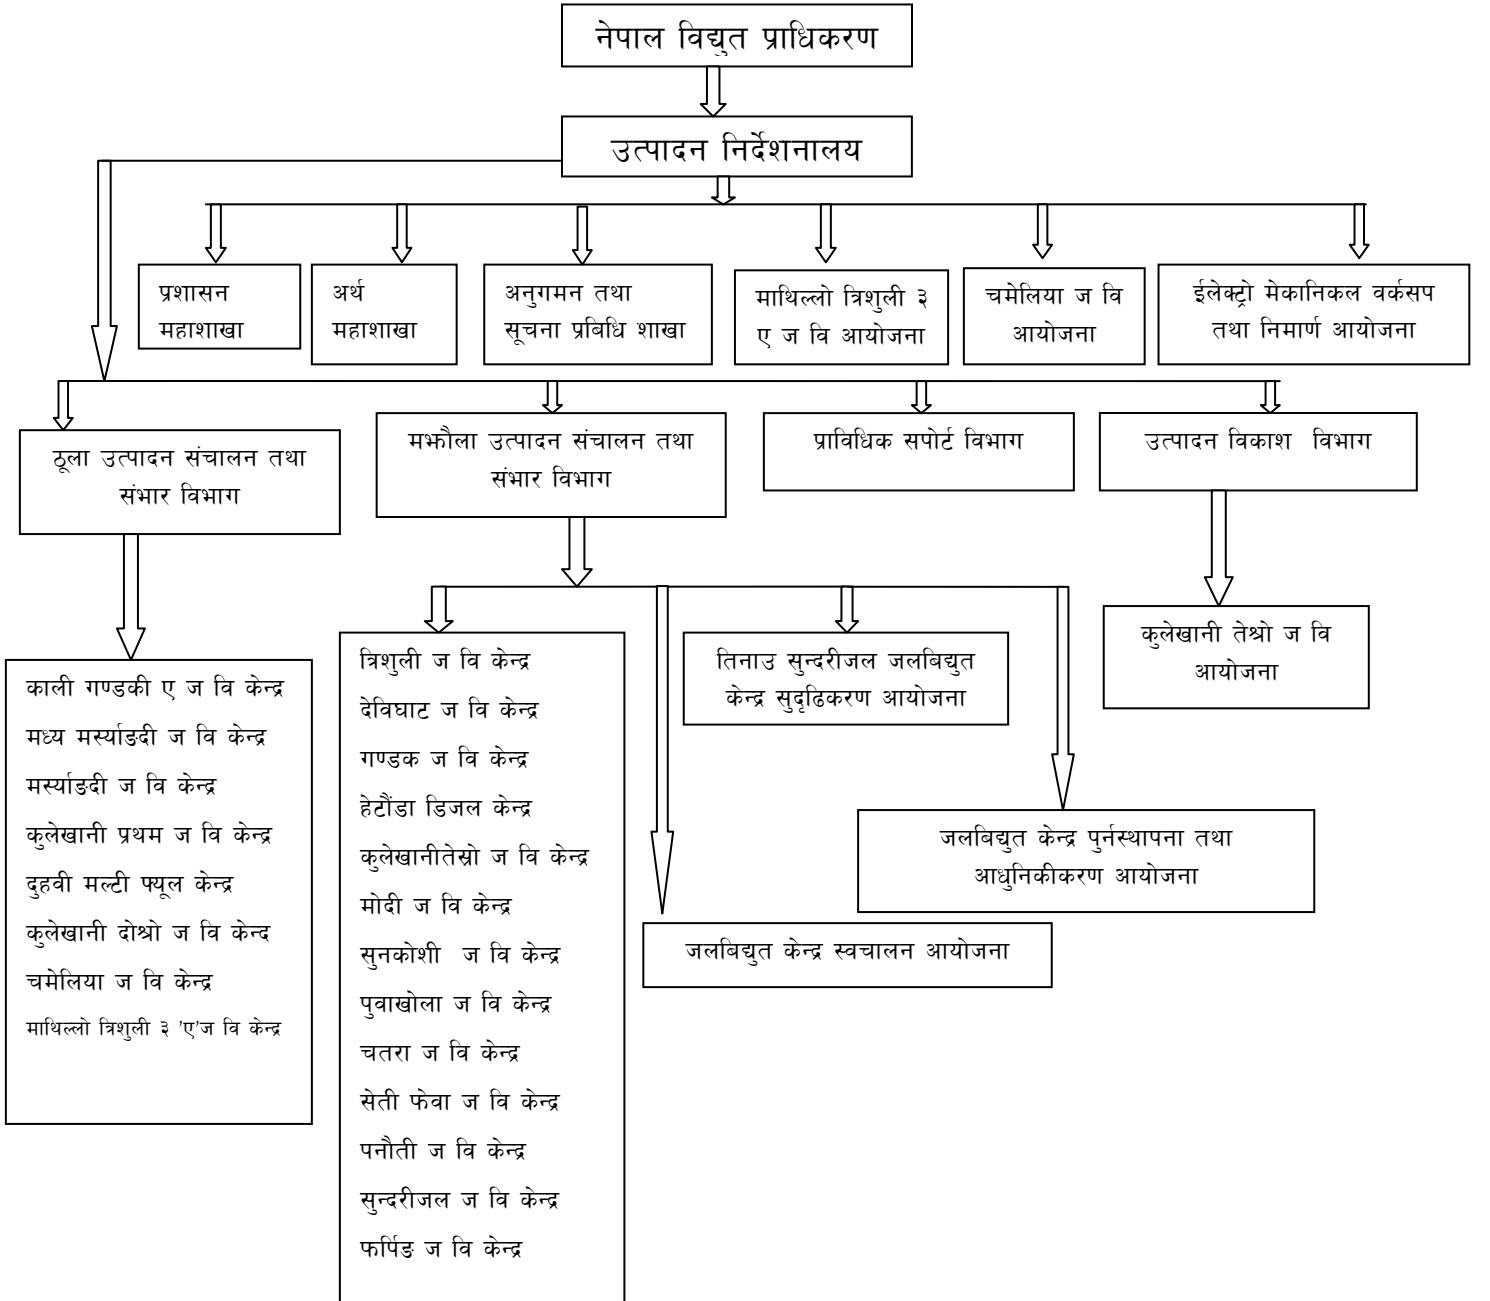

४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालय अर्न्तगत रहेका जलबिद्युत केन्द्र तथा आयोजनाहरुको जडित क्षमता निम्नानुसार छ :

क्र.सं.	बिद्युत केन्द्र तथा आयोजनको नाम	जडित उत्पादनक्षमता (मेगावाट)	कैफियत
१	कालीगण्डकी ए ज. वि. केन्द्र	१४४	
२	मध्य मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	७०	
३	मर्स्याङ्दी ज. वि. केन्द्र	६९	
४	कुलेखानी प्रथम ज. वि. केन्द्र	६०	
५	माथिल्लो त्रिशुली ३ए ज. वि.केन्द्र	६०	
६	दुहवी मल्टीप्यूल केन्द्र	३९	
७	कुलेखानी दोश्रो ज. वि. केन्द्र	३२	
८	चमेलिया ज. वि. केन्द्र	३०	
९	त्रिशुली ज. वि. केन्द्र	२४	
१०	हेटौडा डिजेल केन्द्र	१४	
११	कुलेखानी तेस्रो ज.वि. केन्द्र	१४	
१२	गण्डक ज.वि.केन्द्र	१५	
१३	मोदी ज. वि. केन्द्र	१४.८	
१४	देवीघाट ज. वि. केन्द्र	१५	
१५	सुनकोशी ज. वि. केन्द्र	१०.०५	
१६	पुवा खोला ज. वि. केन्द्र	६.२	
१७	चतरा ज. वि. केन्द्र	३.२	
१८	सेती फेवा ज. वि. केन्द्र	२.५	
१९	पनौती ज. वि. केन्द्र	२.४	
२०	सुन्दरीजल ज. वि. केन्द्र	०.९७	सुदृढीकरण गरी ९७० कि.वा. भएको ।
२१	फर्पिङ ज. वि. केन्द्र	०.५	

५. निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीको सम्पर्क नम्बर :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण						
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग, आयोजना तथा केन्द्रको नाम	निर्देशनालय,विभाग, केन्द्र आयोजना/प्रमुख	पद	कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क फोन नम्बर	कार्यालयको फोन नम्बर	कैफियत
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री मदन तिमिसिना	उपकार्यकारी निर्देशक	9851198345	4153014	
२	मझौला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री सन्तोष कुमार भा	प्रमुख	9841270356	4153017	
३	उत्पादन विकास विभाग विभाग	सच्चिदानन्द यादव	प्रमुख	9851052876	4153029	
४	ठूला उ. सं तथा संभार विभाग	श्री राम कुमार यादव	प्रमुख	9851052876	4153071	
५	प्राविधिक सपीट विभाग	श्री कपिलदेव मान्जन	प्रमुख	9846256116	4153047	
६	कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री पशुपतिराज गौतम	कार्यालय प्रमुख	9856018144	063-403081	
७	मध्य मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री पवन बस्नेत	कार्यालय प्रमुख	9856010073	066-400073	
८	मस्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रसन्नमुनी ताम्राकार	नि.कार्यालय प्रमुख	9841600345	065-540088	
९	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना	श्री सुरेश राउत	आयोजना प्रमुख	9851210400/ 9851115178	01-6227801	
१०	माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेश राउत	कार्यालय प्रमुख	9851210400/ 9851115178	01-6227801	
११	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री धिरेन्द्र चौधरी	कार्यालय प्रमुख	9855075030	057-419100	
१२	दुहवी मल्टीफ्यूल केन्द्र	श्री मोहम्मद सफिद	कार्यालय प्रमुख	9852062364	021-421243	
१३	कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत केन्द्र,	श्री प्रल्हाद राउत	कार्यालय प्रमुख	9855011545/984 3382277	057-419470	
१४	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सोव	कार्यालय प्रमुख	9851152658	014-153030	
१५	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	श्री राम कुमार यादव	संयोजक	9851052876	01-4153030	
१६	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री बाबुराजा महर्जन	कार्यालय प्रमुख	9851160992	010-561095	
१७	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री रमेश श्रेष्ठ	कार्यालय प्रमुख	9841507363	078-520782	
१८	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री शुनिल कुमार चर्तुवेदी	कार्यालय प्रमुख	9851167067	078-520782	

१९	मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री सुरेन्द्र कार्की	कार्यालय प्रमुख	9857690500/9855015003	067-410041	
२०	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	कार्यालय प्रमुख	9841335015	057-621417	
२१	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना	श्री सुभाष मिश्र	आयोजना प्रमुख	9851208257/ 9846256116	010-560803	
२२	ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्क्स तथा निर्माण आयोजना	श्री सुरज दाहाल	आयोजना प्रमुख	9851109474		
२३	जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना	श्री उमङ्ग कार्की	आयोजना प्रमुख	9841040624		
२४	सुनकोशी जलविद्युत केन्द्र	श्री हरिष चन्द्र धिताल	कार्यालय प्रमुख	9851214734/9851245580	027-520351	
२५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री शिवकुमार थापा	कार्यालय प्रमुख	9852620351	025-550077	
२६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहम्मद सफिद	कार्यालय प्रमुख	9852062364	011-410056	
२७	पनौती जलविद्युत केन्द्र	श्री सवीना उप्रेती	कार्यालय प्रमुख	9851224809/9841695194	061-551245	
२८	सेती (फेवा) जलविद्युत केन्द्र	श्री जीवन कार्की	कार्यालय प्रमुख	9856041245	4153032	
२९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंकनाथ पौडेल	कार्यालय प्रमुख	9841913700	2113210	

६. उत्पादन निर्देशनालय, विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा शाखाका सूचना अधिकारीको नामावली :-

उत्पादन निर्देशनालय र अर्न्तगतका सूचना अधिकारीहरु					
सि.न.	निर्देशनालय,विभाग र केन्द्र	सूचना अधिकारीको नाम	तह	पद	सम्पर्क फोन नं.
१	उत्पादन निर्देशनालय ठूला उत्पादन सं.तथा सं.विभाग मझौला उत्पादन सं.तथा सं. विभाग प्राविधिक सर्पोट विभाग उत्पादन विकास विभाग फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र	श्री राम प्रसाद रिमाल	६	स.प्र.अ.	९८५१०९६६७३
२	कालिगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र	श्री ज्ञानेन्द्र सुवेदी खत्री	७	प्रशासकीय अधिकृत	९७४८२११४१४
३	मध्य मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रविन कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(ईले)	९८४४४१०९६४
४	मर्स्याङ्गदी जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप रुपाखेती	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५२०२२२२०
५	कुलेखानी प्रथम जलविद्युत केन्द्र	श्री विनोद काफ्ले	७	इन्जिनियर(ईले)	९८६७०१५४५२

६	माथिल्लो त्रिशुली ३एज.वि.के.	श्री सर्वजित कुमार चौधरी	८	सहायक निर्देशक	९८४४०३९०६६
७	कुलेखानी दोश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री सन्तोष कुमार चौधरी	७	इन्जिनियर(मेका)	९८५२०७५६६६
८	चमेलिया जलविद्युत केन्द्र	श्री पुरन सौँव	९	स.प्रबन्धक(मेका) केन्द्र प्रमुख	९८५११५२६५८
९	त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र	श्री राज कुमार परियार	६	स.प्रशासकीय अधिकृत	९८५१३१४७७०
१०	देवीघाट जलविद्युत केन्द्र	श्री मुकेश रेग्मी	७	इन्जिनियर(मेका.)	९८६०१८४५६०
११	मोदिखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री गणेश खनाल	५	मि.रि.सु.भा.	९८४६१०७४९६
१२	गण्डक जलविद्युत केन्द्र	श्री मोहन पण्डीत	५	मि.रि.सु.भा.	९८४४२१८७४४
१३	कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत केन्द्र	श्री प्रदिप सिंह	८	स.प्रबन्धक(मेका)केन्द्र प्रमुख	९८५५०१२४१७
१४	सुनकोशि जलविद्युत केन्द्र	श्री श्यामहरि पौडेल	६	स. प्रशासकीय अधिकृत	९८४१२०१८७४
१५	पुवाखोला जलविद्युत केन्द्र	श्री अशोक कुमार दास	६	स.इन्जिनियर (मेका)	९८६२१६१९२९
१६	चतरा जलविद्युत केन्द्र	श्री घनश्याम घिमिरे	५	मि.रि.सु.भा.	९८६२३३८००९
१७	पनौति जलविद्युत केन्द्र	श्री अर्जुन गौतम	५	मि.रि.सु.भा.	९८४१८१२७०८
१८	सेतिफेवा जलविद्युत केन्द्र	श्री रञ्जना कट्टेल रेग्मी	५	मि.रि.सु.भा.	९८४६०३४२००
१९	सुन्दरीजल जलविद्युत केन्द्र	श्री टंक नाथ पौडेल	६	स.इन्जिनियर(मेका)	९८५६०२६४०६

७.उत्पादन निर्देशनालय मातहत संचालित आयोजनाहरु :

- माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजना हाल DLP मा संचालनमा रहेको (केन्द्रस्थापना भैसकेको) ।
- कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत आयोजना TOC जारी हुन बाँकी (केन्द्र स्थापना भैसकेको) रहेको ।
- ईलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कसप तथा निमार्ण आयोजना ।
- जलविद्युत केन्द्र स्वचालन आयोजना

८.नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्बन्धित ऐन, एवं विनियमको सूची

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४

९. अन्य प्रासंगिक ऐनहरु तथा नीतिहरु

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

- ग) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- घ) श्रम ऐन, २०७४
- ङ) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- च) वन ऐन, २०७६
- छ) जलविद्युत विकास नीति, २०५८
- ज) जलस्रोत नीति, २०७७

१०.नियमावली/विनियमावली :

- क) विद्युत नियमावली, २०५०
- ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
- ग) नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ (संसोधन सहित)

११. अन्य प्रासंगिक नियमावली

- क) जलश्रोत नियमावली, २०५०
- ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- ग) वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
- घ) श्रम नियमावली, २०७५

१२. सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कामको विवरण :

➤ Kaligandaki A Hydropower Station

- Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
- Repair and Maintenance Stator Earth Fault Problem of Generator-1.
- Repairing and maintenance of Hydraulic and Gate Structures.

➤ Middle Marsyangdi Hydropower Station

- Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
- Repair and maintenance of generator circuit Breaker and slip rings.
- Repair maintenance of oil circulation system and dewatering system.

➤ Marsyangdi Hydropower Station

- Repair & Maintenance of all dam site gates and hydraulic structure.
- Repair and maintenance of GIS compressed air system.
- Repair and maintenance/replacement of shaft seal.

➤ Kulekhani -1 Hydropower Station

- Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
- Repair and maintenance of nozzle, seat ring, deflector and other equipment.
- Installation of vacuum circuit breakers.

- Oil filtering of power transformer.
- Inspection/Testing of 66kV substation and its maintenance.
- Installation of OPGW cable from Reservoir to Powerhouse.
- **Upper Trishuli 3A Hydropower Station**
 - Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
 - Major repair works with 7 days of plant shutdown.
 - Repair/Replacement of Bearing oil coolers.
- **Kulekhani -2 Hydropower Station.**
 - General Inspection and Maintenance Works.
 - Repair and maintenance of MIV of Unit-1.
 - Installation of transformer and Generator Protection works.
 - Replacement of gate valves in Rapti intake.
 - Replacement of control cables in 132kV Switchyards.
- **Chameliya Hydropower Station**
 - Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
 - Repairing of Cooling water system pipeline.
 - Repair and maintenance of GCB, 132kV switchyards.
- **Trishuli Hydropower Station**
 - Overhauling works.
 - Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
 - Repairing of Excitation system.
- **Devighat Hydropower Station**
 - Condition Monitoring and Inspection of Power Plant.
 - Repair and Maintenance of AVR/Governor control system.
- **Modikhola Hydropower Station**
 - Repairing and maintenance of Main Intake gate.
 - Desander/Regulating pond flushing works.
 - Repair and Maintenance of unit/Governor controlsystem.
- **Gandak Hydropower Station**
 - Repair maintenance of gates and other intake structures.

- Repair maintenance of oil circulation system and water filtration system.

➤ **Sunkoshi Hydropower Station**

- General Inspection and Maintenance Works
- Repair and Maintenance of unit/Governor controlsystem.

➤ **Kulekhani-3 Hydropower Station**

- General Inspection and Maintenance Works
- Replacement of busbar and other necessary equipment in 132kV switchyard.
- Replacement of Generator Circuit Breaker.

➤ **Puwakhola Hydropower Station**

- Rectification works of Penstock.
- Overhauling works, Repairing of generator air cooler.
- Construction of store and management of scrap materials.

➤ **Setifewa Hydropower Station**

- Overhauling works.
- Replacement of Main Inlet Valve.

➤ **Panauti Hydropower Station**

- Reservoir and waterways clearing works.
- Rectification of PLC problem and operation of a unit which was close for a year.

५.४. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय :

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय आम विद्युत उपभोक्ताहरूलाई स्तरीय विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि केन्द्रीत रहने गर्दछ । यस निर्देशनालयले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय तथा २ वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहेका मुलुकभरका १२९ वितरण केन्द्रहरू तथा तिनका उप वितरण केन्द्र र फ्युज सेवाहरू मार्फत विद्युत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । साथै २३ वटा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत वितरण लाइन तथा वितरण सबस्टेशनहरू विस्तार गर्ने र स्तरोन्नतिको कार्य गर्दै आएको यस निर्देशनालयमा २ वटा विभाग तथा ३ वटा महाशाखाहरू रहेका छन् । यस निर्देशनालयमा विद्युत प्राधिकरणका कुल जनशक्तिको करिब ६७.४३ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । मुलुकको करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य गर्न सफल यस निर्देशनालयले मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्रहरू मार्फत आ.व. २०७९/०८० सम्म ने.वि.प्रा. तर्फका ५१,३४,०५८ र सामुदायिक विद्युत सहकारी संस्था तर्फका ५,१३,९८४ समेत गरी ५६,४८,०४२ ग्राहकहरूलाई विद्युत सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । आ.व. २०७९/०८० असार मसान्तसम्म ९,३६,५४,०८,००० युनिट विद्युत विक्रि भएको र सो वापत रु.९३,०९,००,००,००० महशुल संकलन भएको छ ।

५.४.१. निर्देशनालयका कार्यहरू :

यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निम्न बमोजि मकार्य संचालन गर्दै आएको छ ।

क) प्रशारण सम्बन्धि कार्य:

- १) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन संभार र मर्मत गर्ने ।
- २) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ३) ३३/११ के.भी. सबस्टेशन स्तरोन्नती सम्बन्धि संपूर्ण कार्य ।
- ४) ११ के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ५) वितरण लाइन निर्माण गर्न डिजाइन, लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने साथै संचालन, संभार मर्मत गर्ने ।

- ६) विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफरमरहरु (पावर तथा वितरण) खरिद गर्न लागत अनुमान, बोलपत्र फारम तयार तथा ठेकेदार छनौट गरी खरिद गर्ने साथै जडान, संभार र मर्मत गर्ने ।
- ७) उपरोक्त संरचना निर्माण गर्न जग्गा आवश्यक भएमा जग्गा प्राप्ती सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्य गर्ने ।

ख) वितरण सम्बन्धि कार्य:

- १) ग्राहकहरुबाट प्राप्त बिद्युतको माग फारम लिने ।
- २) माग फारमको आधारमा बिद्युत जडानको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ३) लागत अनुसार रकम लिइ मिटर जडान गर्ने र लाइन चालु गर्ने ।

ग) महशुल संकलन:

- १) स्थायी, अस्थायी तथा घुम्ती काउण्टर खडा गरी बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- २) विभिन्न बैंकहरु मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।
- ३) ई सेवा मार्फत बिद्युत महशुल तथा अन्य दस्तुर संकलन गर्ने ।

घ) ग्राहक सेवा सम्बन्धि:

- १) मासिक रुपमा मिटर रिडिङ गर्ने ।
- २) नामसारी र ठामसारी सम्बन्धित कार्य ।
- ३) बिद्युत शक्तीको क्षमता स्वीकृत एवं परिवर्तन सम्बन्धि कार्य ।
- ४) ग्राहकको विवरण राख्ने तथा अध्यावधिक गर्ने कार्य ।
- ५) ग्राहकको वर्गिकरण सम्बन्धि कार्य ।
- ६) मिटर रिडिङ गरेको ६० दिनभित्र पनि ग्राहकले महशुल भुक्तानी नगरेमा बिना सूचना बिद्युतको लाइन काट्ने ।

ड) रिचार्जबल सम्बन्धि कार्य:

- ग्राहक वा कुनै संघ संस्थाको माग अनुसार बिद्युत प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धि कार्यहरु यस कार्यालय मार्फत गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुर लिई गरिने कार्य ।

च) बिद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ र बिद्युत चोरी नियन्त्रण विनियमावली २०५९ मा तोकिए बमोजिमका कार्यहरु:

- १) कसैले अनाधिकृत रुपमा बिद्युतको उपयोग गरेमा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
- २) बिद्युत चोरी गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कानून बमोजिम कारबाहि गर्ने ।
- ३) बिगो र जरिवाना असुल उपर गर्ने ।
- ४) चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था अबलम्बन गर्ने ।

छ) क्षतिपूर्ति विनियमावलीमा उल्लेख गरिएका कार्यहरु:

- १) यस कार्यालयको कारणले बिद्युत दुर्घटना हुन गै जनधनको क्षति हुनगएमा छानबिन गर्ने ।
- २) छानबिनबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ठहरेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने वा सिफारिस गर्ने ।
- ३) बिद्युत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र जन धनको क्षति हुनबाट बचाउने ।


ज) सामुदायिक ग्रामिण बिद्युतिकरण विनियमावली, २०७१ ले तोकिए बमोजिमका कार्यहरु:

- १) वितरक संस्थाबाट प्रस्तावप्राप्त गर्ने ।
- २) प्रस्तावहरु ने.बि.प्रा.को प्रचलित मापदण्ड बमोजिम छ, छैन हेर्ने ।
- ३) डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गर्ने ।
- ४) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण गर्ने ।
- ५) मापदण्ड पुरा भएका संस्थाहरुलाई नियमानुसार बिद्युत वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी दिने ।

झ) गुनासो व्यवस्थापन कार्य:

- १) संघ संस्था वा ग्राहकहरुको गुनासो वा सुझाव प्राप्त गर्ने ।
- २) गुनासो उपर छानबिन गर्ने ।
- ३) छानबिनको आधारमा समस्याको समाधान गर्ने वा कारबाही गर्ने ।

५.४.२ वि.ग्रा.से. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

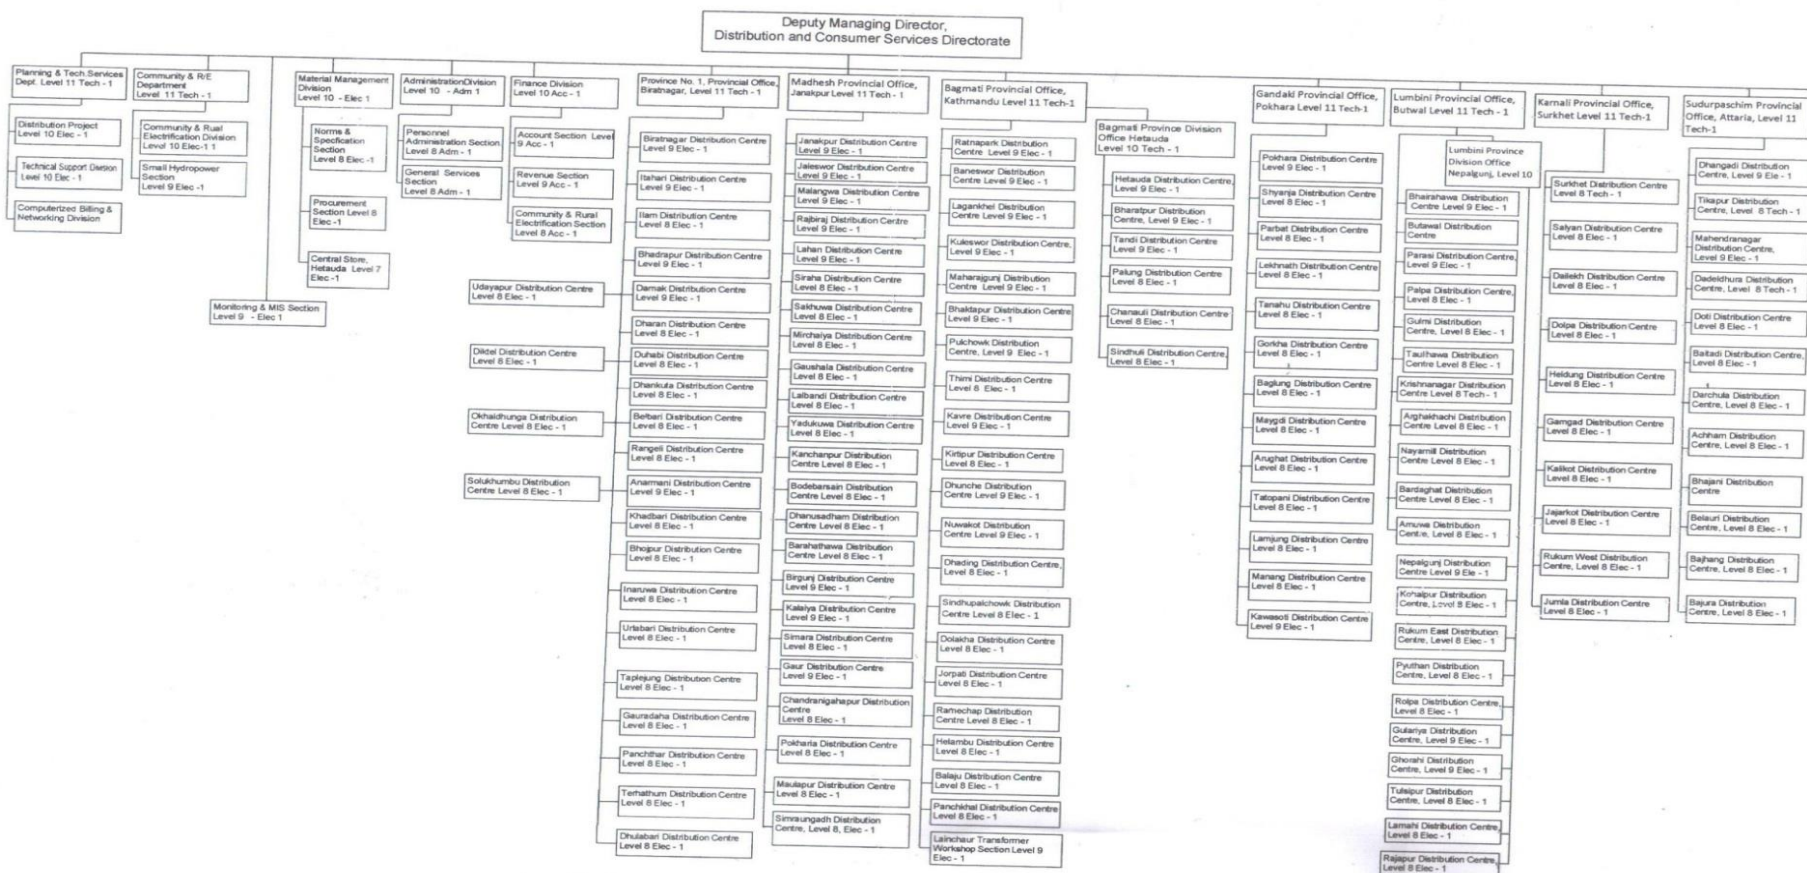

५.४.३. निर्देशनालय, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, वितरण केन्द्र प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुको विवरण:

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय

क्र.स.	कार्यालय	कार्यालय प्रमुखको नाम	सम्पर्क नं.		सूचना अधिकारीको नाम/पद	मोबाईल नम्बर	इमेल ठेगाना
			मोबाइल नं.	कार्यालयको नंबर			
१	वितरण तथा ग्राहक सेवा नि.	उपकार्यकारी निर्देशक, मनोज सिलवाल	९८५१२१२०९२	१४१५३१४५	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	dcs@nea.org.np
२	योजना तथा प्रा.सेवा विभाग	निर्देशक, अच्युत बाबु घिमिरे	९८५१०२४०२१	१४१५३१५८			planningtech@nea.org.np
३	सामुदायिक ग्रामिण वि.विभाग	प्रमुख, विक्रम कुमार अमात्य	९८५१००६६२६	१४३६००५७	प्र.अ. कृष्ण प्रसाद पन्त	०१४९६०६६५ / ९८५११९८५५८	community@nea.org.np
४	प्रशासन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	१४१५३०५०	सह निर्देशक चुडामणि आचार्य	९८५१२३४१४७	dcs@nea.org.np
५	अर्थ महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	१४१५३१४२	सह निर्देशक, तोमलाल सुवेदी	९८५१२७३२०९	dcs.finance@nea.org.np
६	जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	१४१५३१५२	प्रबन्धक केदार राज सिलवाल	९८५१०९९४५९	mmddcsd@gmail.com
७	कम्प्युटराईज्ड विलिङ्ग तथा नेटवर्क महाशाखा, वि.ग्रा.से.नि.	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	१४१५३१७६	उप प्रबन्धक रविन्द्र श्रेष्ठ	९८५११५७४२८	billing@nea.org.np
क)	प्रदेश नं. १, प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगर	उमेश कुमार भ्ना	९८५२०७९६६६	०२१-४३६०५७	प्र.अ. नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	biratnagar.ro@nea.org.np
१	विराटनगर वितरण केन्द्र	सरोज कुमार साह	९८५२०२१७२५	०२१-५२१२०६	ई. सुरेश कुमार सिंह	९८५८०५१३६७	biratnagar@nea.org.np

२	इटहरी वितरण केन्द्र	नविन कुमार लाभ	९८५२०८०८४१	०२५-५८३४५९	ई. रविन्द्र कुमार दास	९८५२०२२११२	itahari@nea.org.np
३	भद्रपुर वितरण केन्द्र	राममणि बजगाई	९८५२६३०६६६	०२३-४५५६११	ई. नरेन्द्र कुमार साह	९८५२६३००६६	bhadrapur@nea.org.np
४	गौरादह वितरण केन्द्र	धिरेन्द्र बजगाई	९८५२६८५५००	०२३-४८०३४७	प्र.प्र. भुमि प्रसाद तिवारी	९८४२६३७९७६	gauradaha@nea.org.np
५	दमक वितरण केन्द्र	परितोष कुमार चौधरी	९८५२६८२७९७	०२३-५८११६९	स.प्र.अ. पूर्ण कुमार चौहान	९८५११९९०७०	damak@nea.org.np
६	इनरुवा वितरण केन्द्र	अभिनव भ्ना	९८५२०७००००७	०२५-५६१९६१	स.ई. विपिन कुमार कायस्थ	९८५२०४९५३५	inaruwa@nea.org.np
७	रंगेली वितरण केन्द्र	शशिकान्त तिवारी	९८५२०८०६५०	०२१-५८०६५३	प्र.प्र. शुशिल कुमार भट्टराई	९८५२०३४६००	rangeli@nea.org.np
८	अनारमणी वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार राय	९८५२६४६१७१	०२३-५४६६५८	स.प्र.अ. दिपक ढकाल	९८५२६६५०३७	anarmani@nea.org.np
९	दुहवी वितरण केन्द्र	राम उदगार साह	९८५२०४७६६६	०२५-५४०४०३	ई. विजय कुमार सिंह	९८४९१२०२९५	duhabi@nea.org.np
१०	उर्लाबारी वितरण केन्द्र	पवन कुमार साह	९८५२०४४१४०	०२१-५४१४७२	सु.भा. रविन्द्र कुमार यादव	९८६२३४४९९४	urlabari@nea.org.np
११	उदयपुर वितरण केन्द्र	विजय बाबु खत्री	९८५२८३५६६८	०३५-४२०६२९	स.प्र.अ. देवी बहादुर राई	९८६२९६४३८२	udaypur@nea.org.np
१२	इलाम वितरण केन्द्र	विजली प्रसाद यादव	९८५२६२००५४	०२७-५२१४१७	ई. सरोज चौधरी	९८४१९५०१७२	illam@nea.org.np
१३	धनकुटा वितरण केन्द्र	प्रल्हाद पोखरेल	९८५२०७०००९१	०२६-५२००९१	मि.रि.सु.भा. दिपक गुरुङ्ग	९८५२०५०४९८	dhankuta@nea.org.np
१४	धरान वितरण केन्द्र	साजन महर्जन	९८५२०६२४२१	०२१-५२०४२१	प्र.प्र. अशोक बोगटी	९८५१२१७३३७	dharan@nea.org.np
१५	बेलबारी वितरण केन्द्र	दिपक सापकोटा	९८५२०४६०८६	०२१-४३४३२५	स.प्र.अ. नागेन्द्र कुमार श्रेष्ठ	९८४२०३७२२३	belbari@nea.org.np
१६	भोजपुर वितरण केन्द्र	राम बाबु चौधरी	९८५२०५२३७७	०२९-४२०७५२	मि.रि.सु.भा. सावित्रा बाह्रकोटी	९८५२०६५१४९	bhojpur@nea.org.np
१७	खाँदबारी वितरण केन्द्र	संजिव कर्ण	९८५२०९९५८८	०२९-५६००७८	सि.मि.रि. राजन श्रेष्ठ	९८६२९५८०८७	khadbari@nea.org.np
१८	तेह्रथुम वितरण केन्द्र	प्रतिश ढकाल	९८६२३५९८००	०२६-४१०१११	व.स. उमेश कुमार पण्डित	९८४२९९९५२५	terathum@nea.org.np
१९	ताप्लेजुङ्ग वितरण केन्द्र	प्रदिप कुमार शर्मा	९८४७६७५८१३	०२४-४६११०२	सि.मि.रि.देव नाथ मण्डल	९८०७०३५७७३	taplejung@nea.org.np

२०	पांचथर वितरण केन्द्र	राम आषिष साह	९८५२६८४१७७	०२४-५२००२३	सु.भा. सरोज यादव	९८४२४७०७२७१	panchthar@nea.org.np
२१	दिक्तेल वितरण केन्द्र	विजयराज रेग्मी	९८५५०११६३६	०३६-४२०७५१	व.स. श्यामनन्द चौधरी	९८४२८२५३३२	diktel@nea.org.np
२२	ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्र	ईश्वर कुमार श्रेष्ठ	९८५२८४२२६८	०३७-५४०२०५	सि.मि.रि. बाबुराम पन्थी	९८५२८४४४२६	okhaldhunga@nea.org.np
२३	सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र	दिपक कुमार दाहाल	९८५२६७२३२१	०३८-५२०२२६	प्र.प्र. शान्तिलाल खतिवडा	९८४२८५७५३२	solukhumbu@nea.org.np
२४	धुलावारी वितरण केन्द्र	सुनिल कुमार महतो	९८५२६६१९९९	०२३-५६०१२१	व.स. खेम प्रसाद खतिवडा	९८४२४१२३३५	dhulabari@nea.org.np
ख)	मधेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुर	मुनिन्द्र ठाकुर	९८५४०२४४७८	०४१-४२४०७८	प्र.अ. रविन्द्र कुमार आले	९८४०२६०००९	janakpur.ro@nea.org.np
२५	जनकपुर वितरण केन्द्र	लखन लला मल्लिक	९८५४०२२६१४	०४१-५२१६१४	ई. अरुण साह	९८५१०८८४६५	janakpur@nea.org.np
२६	जलेश्वर वितरण केन्द्र	गजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५४०३२३१०	०४४-५२०१६६	प्र.प्र. कुशल कुमार चौधरी	९८४२१६४२८५	jaleshwor@nea.org.np
२७	मलंगवा वितरण केन्द्र	उमेश कुमार यादव	९८५४०६५७७७	०४६-५२०३३६	स.ई. रामानन्द कुमार सिंह	९८४४४२०६००	malangawa@nea.org.np
२८	राजविराज वितरण केन्द्र	मधुसुदन यादव	९८५२८२१४५९	०३१-५२०४५९	ई. विमल प्रसाद साह	९८४९१२००९६	rajbiraj@nea.org.np
२९	लाहान वितरण केन्द्र	हिमांशु कुमार यादव	९८५२८३३६४६	०३३-५६०६४६	ई. राजीव साह	९८४१५३०८४७	lahan@nea.org.np
३०	सिराहा वितरण केन्द्र	राम अयोध्या राय यादव	९८५२८२२२०३	०३३-५२०११५	ई.उदय कुमार कर्ण	९८५२८४४२०३	siraha@nea.org.np
३१	सखुवा वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२६३४१	०४१-५४०४६१	ई. राकेश साह	९८६०००६४७५	sakhuwa@nea.org.np
३२	मिर्चैया वितरण केन्द्र	मनोज कुमार शर्मा	९८५२८३६५०९	०३३-५५०५०९	प्र.प्र. हरिओम कुमार मानन्धर	९८४२८८५३३६	mirchaiya@nea.org.np
३३	गौशाला वितरण केन्द्र	प्रविण कुमार मिश्र	९८५४०३१५६२	०४४-५५६१६५	प्र.प्र. चन्द्रदीप यादव	९८४४२९७३५०	gaushala@nea.org.np
३४	लालबन्दि वितरण केन्द्र	संजिव कुमार साह	९८५४०६६७७७	०४६-५०१७२९	ई. विशाल श्रेष्ठ	९८०३७४००७४	lalbandi@nea.org.np
३५	यदुकुवा वितरण केन्द्र	गोपाल कुमार ठाकुर	९८५४०२४३३३	०४१-४१०००९	ई. अशेश्वर कुमार यादव	९८५४०२४३३३	yadukuha@nea.org.np

३६	कञ्चनपुर वितरण केन्द्र	अरुण कुमार साह	९८५२८६००६९	०३१-५६०१५९	सु.भा. राजेन्द्र प्रसाद साह	९८४२८२२०४०	kanchanpur@nea.org.np
३७	बोदेबर्साइन वितरण केन्द्र	रुपेश कुमार यादव	९८५२८२३४५९		प्र.प्र. कुनाल चौधरी	९८४५०९८५७१	bodebarsain@nea.org.np
३८	धनुषाधाम वितरण केन्द्र	रोशन कुमार सिंह	९८५४०२३०५६	०४१-४१४०७३	सु.भा. भवेश मिश्र	९८४३०१७३२४	dhanusadham@nea.org.np
३९	बरहथवा वितरण केन्द्र	त्रिभुवन कुमार यादव	९८५४०५०४१५		ब.स. ललीत कुमार चौधरी	९८५२८३३६६०	barahathawa@nea.org.np
४०	विरगञ्ज वितरण केन्द्र	अवधेश कुमार दुवे	९८५५०२६०३४	०५१-५२२०५०	ई. सिताराम साह	९८५५०२४४३४	birgunj@nea.org.np
४१	कलैया वितरण केन्द्र	ऋषि कुमार वरनवाल	९८५५०४४९१७	०५३-५५०५९१	मि.रि.सु.भा. राजकुमार पुडासैनी	९८४३२६३३९१	kalaiya@nea.org.np
४२	सिमरा वितरण केन्द्र	रुमेश रुपाखेती	९८५५०२१०६६	०५३-५२१०६६	प्र.प्र. उद्धव घिमिरे	९८४५८६११८९	simara@nea.org.np
४३	गौर वितरण केन्द्र	विजय महतो	९८५५०४४७७०	०५५-५२१५६६	ई. राम नाथ साह	९८५५०७०९६७	gaur@nea.org.np
४४	चन्द्रनिगाहपुर वितरण केन्द्र	धिरेन्द्र कुमार यादव	९८५५०४१८८२	०५५-५४०२८२	ई. धिरज विक्रम चौधरी	९८६६६६०८५८	chandranigahapur@nea.org.np
४५	पोखरिया वितरण केन्द्र	जगन्नाथ भ्वा	९८५५०३८६४४	०५१-५६०००५	प्र.प्र. सुरेश मुखिया	९८६९५६१६९५	pokharia@nea.org.np
४६	मौलापुर वितरण केन्द्र	राम दिनेश राय यादव	९८५५०४४४५२, ९८०४८४८४८१		प्र.प्र. श्याम कुमार यादव	९८४५०३३००३	maulapr@nea.org.np
४७	सिम्रौनगढ वितरण केन्द्र	तैयब अन्सारी	९८५५०४९९९३	०५३-४११०६५	ई. शिव शंकर महतो	९८५४०२९०१०	simraungadh@nea.org.np
ग)	बागमती प्रादेशिक कार्यालय, काठमाडौं	राजन ढकाल	९८५१२७३७१०	०१-४१५३१५६	स.नि. अनिता सुवेदी	९८५११८६८८०	kathmandu.ro@nea.org.np
४८	रत्नपार्क वितरण केन्द्र	विरेन्द्र कुमार सिंह	९८५१२७३७११	०१-४१५३२५४	प्र.अ. रमिला कोईराला	९८५१२१९६७८	ratnapark@nea.org.np
४९	बानेश्वर वितरण केन्द्र	रोहिणी पौडेल	९८५१३१३३२२	०१-४४६१५२७	प्र.अ. दिपक राज श्रेष्ठ	९८४१०९५८७९	baneshwor@nea.org.np
५०	लगनखेल वितरण केन्द्र	शिवराम यादव	९८५१२७३७१३	०१-५५५५६६९	प्र.प्र. चादनी वि.क.	९८४७१०७२१४	lagankhel@nea.org.np
५१	कुलेश्वर वितरण केन्द्र	बाबुराम सुवेदी	९८५१०५८८००	०१-४२७४८४७	प्र.अ. भरत के.सी.	९८४३५२१११९	kuleshwor@nea.org.np

५२	महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र	प्रज्वलमान श्रेष्ठ	९८५१२४२६९५	०१-४९८०५३२	प्र.प्र. राहमहरि गौतम	९८५११०९६६३	maharajgunj@nea.org.np
५३	भक्तपुर वितरण केन्द्र	राम दुलार यादव	९८५१२७३७१४	०१-६६११०९८	प्र.प्र. सुदा दाहाल	९८४१७४१२२७	bhaktapur@nea.org.np
५४	पुल्चोक वितरण केन्द्र	सुबोध शर्मा	९८५१२७३७१२	०१-५५२३०१६	प्र.प्र. यमुना शर्मा	९८४३०४८२६७	pulchowk@nea.org.np
५५	ठिमी वितरण केन्द्र	जयानन्द भा	९८५१२७३७१५	०१-६६३५१०६	ई. राजकुमार कार्की	९८६००४२५५२	thimi@nea.org.np
५६	काभ्रे वितरण केन्द्र	ध्रुव राज कार्की	९८५१२७३७१८	०११-६६४७९७	ई. सुरोज पराजुली	९८४९६८४५४३	kavre@nea.org.np
५७	कीर्तिपुर वितरण केन्द्र	सानुबाबु थापा	९८५१२१९६७१	०१-४३३३५३२	प्र.प्र. त्रिथराज आचार्य	९८५४०४०१४१	kirtipur@nea.org.np
५८	धुन्चे वितरण केन्द्र (रसुवा)	संजिप भट्टराई	९८५१२७३७२०	०१०-५४०११३	प्र.प्र. दीपरमण अधिकारी	९८५११७०६००	dhunche@nea.org.np
५९	नुवाकोट वितरण केन्द्र	ईन्द्र बहादुर जि.सी.	९८५११६०१७७	०१०-५६०६७६	प्र.प्र. हरि प्रसाद भट्ट	९८४१४५०६३५	nuwakot@nea.org.np
६०	धादिङ्ग वितरण केन्द्र	माधव न्यौपाने	९८५११०५१३२	०१०-५२०१३२	प्र.प्र. कृष्ण प्रसाद पौडेल	९८४९६१२८४५	dhading@nea.org.np
६१	सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र	दिपिन ढकाल	९८५१२०७६८६	०११-४८२१३९	ई. राजन भण्डारी	९८४११८०९१४	sindhupalchowk@nea.org.np
६२	दोलखा वितरण केन्द्र	मेघनाथ ढकाल	९८५४०४५७७३	०४९-४२१७७३	स.ई. राजेन्द्र चौधरी	९८४४११५१४३	dolakha@nea.org.np
६३	जोरपाटी वितरण केन्द्र	राजकुमार रमण	९८५१२७३७१६	०१-५१३४०४६	प्र.प्र. खिमेन्द्र बुढाथोकी	९८५८०२५१०६	jorpati@nea.org.np
६४	रामेछाप वितरण केन्द्र	दिपेन्द्र बुढाथोकी	९८५१२७३७१९	०४८-५४००६८	प्र.प्र. दीपक रेग्मी	९८५१०७३२८०	ramechhap@nea.org.np
६५	मेलम्ची वितरण केन्द्र	सन्तोष प्रसाद पन्त	९८५१२७३७२१	०११-४०१०४०	प्र.प्र. देवेन्द्र कुमार दवाडी	९८४१६१९८१४	melamchi@nea.org.np
६६	बालाजु वितरण केन्द्र	जय कुमार यादव	९८५१२४८८९६	०१-४३५०९४९	ई. उमेश कंडेल	९८४१४२५००३	balaju@nea.org.np
६७	पांचखाल वितरण केन्द्र	धनजित तामाङ्ग	९८५११०२८४१	०११-४९९३०१	प्र.प्र. नारायण बस्नेत	९८४४१७३०९९	panchkhal@nea.org.np
	ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा	विनोद प्रसाद चौधरी	९८५१२७३७१७	०१-४४१०१६५	प्र.प्र. टंक प्रसाद अर्याल	९८४१३९८४५९	transformer@nea.org.np
घ)	बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय, हेटौडा	दिपेन्द्र राज द्विवेदी	९८५५०६८०५२	०५७-५२४४६८	प्र.अ. राम चन्द्र पौडेल	९८६१७४८७४७	hetauda.ro@nea.org.np

६८	सिन्धुली वितरण केन्द्र	विनोद अधिकारी	९८५४०४२२५०	०४७-५२११०५	ई. शत्रुघ्न साह	९८६५०४३८४५	sindhuli@nea.org.np
६९	हेटौडा वितरण केन्द्र	नरेन्द्र वीर श्रेष्ठ	९८६५४०९१५२	०५७-५२५७६८	स.प्र.अ. राम बाबु लोप्चन	९८४१९८८१६९	hetauda@nea.org.np
७०	भरतपुर वितरण केन्द्र	रामु श्रेष्ठ	९८५५०८२३८०	०५६-५२५३८०	स.प्र.अ. अच्युत राज विष्ट	९८४५३५९५२९	bharatpur@nea.org.np
७१	रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र	राजेन्द्र कुमार चौधरी	९८५५०८३६५५	०५६-५६१६५५	स.प्र.अ. प्रकाश कुमार खरेल	९८५५०६२८८२	tandi@nea.org.np
७२	पालुङ्ग वितरण केन्द्र	विरमान रास्कोटी	९८०२५३३१०६	०५७-४००००२९	व.स. कमल न्यौपाने	९८४९११७५७५	palung@nea.org.np
७३	चनौली वितरण केन्द्र	शिशिर लम्साल	९८०२८३०९७२	०५६-५९१८९०	मि.रि.सु.भा. मोति प्रसाद शर्मा	९८४५०५३१३०	chanauli@nea.org.np
ड)	गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा	जगदिश चन्द्र जोशी	९८५६०६१५०१	०६१-४६१५००	प्र.प्र. भोलानाथ शर्मा	९८४१३३७७७२	pokhara.ro@nea.org.np
७४	पोखरा वितरण केन्द्र	राजिव कुमार सिंह	९८५६०२४४३५	०६१-५२०४७२	स.प्र.अ. हरिमाया के.सी.	९८४६३१८४१५	pokhara@nea.org.np
७५	आरुघाट वितरण केन्द्र	हेमराज चापागाई	९८५११९१९२६	०६४-४१००७५	व.स. हरि बहादुर गोदार	९८४६०८८८८७	aarughat@nea.org.np
७६	स्याङ्जा वितरण केन्द्र	प्रताप बराल	९८५६०५४८११	०६३-४२३८११	स.प्र.अ. देशबन्धु श्रेष्ठ	९८४६०४४३३३	syangja@nea.org.np
७७	बाग्लुङ्ग वितरण केन्द्र	दिलिप मरासिनी	९८५७६६६४४४	०६८-५२०८२०	स.ले.अ. राम प्रसाद मुडभरी	९८४१२६६९६१	baglung@nea.org.np
७८	म्याग्दी वितरण केन्द्र	प्रशान्त कुमार भा	९८५७६५५४०३	०६९-५२०४०३	सु.भा. रविन्द्र भण्डारी	९८४६१००२९७	myagdi@nea.org.np
७९	तनहु वितरण केन्द्र	मेखराज जोशी	९८५६०२७३३३	०६५-५६०२४२	स.प्र.अ. विष्णुराज लोहनी	९८४६०२२३३६	tanahu@nea.org.np
८०	लेखनाथ वितरण केन्द्र	अमृत बाबु अधिकारी	९८५६०१००३२	०६१-५६००३२	स.प्र.अ. अर्जुन प्रसाद तिवारी	९८४६०९७६४२	lekhnath@nea.org.np
८१	पर्वत वितरण केन्द्र	प्रितम राज विष्ट	९८५७६४०१७७	०६७-४२११३१	व.स. शम्भु प्रसाद सापकोटा	९८५७६४५२२२	parbat@nea.org.np
८२	तातोपानी वितरण केन्द्र	शिव प्रसाद नेपाल	९८५११८०५३५ ९८५७६४२३३३		सि.मि.रि. योगेन्द्रराज पौडेल	९८४६२१०३६२	tatopani@nea.org.np
८३	लमजुङ्ग वितरण केन्द्र	मेघराज भट्टराई	९८५६०७२३२१	०६६-५२१०७७	सु.भा. आनन्द गुरुङ	९८५६०७८१४०	lamjung@nea.org.np

८४	गोरखा वितरण केन्द्र	चिज बहादुर गुरुङ्ग	९८५६०४३१७७	०६४-४२०४७७	स.प्र.अ. प्रदिप शर्मा रुपाखेती	९८५२०२२२२०	gorkha@nea.org.np
८५	कावासोती वितरण केन्द्र	अमित कुमार कर्ण	९८५७०४१३८८	०७८-५४०७४४	स.प्र.अ. पदम राज हमाल	९८४७०३४१२०	kawasoti@nea.org.np
८६	मनाङ वितरण केन्द्र	राजु महतो	९८५६०३५०४०	०६६-५२१०७७	लेखापाल नारायण प्रसाद शर्मा	९८५७६३३८१३	manang@nea.org.np
च)	लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल	नवराज ओझा	९८५७०५८०५५	०७१-४३७११७	प्र.प्र.राम प्रसाद पोखरेल	९८४२०३७४२६	butwal.ro@nea.org.np
८७	भैरहवा वितरण केन्द्र	संजय कुमार मिश्र	९८५७०१७५५४	०७१-५२०६५४	स.प्र.अ.सानुमैया महर्जन	९८४१३०२२२८	bhairahawa@nea.org.np
८८	बुटवल वितरण केन्द्र	कपिल राज पाण्डे	९८५७०७०५८५	०७१-५४१००२	स.क.अ. राजेन्द्र क्षेत्री	९८५७०२६४३१	butwal@nea.org.np
८९	परासी वितरण केन्द्र	राम प्रमोद साह	९८५७०४६२३२	०७८-५२०२७८८	ई. हंसलाल साह	९८५१२४४०३२	parasi@nea.org.np
९०	पाल्पा वितरण केन्द्र	विवेक अधिकारी	९८५७०७५५११	०७५-५२०५११	स.प्र.अ. भागीरथ बस्याल	९८४०९७२२३५	palpa@nea.org.np
९१	गुल्मी वितरण केन्द्र	अर्जुन पोखरेल	९८५७०२६२७५	०७९-५२०२०८	ई. भरत पोखरेल	९८४१०३६३०७	gulmi@nea.org.np
९२	तौलिहवा वितरण केन्द्र	राजेश कुमार भा	९८५७०५२११७	०७६-५६०११७	ब.स. भूपेन्द्र खनाल	९८५७०५१४४१	taulihawa@nea.org.np
९३	कृष्णनगर वितरण केन्द्र	शुशिल पौडेल	९८०२५३२४३१	०७६-५२००१५	ई. रिजन ग्वांछा	९८०२५३२४६४	krishnanagar@nea.org.np
९४	अर्घाखाँची वितरण केन्द्र	रमेश बज्राडे	९८५७०६६८२४	०७७-४२०८२४	मि.रि.सु.भा. सुदिप पौडेल	९८४६१९९१०४	arghakhanchi@nea.org.np
९५	नयाँ मिल वितरण केन्द्र	रितेश गुप्ता	९८५७०४२३७८	०७१-५६००३२	स.ले.अ. प्रकाश रोका	९८५७०२४८३०	nayamill@nea.org.np
९६	बर्दघाट वितरण केन्द्र	दिगम्बर यादव	९८५७०८१०७३	०७८-५८०८५५	मि.रि.सु.भा. श्यामसुन्दर चौधरी	९८४७२०४४८५	bardaghat@nea.org.np
९७	अमुवा वितरण केन्द्र	सुनिल सापकोटा	९८५७०१४०८८	०७१-५०१०२८	ई. गंगाराम पाल	९८५७०१२७२४	amuwa@nea.org.np
छ)	लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्ज	हरि प्रसाद पाण्डे	९८५८०७२२९९	०८१-५२७४२१	प्र.प्र. दुर्गा बहादुर खत्री	९८६१०१०७७७	nepalgunj.ro@nea.org.np
९८	नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र	दिवाकर प्याकुरेल	९८५८०५११७७	०८१-५२०२४७	स.प्र.अ. भवानी चन्द	९८४८७२४४९०	nepalgunj@nea.org.np

९९	कोहलपुर वितरण केन्द्र	सुरज रेग्मी	९८५८०४००३९	०८१-५४०६४५	मि.रि.सु.भा. दुर्गा सुवेदी	९८४६०६४६०३	kohalpur@nea.org.np
१००	रुकुम वितरण केन्द्र (पूर्व)	सुरेश प्रसाद चौधरी	९८५७८५४६२९	०८८-४१३१४३	ई.सी. तेज प्रकाश पुन	९८४४९३२१३५	rukum@nea.org.np
१०१	प्युठान वितरण केन्द्र	महेन्द्र कुमार दास	९८५७८३६४५८	०८६-४६०१५१	मि.रि.सु.भा. याम बहादुर के.सी.	९८४७८५२५२०	pyuthan@nea.org.np
१०२	रोल्पा वितरण केन्द्र	अशेश्वर साह	९८५७८८६२४८	०८६-४४०२४८	फो.मे. उच्चतम बुढामगर	९८४७०१६५२०	rolpa@nea.org.np
१०३	गुलरिया वितरण केन्द्र	नारायण अर्याल	९८५८०३१२६६	०८४-४२०४८९	मि.रि.सु.भा. मधुराज भण्डारी	९८४८०२७०३७	gularia@nea.org.np
१०४	घोराही वितरण केन्द्र	मिथिलेश कुमार गोहिवार	९८५७८६१२०१	०८२-५६१२०१	मि.रि.सु.भा. डण्डपाणी वि.क.	९८४७८३६०४८	ghorahi@nea.org.np
१०५	तुलसीपुर वितरण केन्द्र	शिव नारायण गोशाली	९८५७८२६७५०	०८२-५२१७५०	मि.रि.सु.भा. काली बहादुर बुढाथोकी	९८६६८७११३५	tulsipur@nea.org.np
१०६	लमही वितरण केन्द्र	जगन्नाथ लामिछाने	९८५७८४१११८	०८२-४१७०१८	मि.रि.सु.भा. पार्थिव राज न्यौपाने	९८४८०२४८६१	lamahi@nea.org.np
१०७	राजापुर वितरण केन्द्र	सुनिल पौडेल	९८५८०६०२१३	०८४-४६०२१३	ब.स. जित बहादुर चौधरी	९८६८०८५६७०	rajapur@nea.org.np
ज)	कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय, सुर्खेत	शम्भु कुसियैत यादव	९८५८०७२३९९	०८३-५२०३२२	प्र.अ. भीमकान्त चौधरी	९८४१५९४९३५	karnali@nea.org.np
१०८	सुर्खेत वितरण केन्द्र	युव राज रावत	९८५८०८४६००	०८३-५२२११७	ब.स. यज्ञ प्रसाद ढकाल	९८४८०५०७४८	surkhet@nea.org.np
१०९	सल्यान वितरण केन्द्र	अशोक लोहनी	९८५७८२२९३०	०८८-५००८०	सु.भा. मदन भण्डारी	९८४६७५०४७३	salyan@nea.org.np
११०	दैलेख वितरण केन्द्र	गौरव पाण्डे	९८५८०२९५००	०८९-४२०२०७	प्र.प्र. लोकेन्द्र जंग शाही	९८५७८३२९७५	dailekh@nea.org.np
१११	डोल्पा वितरण केन्द्र	धर्मपति यादव	९८५८३९००८१	०८७-५५००८१	प्र.प्र. दीपक के.सी	९८४८३०२९१०	dolpa@nea.org.np
११२	हेलुङ्ग वितरण केन्द्र	सुधिर कुमार यादव	९८४१५४२२३२	०८७-६८००४६	सु.भा. राजु कुमार बोहोरा	९८६८०७९११६	heldung@nea.org.np
११३	गमगाढ वितरण केन्द्र	साजन बहादुर ऐडी	९८५८३२२१३८	०८७-४६०१३६	प्र.प्र. प्रेम प्रसाद पाण्डे	९८४८१५७८१६	gamgad@nea.org.np
११४	कालिकोट वितरण केन्द्र	विमल प्रसाद साह	९८५८३२२७०५	०८७-४४०२३६	प्र.प्र. पुष्पा सुनार	९८४८३०१४५४	kalikot@nea.org.np

११५	जाजरकोट वितरण केन्द्र	अभिषेकराज कलवार	९८५८०८०३७५	०८३-४३०३७५	प्र.प्र. याम प्रकाश खड्का	९८४४९१७३३४	jajarkot@nea.org.np
११६	रुकुम वितरण केन्द्र (पश्चिम)	शिवजी प्र. साह	९८५७८३२०३२	०८८-५३०३६५	सु.भा. होम प्रसाद नेपाली	९८६६७०१४६२	rukum@nea.org.np
११७	जुम्ला वितरण केन्द्र	नरेशदत्त रावल	९८५८३९१५००	०८७-५२००१४	स.ई. हेमन्त साहु	९८४९३५६२२२	jumla@nea.org.np
११८	सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, अत्तरिया	जंग बहादुर चन्द	९८५८४८८५५५	०९१-५५१३४१	प्र.प्र. भुवनराज भट्ट	९८४८४२३१४३	attaria.ro@nea.org.np
११८	टीकापुर वितरण केन्द्र	माधव महत	९८४१४०७७२८	०९१-५६०२११	स.प्र.अ. मनोज कुमार रावल	९८४८७७४९१७	tikapur@nea.org.np
११९	महेन्द्रनगर वितरण केन्द्र	चुटुन कुमार श्रीवास्तव	९८५८७८४२२२	०९९-५२०८७३	स.प्र.अ. गणेश जोशी	९८६८४०७३५४	mahendranagar@nea.org.np
१२०	डडेल्धुरा वितरण केन्द्र	रमेश अवस्थी	९८५८७८६७६९	०९६-४२०२६३	ब.स. दिपक पन्त	९८४८८५९८०९	dadeldhura@nea.org.np
१२१	धनगढी वितरण केन्द्र	सूर्य नारायण मण्डल	९८५११३४६११	०९१-४१७४५६	ई. रौशन कुमार ठाकुर	९८४८९८७२२१	dhangadi@nea.org.np
१२२	डोटी वितरण केन्द्र	शिवशंकर सोनी	९८५८४४०१८४	०९४-४१२१८३	ब.स. पुस्कर राज जोशी	९८६५६५१७७६	doti@nea.org.np
१२३	बैतडी वितरण केन्द्र	पवन भट्ट	९८५८७८३३३३	०९५-५२०१६४	स.प्र.अ. रुद्रराज पन्त	९८५८७५०८९९	baitadi@nea.org.np
१२४	दार्चुला वितरण केन्द्र	आनन्द सापकोटा	९८५८७८८५५५	०९३-४२०४९८	सि.मि.रि. शंकर बहादुर स्वार	९८४८६४४१४७	darchula@nea.org.np
१२५	अछाम वितरण केन्द्र	हिक्मत बहादुर वि.सी.	९८५८४२२५२२	०९७-६२५१०५	ब.स. नर बहादुर कुँवर	९८५८४४०७३७	achham@nea.org.np
१२६	भजनी वितरण केन्द्र	गणेश दत्त पाण्डेय	९८५८४८८२३६	०९१-५८००९६	ब.स. राजेन्द्र बुढा	९८४८४०५४७७	bhajani@nea.org.np
१२७	बेलौरी वितरण केन्द्र	कपिल जोशी	९८५८७८५०००	०९९-५८०४६४	ब.स. ज्ञानेन्द्र राज स्वार	९८४८४२५९८८	belauri@nea.org.np
१२८	बझाङ्ग वितरण केन्द्र	सुजन खड्का	९८५८४८५६२३	०९२-४२१४९७	सि.मि.रि. वेद प्रकाश लेखक	९८४८७७००२०	bajhang@nea.org.np
१२९	बाजुरा वितरण केन्द्र	ललित कुमार मण्डल	९८५८४८८४५२	०९७-५४१३३२	सि.मि.री. केशव दत्त भट्ट	९८६८८७२८३६	bajura@nea.org.np

५.४.४.ने.वि.प्रा., वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको स्थान	आयोजनाप्रमुख	पद	मोबाईल नं.
१	ग्रिड सोलार तथा ईनर्जि ईफिसियन्सी आयोजना	त्रिशुली लगायत देशभरका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री अच्युत बाबु घिमिरे (संयोजक)	निर्देशक	९८५१०२४०२१
(क)	Development of 25 MW Grid Solar System Component	त्रिशुली	श्री विकास बहादुर रघुवंशी	उप प्रबन्धक	९८४१२९१२५२
(ख)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-9	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री संगिता कार्की पौड्याल	सहायकप्रबन्धक	९८४१७४९३४९
(ग)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of 33/11 kV S/S & 33 kV Lines-Package-8	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री गणेश शाह	सहायकप्रबन्धक	९८५१०५३३२६
(घ)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-11	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री सन्दीपश्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
(ङ)	Loss Reduction, Package - 4	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री प्रवीणढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
(च)	Design, Supply, Delivery, Installation, Testing, Commissioning of Distribution System-Package-2,3,10	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री प्रकाश राउत	स. प्रबन्धक	९८५११६५१०२
(छ)	Loss Reduction Masper Plan Project	देशभर	श्री दामोदर पराजुली	सहायकप्रबन्धक	९८४११५१९१८
२	सोलुखुम्बु ओखलढुंगा ३३ के.भी. ग्रा.वि. तथा सवस्टेशन आयोजना	सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा			
३	(क) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (EIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री विजयसेन खड्का	सहायकप्रबन्धक	९८४१५९२६९८
	(ख) वितरण प्रणाली स्तरोन्नती तथा विस्तार आयोजना (AIIB)	देशका विभिन्न क्षेत्रहरू	श्री केशव श्रेष्ठ	सहायकप्रबन्धक	९८४१३८७९२७

४	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	कैलाली, कंचनपुर, भैरहवा, वीरगंज, जगकपुर, भरतपुर, हेटौडा, वर्दीया, दाङ लगायतका विभिन्न अन्य जिल्लाहरुको ३३ के.भि. लाईनहरु	श्री सुरज भुजु	ईन्जिनियर	९८५११५३३५८
५	३३/११ के.भि. सबस्टेशन सुदृढीकरण आयोजना	घोराही, भैरहवा, कावासोती, कलैया, गौर, विरगंज, राजविराज, जगकपुर, मिर्चैया, धरान, इर्नवा, दमक लगायतका विभिन्न सबस्टेशनहरु			
६	३३/११ के.भि. लाइनविस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री सन्दीपश्रेष्ठ	प्रबन्धक	९८५१००२३००
७	Smart Metering Smart Gridआयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु			
८	सिस्टम रिलायबिलिटी एण्ड ३३/११ के.भी. आयोजना	देशका विभिन्न क्षेत्रहरु	श्री मनोज कुमार साह	प्रबन्धक	९८६०१५७६६६
९	GIS Smart Gridआयोजना	वि.ग्रा.से.नि. अन्तर्गतका सम्पूर्ण वि.के.हरु	श्री उत्सव कोईराला	उप प्रबन्धक	९८४१२७५९१०
१०	चौतारा, सिन्धुपाल्चोक ३३ के.भि.प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनआ.	लामोसांधु, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक	श्री नन्दकिशोर मण्डल	सहायक प्रबन्धक	९८४१५१३६३२
११	मादनकुमारी मकैवारी सिंगटी प्र.ला. तथा स.स. आयोजना ।	माझिफेदा, मुढे, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक			
१२	ट्रान्सफरमर टेष्टिङ ल्याव निर्माण आयोजना	विराटनगर, बुटवल, नेपालगंज			
१३	खोटाङ-भोजपुर-उदयपुर-संखुवासभा ३३ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा			
१४	मातातिर्थ-माखु ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना	मातातिर्थ, फाखेल, चखेल, सिस्नेरी हुदै माल्टा सम्म ३४ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण	श्री खिलनाथ अर्याल	ईन्जिनियर	९८५२०६३३५४
१५	मातातिर्थ-माल्टा ३३ के.भि. प्र.ला. आयोजना (उद्योग मन्त्रालय)	मातातिर्थ, चन्द्रगिरी, थानकोट हुदै नौविसे सम्म १५ कि.मि. ३३ के.भि. प्र.ला. निर्माण			
१६	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना	काभ्रे-मकवानपुर-रामेछाप-सिन्धुली			

१७	खोकना निजगढ ३३/११ के.भि. स.स. आयोजना	खोकना, निजगढ			
१८	रसुवा नुवाकोट वि.प्र. पुर्ननिर्माण सुधार आयोजना (KFW)	रसुवा, नुवाकोट	श्री प्रकाश राउत	सहायक प्रबन्धक	९८५११६५१०२
१९	खोटाङ-उदयपुर ११/०.४ के.भी. ग्रा.वि. आयोजना	खोटाङ, उदयपुर	श्री सुरज भण्डारी	सहायक प्रबन्धक	९८४७३८९१३२
२०	नवलपुर गामीण विद्युतीकरण तथा छुसाङ्ग (मुस्ताङ्ग) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	नवलपुर, मुस्ताङ्ग	श्री विमल राज राउत	ईन्जिनियर	९८५११९८३४३
२१	ताप्लेजुङ्ग-पाँचथर-इलाम-भापा गामीण विद्युतीकरण तथा सबस्टेशन निर्माण आयोजना	ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, भापा	श्री गणेश शाह	सहायक प्रबन्धक	९८५१०५३३२६
२२	भोजपुर-संखुवासभा ११/०.४ के.भी. ग्रामिण विद्युतीकरण आयोजना	भोजपुर र संखुवासभा जिल्ला	श्री प्रवीणढकाल	ईन्जिनियर	९८५१२२६८११
२३	दार्चुला-डोल्पा गामीण विद्युतीकरण आयोजना (Package-16-17)	दार्चुला र डोल्पा जिल्ला	श्री अनिल अधिकारी	ईन्जिनियर	९८५११५२००५

अनुसूची-१ विद्युत महशूल दर

१. ग्राहस्थ वर्ग:

१.१ सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	५ एम्पियर		१५ एम्पियर		३० एम्पियर		६० एम्पियर	
	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)
० देखि २०	३०	०	५०	४१००	७५	५१००	१२५	६१००
२१ देखि ३०	५०	६१५०	७५	६१५०	१००	६१५०	१२५	६१५०
३१ देखि ५०	५०	८१००	७५	८१००	१००	८१००	१२५	८१००
५१ देखि १००	७५	९१५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०
१०१ देखि २५०	१००	९१५०	१२५	९१५०	१५०	९१५०	२००	९१५०
२५० भन्दा माथि	१५०	१११००	१७५	१११००	२००	१११००	२५०	१११००

नोट : ५ एम्पियरका ग्राहकको हकमा यदि मासिक २० किलोवाट-घण्टा युनिटभन्दा बढी खपत गरेमा १ देखि २० किलोवाट-घण्टा: युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क रु ३१०० प्रति युनिटका दरले लाग्ने छ।

१.२ श्री फेज तल्लो भोल्टेज (४०० भोल्ट)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	१० के.भि.ए. सम्म			१० के.भि.ए. भन्दा माथि		
	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)		मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा :युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१,१००।००	१०।५०	११।५०	१,८००।००	१०।५०	११।५०

१.३ श्री फेज मझौला भोल्टेज (३३/११ के.भी.)

कि.वा.घण्टा (मासिक)	मासिक न्युनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा:युनिट)	
		आषाढदेखि कार्तिकसम्म	मंसिरदेखि जेष्ठसम्म
जुनसुकै खपतको लागी	१०,०००।००	१०।५०	११।००

तल्लो भोलेज (२३० भोलेट) सिंगल फेज, ५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	३०	०	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.३० लाग्ने र इनर्जी शुल्क वापतको महशुल नलाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ३०+५X० = जम्मा रु ३०)
२.	२१ देखि ३०	५०	६५०	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ५०+२०X३+५X६५० = जम्मा रु. १४२५०)
३.	३१ देखि ५०	५०	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ५०+२०X३+१०X६५०+५X८१ = जम्मा रु.२१५१००)
४.	५१ देखि १००	७५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु.७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु ७५+२०X३+१०X६.५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु.४०७५०)
५.	१०१ देखि २५०	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १००+२०X३+१०X६५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९०७५०)
६.	२५० माथि	१५०	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १५० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ३ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.६५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु.९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १५०+२०X३+१०X६५०+२०X८+ (५०+१५०)X९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२३९०१००)

तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) सिंगल फेज, १५ एम्पियरको बिलिङ्ग गर्ने तरिका

क्र.स	कि.वा.घण्टा (मासिक)	न्यूनतम मासिक शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु प्रति कि.वा. घण्टा)	बिलिङ्ग गर्ने तरिका
१.	० देखि २०	५०	४१००	२० युनिट सम्म न्यूनतम शुल्क रु.५० लाग्ने र इनर्जी शुल्क प्रति युनिट रु. ४१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५ युनिट : रु ५०+५X४ = जम्मा रु.७०१००)
२.	२१ देखि ३०	७५	६१५०	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५ युनिट : रु ७५+२०X४+५X६१५० = जम्मा रु १८७५०)
३.	३१ देखि ५०	७५	८१००	न्यूनतम शुल्क रु. ७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८१०० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ३५ युनिट : रु ७५+२०X४+१०X६१५०+५X८ = जम्मा रु.२६०१००)
४.	५१ देखि १००	१००	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १०० लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: ५५ युनिट : रु १००+२०X४+१०X६१५०+२०X८+५X९१५० = जम्मा रु ४५२१५०)
५.	१०१ देखि २५०	१२५	९१५०	न्यूनतम शुल्क रु. १२५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.८ र ५१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ९१५० का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: १०५ युनिट : रु १२५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+(५०+५)X९१५० = जम्मा रु.९५२१५०)
६.	२५० माथि	१७५	१११००	न्यूनतम शुल्क रु. १७५ लाग्ने र १ देखि २० युनिटसम्म प्रति युनिट रु.४ र २१ युनिटदेखि ३० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ६१५० र ३१ युनिटदेखि ५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ८ र ५१ युनिटदेखि १५० प्रति युनिट रु. ९१५० र १५१ देखि २५० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. १० र २५१ देखि ४०० युनिटसम्म प्रति युनिट रु. ११ का दरले महशुल लाग्ने । (उदाहरण: २५५ युनिट : रु १७५+२०X४+१०X६१५०+२०X८+ (५०+१५०)X९१५०+ ५X१११०० = जम्मा रु.२४३५१००)

यसै तरिकाले ३० र ६० एम्पियरका सिंगल फेजको बिलिङ्ग गर्ने ।

२. अन्य उपभोक्ता

२.१ तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट)

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
१.	औद्योगिक		
	क. ग्रामीण तथा घरेलु उद्योग	६०।००	७८०
	ख. साना उद्योग	११०।००	९।६०
२.	व्यापारिक	३२५।००	११।२०
३.	गैह्व व्यापारिक	२१५।००	१२।००
४.	सिंचाई	०	२।२५
५.	खानेपानी		
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	४।२०
	ख. अन्य खानेपानी	१६०।००	७।२०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००।००	५।७५
	ख. अन्य यातायात	२२०।००	८।९०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	०	६।९०
८.	सडक बत्ती		
	क. मिटर जडान भएको	०	७।३०
	ख. मिटर जडान नभएको	२४७५।००	०
९.	अस्थायी कनेक्सन	०	१९।८०
१०.	गैह्व ग्राहस्थ	३५०।००	१३।००
११.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१४।००

२.२ माथिल्लो भोल्टेज स्तर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा: युनिट)
अ.	माथिल्लो भोल्टेज		
१.	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०।००	८।२०
२.	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०।००	८।३०
आ.	मझौला भोल्टेज (३३ के.भि.)		
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।४०
२.	व्यापारिक	३१५।००	१०।८०
३.	गैह्व व्यापारिक	२४०।००	११।४०
४.	सिंचाई	०	२।५०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४।६०
	ख) अन्य खानेपानी	१६०।००	६।६०
६.	यातायात		

	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।६०
७.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०।००	१२।५५
८.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।५०
इ.	मभौला भोलेज (११ के.भि.)	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	ईनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)
१.	औद्योगिक	२५५।००	८।६०
२.	व्यापारिक	३१५।००	११।१०
३.	गैह्र व्यापारिक	२४०।००	११।५०
४.	सिंचाई	०	२।६०
५.	खानेपानी		
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	४।८०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०।००	६।८०
६.	यातायात		
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०।००	५।६०
	ख) अन्य यातायात	२५५।००	८।८०
७.	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०।००	९।९०
८.	अस्थायी कनेक्सन	३३०।००	१२।००
९.	गैह्र ग्राहस्थ	३५०।००	१२।९०
१०.	मनोरञ्जन व्यवसाय	३५०।००	१३।९०

३. टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) महशुल दर

३.१. वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमाण्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)		
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज				
१	औद्योगिक (१३२ के.भी)	२३०।००	१०।००	४।६५	८।२०
२	औद्योगिक (६६ के.भी)	२४०।००	१०।१०	४।७५	८।३०
आ.	मभौला भोलेज (३३ के.भि)				
१	औद्योगिक	२५०।००	१०।२०	५।२५	८।४०
२	व्यापारिक	३१५।००	१२।३०	६।७५	१०।८०
३	गैर व्यापारिक	२४०।००	१३।२०	७।००	१२।००
४	सिंचाई	०	६।३०	२।००	३।००

५	खानेपानी				
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६२०	३१०	४६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	५१२५	८१४०
६	यातायात				
	क) सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७००	३७०	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	३७०	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	३५०	४१२०
इ.	मभौला भोलेज (११ के.भि.)				
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	५१४०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	६१९०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	७१५	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	२१००	३११०
५	खानेपानी				
	क. सामुदायिक खानेपानी	०	६३०	३१४०	४१७०
	ख. अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	५१४०	८१५०
६	यातायात				
	क. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५	४१२०	५१६०
	ख. अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	४१२०	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	३१७५	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	५११५	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	६१६०	१११७५
ई.	तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)				
१	यातायात				
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७२५	४१३०	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	४१३०	८१६०

३.२. पौषदेखि चैत्र महिना सम्मको विद्युत महशुल दर :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	डिमान्ड शुल्क (रु. प्रति के.भि.ए. प्रति महिना)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति कि.वा.घण्टा:युनिट)	
			पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
अ.	माथिल्लो भोलेज			
१	औद्योगिक (१३२ के.भि.)	२३०१००	१०१००	८१२०
२	औद्योगिक (६६ के.भि.)	२४०१००	१०११०	८१३०
आ.	मभौला भोलेज (३३ के.भि.)			

१	औद्योगिक	२५०१००	१०१२०	८१४०
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१३०	१०१८०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१२०	१२१००
४	सिंचाई	०	६१३०	३१००
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६१२०	४१६०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१२०	८१४०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१००	५१५०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१३५	८१४०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१४०	४१२०
इ.	मभौला भोल्टेज (११ के.भि.)			
१	औद्योगिक	२५०१००	१०१५०	८१५५
२	व्यापारिक	३१५१००	१२१६०	११११०
३	गैर व्यापारिक	२४०१००	१३१५०	१२१२५
४	सिंचाई	०	६१४०	३११०
५	खानेपानी			
	क) सामुदायिक खानेपानी	०	६१३०	४१७०
	ख) अन्य खानेपानी	१५०१००	१०१५०	८१५०
६	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२३०१००	७१५५	५१६०
	ख) अन्य यातायात	२५५१००	९१६५	८१५०
७	सडक बत्ति	८०१००	८१८०	४१४०
८	धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल	२२०१००	१११३०	९११०
९	अस्थायी	३३०१००	१४१४०	१११७५
ई.	तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)			
१	यातायात			
	क)सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)	२००१००	७१२५	५१७५
	ख) अन्य यातायात	२२०१००	९१७५	८१६०

३.३. डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने टाइम अफ डे(टि.ओ.डी) यातायात उपभोक्ताको (Automatic Swap Card) विद्युत महशुल दर

१. सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत)

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	८१४०	४१४५	६१६०
११ के.भी.	८१६०	५१०५	६१७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	८१७०	५१०५	६१९०

पौष देखि चैत्रसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	८१४०	६१६०
११ के.भी.	८१६०	६१७०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	८१७०	६१९०

२) अन्य यातायात

वैशाख देखि मंसिरसम्मको विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)		
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अफ पिक समय (राति ११:०० बजे देखि बिहान ५:०० बजेसम्म)	अन्य समय (बिहान ५:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजे सम्म)
३३ के.भी.	१११२०	४१४५	१०११०
११ के.भी.	१११६०	५१०५	१०१२०
तल्लो भोलेज (२३०/४०० भोलेट)	१११७०	५११५	१०१३०

पौष देखि चैत्र सम्म लागने विद्युत महशुल दर

विवरण	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)	
	पिक समय (साँझ ५:०० बजे देखि राति ११:०० बजेसम्म)	अन्य समय (राति ११:०० बजे देखि भोलिपल्ट साँझ ५:०० बजेसम्म)
३३ के.भी.	११।२०	१०।१०
११ के.भी.	११।६०	१०।२०
तल्लो भोल्टेज (२३०/४०० भोल्ट)	११।७०	१०।३०

नोट:

१. चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालकले विद्युतिय सवारी साधनलाई चार्जिङ्ग सेवा दिए बापत उपरोक्त महशुल दरमा प्रति किलोवाट-घण्टा: युनिटमा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी लिन पाउने छ ।
२. **सार्वजनिक यातायात (चार्जिङ्ग स्टेशन समेत):** प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातको रुपमा ट्रलबस र सार्वजनिक सवारी साधनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक बस / मिनिबस, सफा टेम्पो एवम् अन्य सवारी साधनको ब्याट्री चार्ज गर्न विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने चार्जिङ्ग स्टेशनका उपभोक्ताहरु ।
३. **अन्य यातायात :** प्रचलित कानून बमोजिम भाडादर निर्धारण हुने सार्वजनिक यातायातका साधन जस्तै : केबलकार, रोपवे, मेट्रो आदि र अन्य विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरु ।

४. सामुदायिक थोक उपभोक्ता :

क्र.सं	उपभोक्ता वर्ग	मासिक न्यूनतम शुल्क (रु)	इनर्जी शुल्क (रु. प्रति किलोवाट-घण्टा:युनिट)
अ.	मझौला भोल्टज (११ के.भि./३३ के.भि.)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१००
आ.	तल्लो भोल्टज (२३०/४०० भोल्ट)		
	N X २० युनिट सम्म (मासिक)	N X ३०	०
	N X २० युनिट भन्दा माथि (मासिक)		६१२५

नोट:

१) N = सम्बन्धित सामुदायिक थोक उपभोक्ता अन्तर्गत रहेका कुल उपभोक्ता संख्या ।

२) यस तालिका बमोजिमको महशुल सामुदायिक थोक उपभोक्ताले ने.वि.प्रा. लाई मासिक रुपमा बुझाउनु पर्नेछ ।

अनुसूचि-२ अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क

सेवा	दररेट (रु.)
१. आवेदन फाराम	
क) ग्राहस्थ तर्फ	१००
ख) अन्य ग्राहक	२००
ग) अन्य प्रयोजनको निवेदनमा	१०
२. फ्यूज सेवा:	
क) सिंगल फेज रु.	१००
ख) थ्रि फेज	२००
३. मिटर सिल लगाउँदा	
क) वाकसको सिल	
१) ग्राहकले निवेदन दिएकोमा	२००
२) कार्यालयले फेला पारेमा	५००
ख) अन्य सिल	
१) टर्मिनल सिल	४००
२) रिडिङ सिल	१०००
३) सि.टि./पि.टि. सिल	१०००
४. नयाँ वस्ति जडान गर्दा:	
४.१ ग्राहस्थ वर्ग (इनर्जी मिटर क्षमता)	
क) ५ एम्पयर	१००
सेवा	दररेट (रु.)
ख) १५ एम्पयर	१५०


ग) ३० एम्पयर	३००
घ) ६० एम्पयर	५००
ड) थ्रि फेज	१०००
४.२ अन्य ग्राहक	
क) १० के.भि.ए. सम्मको	१०००
ख) १० के.भि.ए. भन्दा माथि	१५००
ग) टिओडि मिटर	१५००
५. पोल जडान गर्नु परेमा:	
क) सिंगल फेज प्रति पोलको	५००
ख) थ्रिफेज प्रति पोलको	१०००
६. मिटरको क्षमता थपघट गर्दा:	
६.१ सिंगल फेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	३००
६.२ थ्रिफेज:	
क) मिटरको क्षमता बढाउँदा	०
ख) मिटरको क्षमता घटाउँदा	५००
७. विद्युत सप्लाई काट्ने र पुनः जोड्ने (सिंगल फेज/थ्रि फेज)	
क) लाइन काट्ने परेमा	२५०
ख) लाइन जोड्ने परेमा	५००
८. ठाउँ सारी गर्दा:	
क) सिंगल फेज	७००
ख) थ्रिफेज	१०००
९. नामसारी गर्दा:	
क) ग्राहस्थ:	
१. अंशवण्डा भएको कारणले लिखित आधारमा नामसारी गरी दिनु पर्दा	५००
२. घर बिक्री भएको अवस्थामा लिने दिने दुवैको रोहवरमा हक हस्तान्तरण गर्दा	१०००
३. खरिद बिक्री भै घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नामसारीको कारवाही गर्नु पर्दाको अवस्थामा	१५००
ख) औद्योगिक र अन्य	२०००
१०. मिटर टेष्टिङ:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००
ग) टिओडि मिटर	२०००
घ) सबमिटर	५००
ड) सि.टि. मिटर	१५००
११. लगत खारेज दस्तुर:	
क) सिंगल फेज	५००
ख) थ्रिफेज	१०००

५.५. प्रसारण निर्देशनालयः

५.५.१. प्रसारण निर्देशनालयको कार्य विवरण :

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित तथा अन्य मुलुकबाट आयातित विद्युत शक्तिलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो रूपमा नेपाल राज्य भर प्रसारण गर्नको लागि आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने । हाल ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना विकास सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने जिम्मेवारी यस निर्देशनालयले वहन गर्दछ ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माणको लागि विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि सो पश्चात आयोजनाहरू निर्माण आरम्भ गर्नबोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता, निर्माणाधिन आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्नगर्न स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवश्यक निर्देशन दिने, बजेट निकास्यादिने तथा बजेट अपुग भएमा थप बजेट व्यवस्थापनको लागि प्रकृया अगाडि बढाउने लगायतका अन्य कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने ।
- यस निर्देशनालय अन्तर्गतका देहायका विभाग र विभागस्तरका कार्यालयहरू रहेका छन् ।
 - * ग्रिड सञ्चालन विभाग:- विभिन्न स्तरका ग्रिड संरचनाको सञ्चालन तथा सम्भार गर्ने ।
 - * प्रणाली सञ्चालन विभाग:- विद्युत प्रणालीलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरू ४०० के.भी.:- २२० के.भी.भन्दा माथि ४०० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरू २२० के.भी.:- १३२ के.भी.भन्दा माथि २२० के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
 - * ग्रिड विकास विभाग:- ६६ के.भी.देखि १३२ के.भी.सम्मका नयाँ प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको योजना निर्माण सुपरीवेक्षण तथा हस्तान्तरण गर्ने ।
- विद्युत प्रसारणको लागि आवश्यकता अनुसार ६६ के.भी.देखि ४०० के.भी.सम्मका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू निर्माण विस्तार एवं स्तरोन्नतीको कार्यहरू गर्ने ।
- प्राविधिक अध्ययनको आधारमा Congestion भएका प्रसारण लाईनहरू तथा Over load हुने सबस्टेशन हरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५.५.२. प्रशारण निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना

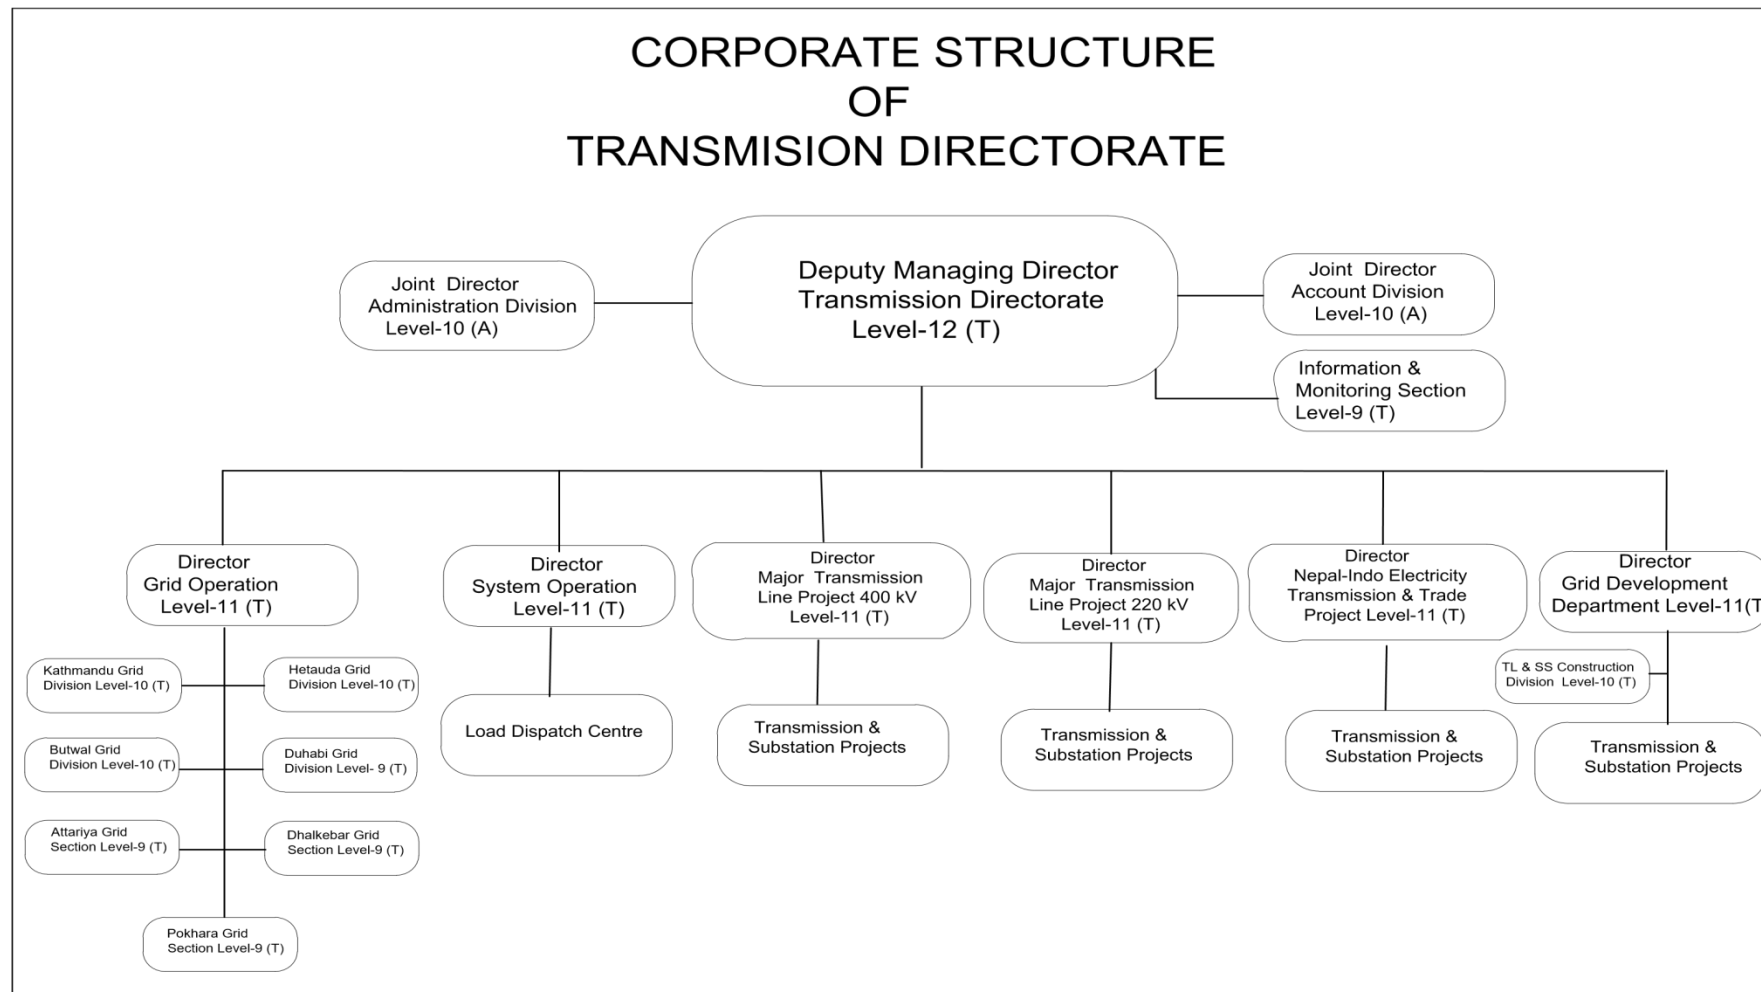

५.५.३. प्रसारण निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय, आयोजना प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर:

क्र.सं.	पद	कर्मचारीको नाम	कार्यालय/ आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.	इमेल
१	उपकार्यकारी निर्देशक	श्री दीर्घायू कुमार श्रेष्ठ	प्रसारण निर्देशनालय	९८५१२१३९८२	transmission@nea.org.np
२	निर्देशक	श्री श्रीराम राज पाण्डे	ग्रिड सञ्चालन विभाग	९८४००५०२१३	gridoperation@nea.org.np
३	निर्देशक	श्री दुर्गानन्द बडियैत	ग्रिड विकास विभाग	९८४१२२८२२२	griddev@nea.org.np
४	निर्देशक	श्री सुरेश बहादुर भट्टराई	प्रणाली संचालन विभाग	९८५१००९३७३	ldc@nea.org.np
५	निर्देशक आयोजना प्रमुख	श्री श्याम कुमार यादव	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना	९८५११२०९३९	niettp400kv@nea.org.np
			खिम्ती-ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५१००९०९९	khimti220kv@nea.org.np
६	निर्देशक	श्री टेकनाथ तिवारी	बृहत प्रसारण लाईन आयोजनाहरु ४०० के.भी.	९८५११७२२२२	grid400@nea.org.np
७	प्रमुख	श्री थर्क बहादुर थापा	बृहत प्र.ला.आयोजनाहरु २२० के.भी.	९८४१२२४९३९	grid220@nea.org.np
			काठमाडौं उपत्यका प्रसारण प्रणाली विस्तार आयोजना		t3b220kv@nea.org.np
			त्रिशुली ३ बी २२० के.भी. स/स आयोजना		”
८	प्रबन्धक	श्री चन्दन कुमार घोष	कुश्मा-तल्लोमोदी १३२ के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१०८५१११	klmtlp132kv@nea.org.np
९	प्रबन्धक	श्री लक्ष्मी नारायण मूखिया	कुशाहा-कटैया १३२ के.भी.प्र.ल.आ., रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी. प्र.ल.आ., प्रसौनी वीरगञ्ज १३२ के.भी.भूमिगत वि.प्र.ला.आ.	९८५५०५७६५९	kk132kv@nea.org.np
१०	प्रबन्धक	श्री हरि प्रसाद पाण्डे	वुटवल (गोरुसिङ्गे)- लुम्बिनी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना,	९८५७०६३२७२	butwallumbini132kv@nea.org.np

			वर्दघाट सर्दी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना, मैनहिया सम्पत्तिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		bs132kv@nea.or.np ms132kv@nea.or.np
११	प्रबन्धक	श्री सुरज गौतम	बुटवल ग्रिड महाशाखा	९८५७०२१४२८	butwalgrid@nea.org.np
१२	प्रबन्धक	श्री अशोक पण्डित	हेटौंडा ग्रिड महाशाखा	९८५५०६७९६१	rp132kv@nea.org.np
१३	उप-प्रबन्धक	श्री सतिस चन्द्र साह	का.उ.प्र.प्र. विस्तारआ. (प्याकेज ए)	९८४१२७३५०४	
१४	प्रबन्धक	श्री दीपक धिताल	काठमाडौं ग्रिड महाशाखा	९८४१५६१५४२	kathmandugrid@nea.org.np
१५	उप-प्रबन्धक	श्री अमित गोपाल वैद्य	का.उ.प्र.सु.आ.	९८४१३६६७३७	
१६	उप प्रबन्धक	श्री दिपा श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.वि.आयोजना प्याकेज डी	९८४१७६७७८१	kb132kv@nea.org.np
१७	उप-प्रबन्धक	श्री सन्तोष कुमार साह	हेटौंडा-भरतपुर-वर्दघाट २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८६९९९८५४८	hb220@nea.org.np
१८	उप-प्रबन्धक	श्री शुक्रराज देवकोटा	हेटौंडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९८५११३१०११	hdi400kvep@nea.org.np
			कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्र.ला.आयोजना		koshi220kv@nea.org.np
१९	उप- प्रबन्धक	श्री दिपक गौतम	सुनवल १३२ के.भी. स/स आयोजना	९८५११४१३३४	sunwal132kv@nea.org.np
			लमही-घोराही १३२ के.भी. स/स विस्तार आयोजना		lgsep132kv@nea.org.np
			भुमही हकोई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		hakui132kv@nea.org.np
२०	उप-प्रबन्धक	श्री जगदीश शर्मा पौडेल	लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५६०२५४७८	ld220kv@nea.org.np
२१	उप प्रबन्धक	श्री रमेश प्रसाद पौडेल	दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५७१७६	dordi132kv@nea.org.np
			कालीगण्डकी-रिडी १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		kgard132@nea.org.np
२२	उप प्रबन्धक	श्री राजन दुङ्गेल	सिंगाटी-लामोसाँघु १३२ के.भी. प्र.ला.	९८५१२०२३०९	singati132kv@nea.org.np

			आयोजना		
			बलेफी कोरिडोर १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		balefi132kv@nea.org.np
२३	उप प्रबन्धक	श्री रोसन अग्रवाल	नयाँ मोदी-लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४८४९०३	modi132kv@nea.org.np
			कुश्मा तल्लो मोदी नयाँ मोदी १३२ के.भी.प्रसारण लाइन आयोजना		
२४	उप प्रबन्धक	श्री निरञ्जन साह सुडी	रुपनी १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८४९४९८००५	rupani132kv@nea.org.np
			ढल्केवर लोहारपट्टी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		loharpatti132kv@nea.org.np
			नवलपुर १३२/३३ के.भी. स/स आयोजना		nawalpur132kv@nea.org.np
२५	उप प्रबन्धक	श्री जनार्दन प्रसाद गौतम	सोलु कोरिडोर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९४५३९०२	solu132kv@nea.org.np
२६	उप प्रबन्धक	श्री धुपेन्द्र कुमार भ्ना	चन्द्रपुर सुकदेवचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११५५०४६	cs132kvtp@nea.org.np
२७	उप प्रबन्धक	श्री सुनिल कुमार महतो	थानकोट-चापागाँउ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११२६३१६	tcb132kv@nea.org.np
			रुपनी बोदेवसाईन १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rb132kv@nea.org.np
			लहान सुखीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		ls132kv@nea.org.np
२८	उप प्रबन्धक	श्री अनुप गौतम	अमरपुर-ढुङ्गेसाँघु १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४९२३१४१२	ad132kv@nea.org.np
			गोदक न्यू अनारमनी १३२ के.भी. प्र.ला.आयोजना		godak.anarmani132kv@nea.org.np
			रामेछाप-गर्ज्याङ्ग-खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		rgk132kv@nea.org.np

			गोदक स्वयाक १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		godak.soyak132kv@nea. org.np
			सुनकोशी १३२ के.भी.स/स आयोजना		
२९	उप प्रबन्धक	श्री राघवेन्द्र कुमार भा	तुम्लिङ्गटार-सितलपाटी २२० के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९७८८३३४	ts220kv@nea.org.np
			धरान २२०/३३ के.भि.स/सआयोजना		
३०	उप प्रबन्धक	श्री प्रनिल पराजुली	दमक केरुवन वर्जु दुहवी १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८४९६१४०१५	pokharagrid@nea.org.np
३१	उप प्रबन्धक	श्री अनिल बज्जाडे	पोखरा ग्रिड शाखा	९८५६०००५७७	pokharagrid@nea.org.np
३२	उप प्रबन्धक	श्री रोशन खड्का	दुहवी ग्रिड शाखा	९८५२०४०४१६	duhabigrid@nea.org.np
३३	उप प्रबन्धक	श्री परमाधिर सेन	लालबन्दी सलिमपु/ कुसाहा विराटनगर १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५१९९११८८	
३४	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज साह	ढल्केवर ग्रिड शाखा	९८४५९०३७६७	dhalkebargrid@nea.org. np
३५	सहायक प्रबन्धक	श्री विष्णु प्रसाद देवकोटा	पथलैया हरनिया ४०० के.भी.प्र.ला.ओजना	९८५१३२०८३७ ९८४९९८८८९८	ph132kv@nea.org.np
			धौबादी फलामखानी विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना		dimetlp@nea.org.np
३६	सहायक प्रबन्धक	श्री मनोज प्रसाद चौधरी	वुर्तिबाड-पौदी अमराई- तम्घास-सन्धिखर्क- गोरुसिङ्गे १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५११०३६२१	gac132kv@nea.org.np
३७	सहायक प्रबन्धक	श्री रवि कुमार चौधरी	कोहलपुर सुर्खेत दैलेख १३२ के.भी. प्रशरण लाईन आयोजना	९८४१३७८९०९	sdkj132kv@nea.org.np
			सुर्खेत १३२ के.भि. सवस्टेशन आयोजना		
३८	सहायक प्रबन्धक	श्री रेवत कुमार चौधरी	अत्तरिया ग्रिड शाखा	९८४८७२४३७७	attariagrid@nea.org.np
३९	सहायक प्रबन्धक	श्री बलभद्र अधिकारी	बफिकोट खुंग्री १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८१३६७७९२३	gkm132kv@nea.org.np
			भेरी कोरिडोर ४०० के.भी.प्र.ला.आ.		bheri400kv@nea.org.np
			घोराही माडीचौर १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना		gkm132kv@nea.org.np

४०	सहायक प्रबन्धक	श्री कोमल नाथ आत्रेय	रातमाटे -रसुवागढी- केरुङ्ग ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८४१३९०१९३	rrk400kv@nea.org.np
४१	सहायक प्रबन्धक	श्री रुपेश कुमार शाह	गल्छी रातमाटे २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८०१०८६२६७	t3br220kv@nea.org.np t3br220kv@gmail.com
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-बी)		
			ढल्केवर-बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		balganga132kv@nea.org.np balganga132kv@gmail.com
४२	सहायक प्रबन्धक	श्री भुपेश श्रेष्ठ	अरुण-इनरुवा-तिङ्गला- मिर्चैया ४०० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५१२१२००२	bhupesh.nea@gmail.com.
४३	सहायक प्रबन्धक	श्री अनिल कुमार अधिकारी	चमेलिया-स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी. प्र.ला.आ.आयोजना	९८५११५२००५	csa132kv@nea.org.np
			स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी. प्र.ला.आ.		
४४	सहायक प्रबन्धक	श्री कैलाश पन्थ	पोखरा विरौटा १३२/११ के.भी. प्र.ला.आ.	९८४१७५००८९	
			का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-सी)		
४५	इञ्जिनियर	श्री सुभारम्भ विक्रम शाह	चिलिमे-त्रिशुली २२० के.भी. प्र.ला.आ.	९८५८०३६६६६	ch220kv@nea.org.np
४६	इञ्जिनियर	श्री शिवराम ताम्राकार	भक्तपुर-वानेश्वर-पाटन ६६ के.भी. प्र.ला. क्षमता अ.आ.	९८४१७८०१२४	bbp66kv@nea.org.np
			सुनकोशी १३२ के.भि.स/स आ.		
			न्यू खिम्ती लामोसाँघु काठमाडौं प्र.ला.क्ष. अ.आ.		
			मलेखु १३२ के.भी. स/स वि.आयोजना		malekhu132@nea.org.np
४७	ईञ्जिनियर	श्री अर्जुन महर्जन	पाल्पा २२० के.भी. सवस्टेशन आयोजना	९८४९१०२०६७	palpa220kv@gmail.com
४८	ईञ्जिनियर	नारायण प्रसाद सापकोटा	औराह १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना	९८५१२३४१५१	
			हेटौडा-विरगंज ६६ के.भी.क्ष.अ.आयोजना		hb66kv@nea.org.np
			पूर्वी चितवन १३२		ec132kv@nea.org.np

			के.भी.स/स आ.		
४९	ईञ्जिनियर	श्री रितेश जयसवाल	लम्की चौकुने १३२ के.भी.प्र.ला.आ.	९८५६०३५११९	
५०	ईञ्जिनियर	श्री रवि श्रेष्ठ	का.उ.प्र.प्र.विस्तार आ. (प्याकेज-ई)	९८४१००६७०४	

प्रसारण निर्देशनालयद्वारा आ.व.०७९/०८० को लागि संचालित प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरूको चौथो त्रैमासिक प्रगति सारंश

१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाईन विस्तार

व.उ.शि.नं. ५०१०८१०१

क्र. स	आयोजनाको नाम	चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण				शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत	भार	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति त्रैमासिक बजेट
		भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट रु. हजारमा	अवधिको खर्च रु. हजारमा	अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत							
	प्रसारण निर्देशनालय (१३२ के.भी)											
१	काबेली कोरिडोर १३२ के.भी. प्र. ला. आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	-	-	आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको ।	०.००	०.००	०.००	-

२	सिंगटि- लामोसौघु १३२ के.भी. प्रशारण लाईन	३४.०४	१२२००.००	२८००.००	२२.९५	९९.६६	८९.३३	प्रसारणलाईन तर्फ Tower Foundation/Design, Errection, & Single Circuit Conductor Stringing सम्पन्न . १२६ मध्ये १२६ टावर फाउण्डेशन तथा १२६ वटा टावर इरेक्सन कार्य तथा Single circuit charge भएको। 2nd circuit conductor stringing तार तान्ने कार्य दोलखा जिल्लामा अन्तिम चरणमा । OPGW ३७.८ कि.मी तार तान्ने कार्य सम्पन्न ।	०.९४	०.३२	३४.०४	४९५,३९९.९५
३	कोहलपुर- महेन्द्रनगर १३२ के.भी. प्र. ला. (२०८ कि.मि.)	०.००	०.००	०.००	०.००	-	-	आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको ।	०.००	०.००	०.००	-
४	रामेछाप- गङ्ग्याङ्ग- खिम्ती १३२ के.भी. प्र.ला. (५० कि.मि.)	१०६.७९	७५००.००	८३७८७.५८	११९.७२	१००.००	८५.४३	यस आयोजना ०६६/६७ देखी शुरु भइ २०७९/८० मा single circuit charge गरिएको, हाल second circuit stringing कार्य भईरहेको । विगतमा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यहरु यस अवधिमा भएकोले भौतिक प्रगति बढि देखिएको ।	३.४३	३.६६	१०६.७९	८,००२,९९५.४५

५	रुपनि १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	१५०.००	०.००	०.००	९६.५६	९८.१८	सबस्टेशन चार्ज भई संचालनमा रहेको।	०.००	०.००	०.००	-
६	कुशमा तल्लो मोदि मोदि १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	२२०००.००	१९००.००	८.६४	०.६४	४.४६	आयोजनाको रुटसर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भई बातावरण IEE अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको छ । सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइनको ठेकामा दुई बोलपत्रदाता प्राविधिक रूपमा असक्षम देखिएकोले २०८० असारमा पुन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।	०.००	०.००	०.००	-
७	कुसाहा- कटैया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	१००.००	५०००.००	४३६९९.००	८७३.९८	९०.२०	९७.५७	यसआव को स्वीकृत बजेट कार्यक्रम भन्दा बढी भएको खर्च ने.वि.प्रा को श्रोत बाट भएको 2nd circuit तथा LILO को निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको र स।स मा ट्रान्सफरमर सहित ४ वटा Line Bay चार्ज भएको छ ।	०.४६०	०.४६०	१००.००	५००,०००.००

८	रक्सौल- परवानीपुर १३ २ के.भी. प्रसारण लाईन दोस्रो सर्किट निर्माण सहित	१००.००	२०००.००	३४१८७.००	१७०९.३५	११३.८०	६२.०९	यसआव को स्वीकृत बजेट कार्यक्रम भन्दा बढी भएको खर्च ने.वि.प्रा को श्रोत बाट भएको। प्रथम सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएर बिधुत आयात समेत भईरहेको छ। 2nd circuit को निर्माण कार्य सम्पन्न भई Bay निर्माण कार्य ८०% सम्पन्न भएको छ र ROW क्षतिपूर्तिको काम भईरहेको । विगतमा सम्पन्न भएको कार्यहरुको भुक्तानी यस अवधिमा भएकोलेवित्तिय प्रगति बढि देखिएको ।	०.६२	०.६०	१००.००	२००,०००.००
९	हेटौडा- विरगंज ६६ के.भी प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	८६.९३	९४.६५	आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य विगत आ. व मा सम्पन्न भएको।	०.००	०.००	०.००	-

१०	नयाँमोदी- लेखनाथ १३२ के.भी. प्र.ला (४५ कि.मि.)	२४०.४३	४९०००.००	२३१०१३.३०	४७१.४६	१११.६०	९५.९९	सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन ठेकाको अन्तिम भुक्तानी चौथो त्रैमाशिकमा भएकोले प्रगति बढीदेखिन आएको । दुवै ठेकाको 5% Retention money बाकी रहेको । भौतिक निर्माण कार्य सम्पूर्ण सम्पन्न भई पौष १४,२०७९ बाट सबै सबस्टेशन तथा प्रसारण लाइन संचालनमा आएको । लाहाचोक देखि लेखनाथ २३ कि.मि खण्डको ROW क्षतिपूर्ति मुल्यांकनभई वितरण भईरहेको । मन्त्रिपरिषदबाट वन स्वीकृति प्राप्त भएको र सम्झौता गरि वनकटान कार्य सुरु हुने । जग्गा उपलब्धि र क्षतिपूर्तिमा चौमशिक लक्ष्य भन्दा बढीप्रगति हासिल भएकोले भौतिक प्रगति बढ्न गएको । विगतमा सम्पन्न हुनुपर्नेकार्यहरु तथा सो को भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिबढि देखिएको ।	१.४१	३.३९	२४०.४३	११,७८०,८५१.०६
----	--	--------	----------	-----------	--------	--------	-------	---	------	------	--------	---------------

११	सोलुकोरिडर १३२ के.भी. प्र. ला. (९० कि.मि.)	९६.४५	४१८१८.००	१५००३६.००	३५८.५८	८०.१०	९८.२८	आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई प्रसारण लाइन संचालन भई रहेको ।	१.४१	१.३६	९६.४५	४,०३३,५०९.२२
१२	बुर्तीबाड- पौदी-अमराई- तम्घास- सन्धिखर्क- गोरुसिंगे १३ २ केभी प्रसारण लाइन आयोजना	८८.४३	२६२८००.० ०	२१९६९८.६३	८३.६०	७३.७०	७७.७८	मोतिपुर रसन्धिखर्क १३२/३३ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्जभइसकेको । मोतिपुर- सन्धिखर्क खण्ड प्रसारण लाइन चार्ज भईसकेको । ८४.६ सर्किट कि.मीमध्ये ७५ सर्किट कि.मी तार ताले काम सम्पन्न । तम्घास, पौदीअमराई र बुर्तिबांग १३२/३३ के.भी सबस्टेशन निर्माण कार्य भै रहेको । सन्धिखर्क बुर्तिबांग प्रसारण लाईन खण्डमापर्ने बन क्षेत्रको रुख कटानमा ढिलाई भईरहेको ।	५.६२	४.९७	८८.४३	२३,२४०,४९८.२२
१३	बुटवल (गोरुसिंगे)- लुम्बिनी १३२ के.भी. प्र.ला.(२२ कि.मि.)	०.००	११२५००.० ०	८१०८१.००	७२.०७	९३.८४	९९.५९	कार्य सम्पन्न भएको अन्य सिभिल निर्माण कार्यको भुक्तानी ।	०.००	०.६०	०.००	-

१४	कुशाहा विराटनगर १३२ के.भी. प्र. ला.	०.००	२३०००.००	५४८८६.००	२३८.६३	४५.०५	४६.५९	सबस्टेशन तर्फस्टाफ क्वाटर, कन्ट्रोल बिल्डिङ तथागार्ड हाउसको निर्माण कार्य भईरहेको, Electrical Equipments को फाउण्डेशन डिजाईनहरु Approve भई फाउण्डेशन कार्य भइरहेको, Major Equipments Site Deilver भैसकेको। ।प्रसारण लाईन तर्फजग्गा मूआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको।कूल ८० मध्ये ७३ वटा फाउण्डेशन निर्माण तथा ७२ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको। Conductor, Insulator and Hardware Fittings Inspection कार्य सम्पन्न भई Dispatch हुने क्रममा रहेको । तेश्रो त्रैमाशिकमा गत बर्सको पेशकी फर्चौट गरि खर्च लेखांकन गरेकोले वित्तीय प्रगति बढी हुन गएको ।				
१५	बलेफि- वाह्विसे १३२ के.भी. प्र.ला. आयोजना	१५५.५९	६५५००.००	४०७७०.००	६२.२४	६३.९६	४८.८६	साइटमा foundation निर्माणको कार्य भएको तर ठेकेदारबाट bill पेश नभएकोले भुक्तानी नभएको ।	६.६२	१०.३०	१५५.५९	१०,१९१,०८७.६१

१६	दोर्दी कोरीडोर १३२ के.भी प्रसारण लाइन आयोजना	९३.४४	११५००.००	४०६७.००	३५.३७	८६.८३	९९.०८	२०७९/१२/२३ मा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन चार्ज भई संचालनमा आएको . प्रसारण लाइनको मार्गीधिकार क्षेत्रमा परेको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व रवातावरणीय सुधारका कार्यहरु विनियोजित बजेट भन्दा कम खर्चमा सम्पन्न भएको साथैअन्तिम बिल सम्झौता हुदाको ठेक्का रकम भन्दा करिब ३ करोड कम खाएको कारण कार्य सम्पन्न भएतापनि खर्च कम भएको ।	१.२२	१.१४	९३.४४	१,०७४,५९०.१६
१७	पूर्वी चितवन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	०.००	२१००.००	१३७०.००	६५.२४	१०१.८४	९३.८८	स./स निर्माण कार्य सम्पन्न भई हाल चालु अवस्थामा रहेको र ११ के.भी फिडर मार्फत करीब ८ मे.वा. विद्युत आपूर्ति भैरहेको।	१.२३	०.००	०.००	-
१८	ढल्केबर- लोहारपट्टी १३२ के.भी प्रसारण लाईन (२० कि. मि.)	४९.३०	१४२२५०.० ०	३००४७.००	२१.१२	४९.२०	६२.९०	प्रसारण लाईनकोटावर, conductor साईटमा प्राप्त भएको, सबस्टेशनको Steel Structure, SF6 CB, LA साईटमा प्राप्त, Tower Foundation 95%, Tower	१२.९०	६.३६	४९.३०	७,०१३,२५५.८१

								Errection 35% सम्पन्न ।				
१९	अमरपुर ढुंगेसाँगु १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना	८०.५६	५९४५०.००	२२९९७.३६	३८.६८	४.७०	५.३५	आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फ ठेक्का सम्झौता भईसकेको ।	५.७६	४.६४	८०.५६	४,७८९,०२७.७८
२०	कोहलपुर- सुर्खेत-दैलेख १३२ के.भी प्रसारण लाईन अयोजना	४०५.५८	७७४००.००	३९२१०९.२५	५०६.६०	२८.७५	३१.२३	सुर्खेत दैलेख खण्डको IEE स्वीकृत भई बोलपत्र आव्हान गर्न लागत अनुमान स्वीकृत भई दस्तावेज स्वीकृतिको क्रममा रहेको । ४५ tower foundation को कार्य शुरु सम्पन्न भएको। समान उपलब्धिमा बढी प्रगति हासिल भएकोले भौतिक प्रगति बढी भएको ।	२.५१	१०.१८	४०५.५८	३१,३९१,७१३.१५
२१	ढल्केबर बाल गंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना	१८.०५	८४४००.००	१३५५१.००	१६.०६	२०.३०	१६.५८	प्रशारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको IEE स्वीकृत भएको । बालगंगा सवस्टेशन रहने जग्गामा Compound wall & Store With Guard House निर्माण सम्पन्नभएको। सवस्टेशन निर्माण स्थलमा माटो परिक्षणको कार्य सम्पन्न	३.९९	०.७२	१८.०५	१,५२३,००७.५२

								भएको। प्रसारण लाईन निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता भई conductor आयात भएको र design/drawing review हुँदै गरेको ।सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्र आह्वान भएको ।				
२२	लालबन्दी – नवलपुर – सलिमपुर १३२ के.भी प्रसारण लाईन अयोजना	०.००	४९०००.००	११९१६३.००	२४३.१९	६.७२	११.६५	खरिद गरिएको जग्गामा कम्पोउड वाल तथा स्टोर सहित गार्ड हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न, Construction license को काम सम्पन्न भएको । प्रसारण लाईन तथा सबस्टेशनको लागी २०७९/१२/२७ मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।				-
२३	पथलैया – हरनियाँ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना	११६.०८	३११८०.००	८६८७९.००	२७८.६४	८.८७	१०.००	आयोजनाको नाम तथा स्कोप परिवर्तन भई नया नाम निजगढ हर्नैया ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना कायम भएको . 'सर्भेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको ,सबस्टेशनको जग्गा प्राप्ति भएको ।	१.४३	१.६६	११६.०८	३,६१९,४९६.५०

२४	भुमहि (सुनवल) – हकुई १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना (१६ कि.मि)	५७.१४	५१०००.००	५८६००.००	११४.९०	१९.७८	१६.५७	सबस्टेशन निर्माण तथा लाईन निर्माणको लागी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न । लाईनको निर्माणको लागि चेक सर्भे, माटो परिक्षण कार्य सम्पन्न, टावर डिजाइन कार्य सुरु . सबस्टेशन निर्माणको कम्पाउनड बाल निर्माणसुरु विगतमा सम्पन्न भएको कार्यहरुको भुक्तानी यस अवधिमा भएकोले वित्तिय प्रगति बढि देखिएको ।	१.९६	१.१२	५७.१४	२,९१४,२८५.७१
२५	गोदक– अनारमनि १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना (३५ कि.मि)	१२.५०	३११५०.००	५९८.००	१.९२	०.२०	०.३३	अनारमनि सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा प्रारम्भिक अधिकृत तोक्न मिति २०७८।११।११ मा लेखि पठाएको, माग भए बमोजिम मिति २०७८।१२।१७ मा थप विवरण पठाएकोमा नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मार्पत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको तर लामो समयसम्म निर्णय भइ नआएकोले अपेक्षाकृत प्रगति हासिल	१.०४	०.१३	१२.५०	३८९,३७५.००

								गर्न नसकिएकोले भौतिक तथा वित्तिय प्रगति कम हुन गएको ।				
२६	वाफिकोट- खुंग्री १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना (५० कि.मि)	६२.५९	५००००.००	१७६५८.२३	३५.३२	३.१३	४.१७	रोल्पाको खुंग्री देखि रुकुमको बाफिकोट सम्मको १३२ के.भि. (करिब ७५ कि.मि.) प्रशारण लाईनको डिटेल् सभै सम्पन्न भएको। साथै वातावरण अध्ययनको काम भईरहेको । साथै रोल्पा जिल्लाको कुटिचौरमा निर्माणहुने १३२/३३ के।भी सबस्टेशनको लागि जग्गा अधिकरणको काम सम्पन्न भई compound wall तथा सिभिल निर्माण कार्यको समेत आगाडी बढेको . साथै मुख्य ठेक्काको इस्टिमेट स्वीकृत भई बोलपत्र कागजात तयार भईरहेको ।	२.७०	१.६९	६२.५९	३,१२९,६२९.६३

२७	सुनकोशी १३२ के.भी.सबस्टे शन अयोजना	३७.०५	२०००.००	६००.००	३०.००	१.७१	१.०७	यस आयोजना ०६६/६७देखी शुरु भइ ०७२/७१ सम्म प्रारम्भिक कार्यमै समय व्यतित भएको, साथै बर्हिबसेमा २२०/१३२ के.भी सबस्टेशनको निर्माण कार्य समेत आर्थिक वर्ष(०७५/७६) बाट शुरु भएकोतर निर्माण अनुमति पत्रको अवाभ/ प्राप्तिको पहिचान नभएकोले निर्माण कार्य आगाडी बढाउन समस्या भएकोमा मिति २०७९/०७/२३ को कार्यकारी निर्देशक ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठक अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाएको ।	०.४४	०.१६	३७.०५	७४,१०७.९६
२८	सम्पतिया- मैनहिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अयोजना (३५कि.मि)	२१६.१६	१८०००.००	१११५०८.००	६१९.४९	६८.००	९२.०८	लाईन निर्माणको कार्य सम्पन्न, क्षतिपुर्ति र मुअब्जाको कार्य भइरहेको । विगतमा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यहरु तथा सो को भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले भौतिक तथा वित्तियप्रगति बढि देखिएको ।	२.११	४.५६	२१६.१६	३,८९०,९००.४७

२९	गोदक- स्वायाक १३२ के.भी. प्रसारण लाइन अयोजना (१६कि.मि)	२६.७९	१३२५०.००	२६७५.००	२०.१९	४.१४	७.७५	प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन कार्यको ToR स्वीकृतभई IEE स्वीकृत भएको । आयोजनाको विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त पेश गरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र कागजात तयार गरि स्विकृतिका लागि पेश भएको ।	३.७७	१.०१	२६.७९	३५४,९७३.४७
३०	लम्ही घोराही सबस्टेशन विस्तार आयोजना	१००.००	१५००.००	२७७.००	१८.४७	१००.००	१००.००	लम्ही र घोराही सबस्टेशन निर्माण कार्य सम्पन्न ।	०.२१	०.२१	१००.००	१५०,०००.००
३१	रुपनि बोदेबरसाइन १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	०.००	२४०००.००	६५७.००	२.७४	३.०४	३.९२	आयोजनाको IEE स्वीकृति भएको । Boundary wall निर्माणको कार्यको सम्पन्न भईसकेको र प्रसारण लाइनको estimate स्वीकृत भई Tender गर्ने चरणमा रहेको । विगतमा सम्पन्न भएको कार्यहरुको भुक्तानी यस अवधिमा भएकोले वित्तिय प्रगति बढि देखिएको ।	१.२९	०.००	०.००	-

३२	चन्द्रपुर सुकदेवचौक १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	१६८.३८	५३८०१.००	६३०६४.००	११७.२२	७.२९	८.९८	चन्द्रपुर देखिराजपुर सम्म करिब ३५ कि.मि. १३२ के.भि. प्रसारण लाईन निर्माण गरि यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठामा १३२।३३।११ के.भि. सबस्टेशन निर्माणको अध्ययन कार्यसम्पन्न भइ सबस्टेशनको जग्गामा सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको । IEE report स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्रको लागत अनुमान र बोलपत्र कागजात तयारी भईरहेको ।	२.५३	४.२६	१६८.३८	९,०५८,९८२.६१
३३	लहान सुखिपूर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	६३.६४	२४०००.००	४२८५.००	१७.८५	२.७७	४.२२	आयोजनाको IEE स्वीकृत भईसकेको । Boundary Wall निर्माणको कार्य सम्पन्न भईसकेको । प्रसारणलाइनको इस्टिमेट स्वीकृत भएको	१.२९०	०.८२१	६३.६४	१,५२७,४४१.८६
३४	LDC सुद्विधिकरण आयोजना	०.००	१०४००.००	०.००	०.००	२.६६	९९.२४	निर्माणकार्य सम्पन्न ।	०.००	०.००		-
३५	नवलपुर १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन	०.००	६०.००	४.००	६.६७	८०.५९	९६.६४	सबस्टेशन चार्ज भई सन्चालनमा रहेको। कुल लागतको तुलनामा कम लागतमा ठेक्का पट्टा व्यवस्था	०.००	०	०.००	-

	आयोजना							भएकोले भौतिक प्रगति तथा वित्तिय प्रगति सन्तुलन नदेखिएको। साथै आयोजना सम्पन्नगर्न योजनाको सम्पूर्ण कार्यक्रम क्रियाकलाप मध्ये केहि कार्यक्रम क्रियाकलाप गर्नु नपरेकोले भारित प्रगति १००% नभएको । सबस्टेशनको हरहिसाब पुजिकरण हुन बाकिरहेको ।				
३६	भक्तपुर- बानेश्वर-पाटन ६६ के.भी प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धिआयो जना	०.००	३१००.००	०.००	०.००	९०.१३	९८.०५	भक्तपुरबानेश्वर पाटन तथा पाटन स्युचाटार ६६ के.भी (सर्किट १ तथा सर्किट २) तथा चपलीचाबहिल ६६ के.भी प्रसारण लाइनको तर बदलि कार्य बिगत आ.व मै सम्पन्न भईसकेको । ठेक्का सम्झौता अनुसारका Spare parts(Except one drum 3.015 km ACCC Conductor) हरु ग्निड कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको । बाकि रहेको conductor समेत निर्माता कम्पनीबाट निर्माण भई आयोजनाको site मा आउने क्रममा रहेको ।	०.००	०.००	०.००	-

३७	चमेलिया- स्याउले- अत्तरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट आयोजना	०.००	१५००.००	०.००	०.००	७९.१५	१००.००	दोश्रो सर्किटजडान कार्य करिब १२५ कि.मि. सम्पन्न । चमेलिया सवस्टेशनको सम्पूर्ण कार्यसम्पन्न भएको, स्याउले सवस्टेशनमा सम्पूर्ण सिभिल कार् र तथा टावर सम्पन्न भएको। र अत्तरिया स.स. मा CT,CVT Circuit Breaker, Lightening Arrester उपकरण जडान कार्य सम्पन्न भएको।	०.००	०.००	०.००	-
३८	झुरझुरे 132 के.भी. प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशन आयोजना	०.००	२१८०.००	०.००	०.००	०.३५	०.२१	सर्वेक्षण अध्ययनको कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको, सर्वे सर्वेक्षण अनुमति पत्रको लागि DoED पेश गरिएको। आयोजनाको IEE कार्यको लागि परामर्शदाता संग सम्झौता भई सो कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ।	०.००	०.००	०.००	-
३९	सुर्खेत १३२ के।भी। सवस्टेशन आयोजना	९२.९१	१७६२५०.० ०	१६३३५४.०५	९२.६८	२४.२२	२७.३३	आयोजनाको NHE संगठेका सम्झौता भई survey,layout Approval को काम सम्पन्न भई soil test तथा design /drawing approval को चरणमा रहेको छ।	१८.९	१७.५६	९२.९१	१६,३७५,३९६.८३
४०	पोखरा विरौटा १३२ के।भी प्रसारण लाईन आयोजना	३०.२२	२८०००.००	२२९.००	०.८२	१.७७	२.३७	Consultant Selection को Financial Evaluation भईरहेको	१.८२	०.५५	३०.२२	८४६,१५३.८५

४१	स्याउले साँफेबगर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन	०.००	१४२००.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०	०.००	०.००	-
४२	काठमाण्डौ उपत्यका प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	०.००	३५०००.००	५००.००	१.४३	३.३३	०.०२	आयोजनाको विस्तृत सर्भेक्षण कार्य भईरहेको तथा जग्गा प्राप्तिको लागि कार्य भईरहेको । परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको ।	०.२१	०.००	०.०	-
४३	पोखरा लेखनाथ १३२ के.भी. प्रसारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि	०.००	०.००	८०६१.२६	८०६१.२६	१०५.७०	१००.००	आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई २०७९/१२/०२ गते लाइन चार्ज भएको ।	०	०.००	०.००	-
४४	मलेखु १३२ के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	२४.९४	८२५००.००	१९८४६.००	२४.०६	५५.८६	६०.०१	सबस्टेशन विस्तार कार्यका लागि आवश्यक सामानहरु जस्तै Transformer, CB, LA, DS साइटमा आइसकेको तथा सबस्टेशनहरुको Civil Foundation कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । अन्य बाकि रहेका Electrical Equipments हरुको Design Drawing Approval हुने क्रममा रहेको ।	३०.३९	७.५८	२९.९४	२,०५७,७४९.२६
४५	खिम्ती (लामोसाँघु)	०.००	११००.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१	लागत अनुमान तयारी कार्य भइरहेको ।	०	०.००	०.००	-

	राकाथुङ्ग (रामेछाप) १३२ के.भी. प्रशारण लाईन											
४६	सुर्खेत चौकुने १३२ के.भी. प्रशारण लाईन	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०३	०.०४	प्रशारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन भइरहेको।	०	०.००	०.००	-
४७	न्यु खिम्ती लामोसाँघु काठमाण्डौ प्रशारण लाईन क्षमता अभिवृद्धि	६७.०३	८७१०६.००	२४१२३.००	२७.६९	८४.००	८५.१३	कुल ४५ कि.मी.प्रशारण लाईन मध्ये करिब २२.५ कि.मी.प्रशारण लाइनको तार बदली कार्य सम्पन्न भएको। ने.वि.प्रा. व्यवस्थापनबाट थप ३० करोड बजेट आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरि स्वीकृत भए अनुसार आयोजनाको स्वीकृत बजेटभन्दा खर्च बढी देखिएको। हाल प्रशारण लाइनको सटडाउन उपलब्ध नभएको हुदाँ काम रोकिएको र प्रणाली संचालन विभाग संगको समन्वयमा चाडै कार्य आरम्भ हुने अवस्था रहेको	१६.५६	११.१०	६७.०३	५,८३८,६२६.८१

४८	प्रसौनी विरगंज १३२ के.भी. भुमिगत विधुत प्रशारण लाईन	०.००	१४३६३०.० ०	९६१६०.००	६६.९५	३.००	९.३०	जग्गा अधिग्रहण कार्य भइरहेको। ठेक्का सम्झौता भई detail design, detail survey कार्य भइरहेको विगतमा सम्पन्न भएको कार्यहरुको भुक्तानी यस अवधिमा भएकोले वित्तिय प्रगति बढि देखिएको।	४.५७	०.००	०.००	-
४९	दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाईन आयोजना	०.००	१७००.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१	अध्ययन सम्बन्धी कार्य शुरू गरिएको।	०	०.००	०.००	-
५०	लमही घोडागाड बाफीकोट प्रशारण लाईन विस्तार आयोजना	०.००	०.००	०.००	०.००	०.०१	०.०१	अध्ययन सम्बन्धी कार्य शुरू गरिएको।	०	०.००	०.००	-
५१	प्रसारण लाईन अध्ययन आयोजना	०.००	३१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	प्रशारण लाइनको सर्भेक्षण/अध्ययन कार्य अन्तर्गत ४ वटा आयोजनाहरु छनोट गरि व्यवस्थापनबाट स्वीकृति लिनको लागि टिप्पणी पेश भएको।	०.००	०.००	०.००	-
५२	खिम्ती – ढल्केबर २२० के.भी.	०.००	०.००	०.००	०.००	९९.००	९९.९५	पहिलो सर्किटको निर्माण कार्य सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको तथा दोस्रो	०.००	०.००	०.००	-

	प्रसारण लाईन (७५ कि. मि.)							सर्किट अन्तर्गत 75 कि.मि. तार टाँगे कार्य सम्पन्न भई २०७८-३-१६ मा चार्ज भएको।				
५३	हेटौडा- भरतपुर २२० के.भी. (७५ कि.मि.)	३८७.५०	२३५००.००	६४८७०.००	२७६.०४	९८.०९	९६.०१	कुल २२६ मध्ये २२५ वटा tower foundation सम्पन्न । २२४ tower errection सम्पन्न । ७३ कि.मि तार तान्ने कार्य सम्पन्न । Land acquisition compensation को १००% कामसम्पन्न, ROW compensation को १००% काम सम्पन्न, Forest Cutting को 100% काम सम्पन्न ।	०.३२	१.२४	३८७.५०	९,१०६,२५०.००
५४	भरतपुर- बर्दघाट २२० के.भी. प्र.ला. (७५ कि.मी)	१४४६.८ १	१४५००.००	१६९२८६.००	११६७.४९	९६.४९	९८.६१	कुल २४६ मध्ये २४४ वटा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भएको, २४४ वटा टावर जडान भएको र १४८ सर्किट कि.मि. Stringing सम्पन्न भएको ।	०.४७	६.८०	१४४६.८ १	२०,९७८,७२३.४०
५५	कोशी कोरिडोर २२० के.भी. प्र.ला. (१२० कि.मि.)	९७.७८	३११०००.० ०	६७४१८२.०८	२१६.७८	९०.६६	८६.६२	प्याकेज १ -ईनरुवा - वसन्तपुर -तुम्लिङटार प्रसारण लाईन खण्डको सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट लाईन २२० के.भी मा चार्ज भई संचालनमा रहेको। वानेश्वर,	१.८०	१.७६	९७.७८	३०,४०८,८८८.८९

							तुम्लिङटार र ईनरुवा सबस्टेशनहरुको सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भई २०७९।०४।१९ गते बाट सो सबस्टेशनहरु २२० के.भी मा चार्ज भई संचालनमा रहेको तथा वसन्तपुर सबस्टेशनको कार्य ९०% सम्पन्न भई हाल Testing & Commissioning कार्य भईरहेको । प्याकेज ३ वसन्तपुर ढुंगेसाँघु २२० के.भी. प्र.ला तथा ढुंगेसाँघु स।स निर्माण अन्तर्गत प्रसारण लाईन तर्फ कुल १२७ मध्ये ११८ वटा टावरको फाउण्डेशन, १०९ वटा टावरको इरेक्सन तथा जम्मा ३४ कि.मि मा २६ कि.मि. तार तान्ने कार्य सम्पन्न गरेको। ढुंगेसाँघु सबस्टेशन तर्फ Pre-Commissioning & Testing कार्य भईरहेको । विगतमा सम्पन्न भएको कार्यहरुको भुक्तानी यस अवधिमा भएकोले वित्तिय प्रगति बढि देखीएको ।				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

५६	त्रिशुली ३ बी. हब सबस्टेशन आयोजना	१०८.०२	१०४५७५.००	१६१९०५.०५	१५४.८२	८७.०७	९५.३५	HGIS, DG. Earthing materials को भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले भौतिक प्रगतिको तुलनामा आर्थिक प्रगति कम देखिएको HGIS भन्सार आइसकेको र Design/drawing पेश सम्बन्धि करिव ९९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न । CVT, CT,PT को manufacturing भइरहेको र CB, Isolator, BPI को inspection सकिएको । Gabion को करिव ६५०० घन मिटर र २४००० वर्ग मि. कार्य भएको । Earthing को कार्य ७५ प्रतिशत भएको माटो filling को लागि करिव ४५ हजार cubic ल्याइसकेको र filling को कार्य ९० प्रतिशत भएको । Transformer Installation को काम सम्पन्न र ५३३ वटा equipment को foundation कार्य सम्पन्न । Control Building को कार्य सम्पन्न र ७ वटा SPR building को निर्माण सकेको र २ वटा निर्माण हुदै । Gantry Foundation and	२.३७	२.५६	१०८.०२	११,२९५,८६४.९८
----	--	--------	-----------	-----------	--------	-------	-------	--	------	------	--------	---------------

								equipment foundation ९९ प्रतिशत र ४४ वटा errection सम्पन्न। त्रिशूल नदीमा र खोलामा Shear Wall कार्य सम्पन्न । access road / cable trench को कार्य जारी। RCC को करिब १०००० घन मिटर Masonry Wall को करिब ६८०० घन मिटर कार्य भएको।				
५७	चिलिमे त्रिशुली २२० के. भी. प्रसारण लाइन आयोजना	१००.००	१३८७८६.६ ०	२१३२२६.३९	१५३.६४	७२.६३	८६.४०	Boundary Wall को ९५% कार्य सम्पन्न । 132 र २२० के.भी. Gantry Pedestral Foundation सम्पन्न। CVT Foundation & LA Foundation ८०% सम्पन्न । 43 Tower Foundation सम्पन्न , 28 Tower Errection सम्पन्न । Stringing 0 Km । Protection कार्य जारी रहेको । स्थानीय प्रसासन तथा स्थानीय सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने । वन कटान सम्बन्धि प्रक्रिया सरल हुनपर्ने ।	४.००	४.००	१००.००	१३,८७८,६६०.००
५८	लेखनाथ- दमौली	९३.१२	१७१५००.० ०	२४८६४.००	१४.५०	७.१८	९.६६	आयोजनाको Feasibility study सम्पन्न । दमौली	२.६६	२.४८	९३.१२	१५,९७०,१३१.५८

	२२० के.भी. प्र.ला. (४५ कि.मी.)							जग्गाको मुल्यांकन भई मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती वितरण भईसकेको । Transmission line license उर्जा मन्त्रालयबाट प्रदान भएको । वातावरण सम्बन्धिकार्य भईरहेको । दमौलि स।स मा पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माणको कार्य भईरहेको । आयोजनाको दमौलीमा कर्मचारी आवास निर्माण कार्य भईरहेको । आयोजनाको प्रसारण लाइन Package A तथा सबस्टेशन निर्माण Package B को टेन्डर भई मुल्यांकन भईरहेको				
५९	धरान २२०/३३ के.भी. सबस्टेशन अयोजना	४.३१	२४१२५.००	२६०२.२३	१०.७९	५.५२	७.३७	बजेटको सुनिश्चितता नभएकोले सबस्टेशन निर्माणको लागि बोलपत्र आहवान हुन नसकेको ।	५.११	०.२२	४.३१	१०३,८६४.९७
६०	तुम्लिङगटार- सीतालपाटी २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८.८१	८६३५.००	५४७०.७१	६३.३६	१२.१३	१७.४०	प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का २०७९/०७/२१ बाट प्रभावकारी भईसकेको तथा निर्माण कार्य भईरहेको. आयोजनाको बचत बजेट बाट खर्च भएकोले वित्तीय	१.६८	१.६६	९८.८१	८५३,२२०.२४

								प्रगति सात प्रतिशत भन्दा बढी देखिएको ।				
६१	गल्छी – रातमाटे २२० के.भी प्रसारण लाईन योजना	१०.३७	२९९००.००	१६७२.००	५.५९	०.६०	०.६६	प्रसारण लाईनको survey तथा अध्ययन सम्पन्न र आयोजनाको IEE को स्वीकृतिको लागि बिधुत विकाश विभागमा पेश भएको ।	१.३५	०.१४	१०.३७	३१०,०७४.०७
६२	पाल्पा २२०/१३२ के.भी. सवस्टेशन	५५.३५	४०५५८.००	२१२७८.००	५२.४६	३.६३	५.२०	वातावरण अध्ययन कार्य सम्पन्न भइरहेको र Final IEE कोलागि प्रक्रिया भइरेको, Feasibility अध्ययन सम्पन्न भइरहेको र Final Feasibility Report पठाइएको । १७२ रोपनी जग्गा खरिद कार्यको मुल्य निर्धारण भइसकेको । सवस्टेशनको सर्भे कार्य र माटो परिक्षणको कार्य सम्पन्न भइरहेको । मुआब्जा वितरण भइरेको करिव ६५ प्रतिशत सम्पन्न ।	१.५९	०.८८	५५.३५	२,२४४,७१९.५०
६३	काठमाण्डौ उपत्यका प्रशारण प्रणाली विस्तार	०.००	२१०५०००.००	१३९१०९.२९	०.००	०.२०	०.२०	जग्गा उपलब्धी सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाइएको तथा सवारी साधन खरिदमा खर्च भएकोले वित्तीय प्रगति बढी देखिएको ।				-

६४	हेटौडा- ढल्केवार- इनरुवा ४०० के.भी. सबस्टेशन विस्तार आयोजना	९०.९१	११५५०.००	४३२५१८.०६	३७४४.७५	९६.०९	९२.५६	२०७८ कार्तिक २।३ गते इनरुवामा आएको बाढीले खराब भएका सम्पूर्ण GIS का सामानहरु replacement भएको । ४०० के.भी ढल्केवरसबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेको । हेटौडा र इनरुवा सबस्टेशनमा GIS को जडान तथा CRP , SAS को अन्तिम टेसटिंग तथा comissioning कार्य भईरहेको। हेटौडा र इनरुवा सबस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य ९८% सम्पन्न भएको ।	०.११	०.१०	९०.९१	१,०५०,०००.००
६५	अरुण- ईनारुवा तिङ्गला मिर्चैया ४०० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	४७०.३०	३००००.००	३८७५५.५४	१२९.१९	२२.१३	७९.२१	हाल Detail Engineering Design तर्फ परमशुदाताले TL 1 (Arun Hub-Inaruwa) को Survey, Tower Spotting, Tower Pegging, Assess Constructability and Geotectinal Investigation सम्पन्न गरि Transmission Line and Substaion Design कार्य भईरहेको छ । TL 2 (Tingla-Dudhkoshi) को Survey, Tower Spotting कार्य सम्पन्न भएको TL ३ (Arun Hub-Tingla) को Survey, Tower Spotting कार्य सम्पन्न भएको TL 4	५.३५	२५.१८	४७०.३०	१४,१०९,०७७.३३

								(Inaruwa-Anarmani) को Survey, Tower Spotting, Tower Pegging, Assess Constructability and Geotectinal Investigation सम्पन्न गरि Transmission Line and Substaion Design कार्य भईरहेको छ । अघिल्लो त्रैमाशिकमा बाकी रहेको कार्यहरु यस चौथो त्रैमाशिकमा सम्पन्न भएको हुदा भौतिक प्रगति बढ्न गएको तर बजेट अभावको कारण परामर्शदाता बाट सम्पन्न सम्पूर्ण कार्यहरुको भुक्तानी गर्न नसकिएकोले भौतिक र वित्तीय प्रगति फरक परेको ।				
६६	भेरी कोरिडोर ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	०.००	२८००.००	६२३.१३	२२.२५	८.८८	९.५५	उत्तरगंगा सबस्टेशनको लागी बाफिकोट गा.पा. को भेडाखेतमा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भईसकेको । प्रशारण लाईनको सर्भे कार्यको काम अघि बढाइएको । सिभिल निर्माण कार्य अन्तर्गत कम्पाउण्ड वाल तथा स्टोर भवन निर्माण सम्पन्न भई सकेको ।	०.०७८	०.००	०.००	-

६७	रातेमाटे- रसुवागढी- केरुङ ४०० के।भी प्रसारण लाईन आयोजना	१२४.८३	३०००.००	२६५६.६४	८८.५५	३६.३०	४०.३४	Optimized Route को विस्तृत सर्वे कार्य सम्पन्न भएको । Cadastral Survey draft report प्राप्तभएको । Geo technical investigation कार्य सम्पन्न भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त । EIA कार्यको लागि परामर्शदाता द्वारा Scoping तथा TOR प्रतिवेदन पेश गरिएको । उर्जा मन्त्रालय र SGCC बिचको Power Grid Interconnection Cooperation Agreement मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट अद्यावधिक भई हस्ताक्षर भएको । ने.वि.प्रा. र चिनको SGCC बीच चौथो joint meeting २०८०/०२/३० गते Beijing, China मा सम्पन्न ।	२.८६	३.५७	१२४.८३	३७४,४७५.५२
६८	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा ब्यापार हेटौँडा (दुहवी ४०० के।भी। प्रसारण लाईन	३८.८९	१११०२५०. ००	४२५९८८.००	३८.३७	८२.२२	८४.५६	कुल ७९२ मध्ये जम्मा ७५२ स्थानमा टावर फाउण्डेशन र ७२९ स्थानमा टावर ईरिक्सन कार्यसम्पन्न । हेटौँडा सबस्टेशनमा निर्माण कार्य जारी रहेको । ईनरुवा (दुहवी) सबस्टेशन संचालनमा रहेको ।	५.७६	२.२४	३८.८९	४३,१७६,३८८.८९

	आयोजना											
६९	थानकोट (चापागाउँ (भक्तपुर १३२ के।भी। प्रशारण लाइन आयोजना	०.००	७५०.००	६५९.००	८७.८७	२९.१०		काठमाण्डौमा ६ कि.मी (पुरै सम्पन्न) , भक्तपुर जिल्लामा २ कि.मि. सम्पन्न (४ कि.मि. मध्ये)लाईन तान्ने काम सम्पन्न । ललितपुर जिल्लामा प्रसारण लाईनको ROW को ९।९ मिटरदाँया बाँयाको क्षतिपूर्ति सतप्रतिशत माग गरीएको कारण सम्पूर्ण लाईनको काम बन्दहुन पुगेको ।	०.००	०.००	०.००	-
जम्मा			६११७२०५	४५६५९०८	७४.६४							
औषत भौतिक (भारित) प्रगति (प्रतिशत)			५२.०२						१७४.८ ५	१५३.९ ६	८८.०५	३१८,२४३,२३४.४८
औषत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) (खर्च तथा बजेटको रकमको आधारमा)			७४.६४									

५.६ योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय


५.६.१. पृष्ठभूमी

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका ९ वटा निर्देशनालयहरू मध्ये एक महत्वपूर्ण निर्देशनालय योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय हो । योजना, अनुगमन, विद्युत व्यापार, सूचना प्रविधि, आर्थिक विश्लेषण जस्ता क्षेत्रहरू समेटिएको यो निर्देशनालय उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्व रहने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Corporate Wing हो ।

यस निर्देशनालय अन्तर्गत देहायका ५ वटा विभागहरू रहेका छन् :

- १) प्रणाली योजना विभाग
- २) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग
- ३) विद्युत व्यापार विभाग
- ४) सूचना प्रविधि विभाग
- ५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

५.६.२. संगठनात्मक स्वरूप

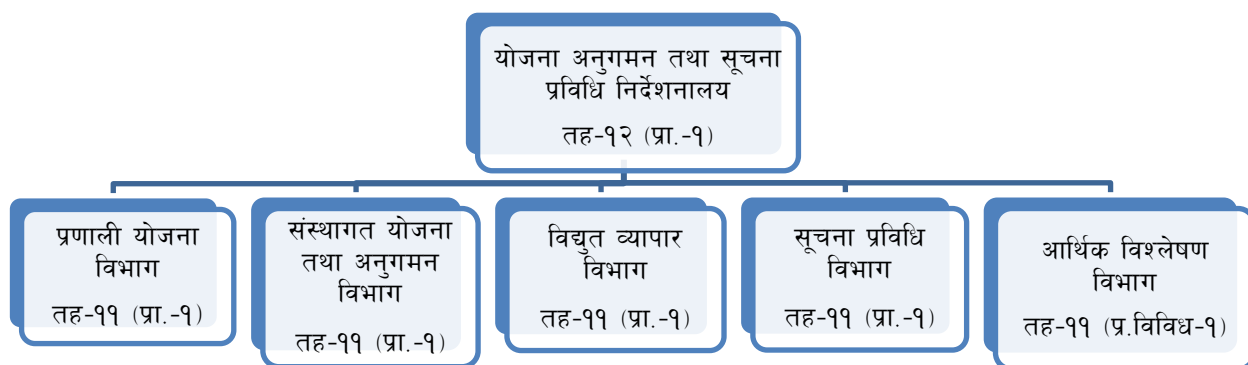

५.६.३. निर्देशनालयका प्रमुख कार्यहरु

यस निर्देशनालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न विभागहरुको प्रमुख कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

१) प्रणाली योजना विभाग

- Grid Impact Study (GIS) गर्ने ।
- Load Forecast गर्ने ।
- Transmission Plan Study and Energy Simulation Analysis गर्ने ।

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको बजेट/वार्षिक विकास कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयको सफ्टवेयर LMBIS मा इन्ट्र गरी टुंगो लगाउने र वार्षिक विकास कार्यक्रम, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने ।
- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुबाट प्राप्त मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण अध्ययन, विश्लेषण तथा सारांश तयार गर्ने ।
- आर्थिक सर्वेक्षण तथा पूँजीगत खर्चहरुको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने ।
- बजेट कार्यन्वयन कार्ययोजना तथा संशोधनको लागि श्री कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष सिफारिश गर्ने ।
- संस्थागत विकास योजना(Corporate Development Plan) तयार गरी कार्यकारी निर्देशकज्यू समक्ष पेश गर्ने ।
- आयोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन, लगायत अनुगमनको कार्य गर्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।

३) विद्युतव्यापार विभाग

- विद्युत खरीदविक्री सम्झौता (राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय) गर्ने ।
- विद्युत खरीद विक्री सम्झौता संशोधन गर्ने ।
- निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने ।

४) सूचना प्रविधि विभाग

- कम्प्युटर नेटवर्किङ व्यवस्थापन गरी चुस्त दुरुस्त राख्ने ।
- ने.वि.प्रा.को वेबसाइट तथा इमेल ठेगानाहरु अद्यावधिक गर्ने ।
- CIS Software संचालन, व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
- हाजिरी सफ्टवेयर संचालन तथा अद्यावधिक गर्ने ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

- प्राधिकरणको समग्र वित्तीय ,आर्थिक, व्यापारिक र बजार अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।

- विद्युत सेवाको महशुल तथा लागत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने ।
- जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको जोखिम र तुलनात्मक लाभको अध्ययन गर्ने ।

निर्देशनालय र यस अन्तर्गत रहेका विभागकाजिम्मेवार अधिकारी र सम्पर्क नम्बर :

क्र.सं	निर्देशनालय/विभाग	जिम्मेवार अधिकारी	मोबाइल नम्बर	कार्यालय नं.
१	योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय	उपकार्यकारी निर्देशक श्री प्रदीप कुमार थिके	९८४१३५४६६४	४१५३०६६
२	विद्युत व्यापार विभाग	निर्देशक श्री प्रबल अधिकारी	९८४९६९९७३३	४१५३११०
३	संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग	नि.प्रमुख श्री मनोज यादव	९८५१२३६७६५	४१५३०७३
४	सूचना प्रविधि विभाग	निर्देशक श्री अनिलमान श्रेष्ठ	९८५१०४६१९९	४१५३०६३
५	आर्थिक विश्लेषण विभाग	निर्देशक श्री जयरामभण्डारी	९८४१२४२६५५	४१५३२०१
६	प्रणाली योजना विभाग	प्रमुख श्री नारायण प्रसाई	९८४१३४८९१४	४१५३०७५

विभागहरूले सम्पादन गरेको कामको विवरण

१) प्रणाली योजना विभाग

ने.वि.प्रा.को विभिन्न विभाग मार्फत आएको अनरोध बमोजिम २०८० साल बैशाख महिना देखि आषाढ महिनासम्म यस प्रणाली योजना विभागले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।

२०८० साल बैशाख महिना देखि आषाढ महिनासम्म GIS सम्पन्न भएका जलविद्युत आयोजनाहरू

S.N.	NAME OF HPP	CAPACITY (MW)	COD	Substation Name	Voltage Level (Kv)
1	Betan Karnali	438.93	2029/30	Betan Hub	400
2	Omega Sunigad	14	2029/30	Bajhang	33
3	Phukot Karnali	480	2029/30	Phukot Hub	400
4	Mathillo Modi	18	2028/29	New Modi	132
5	Mai Khola	4.44	2023/24	Godak	33
TOTAL		955.37 MW			

Beside GIS, System Planning Department has done the followings :

- i. Fault Analysis of New Marshyangdi Substation, Udipur Substation, Khudi Substation.

२) संस्थागत योजना तथा अनुगमन विभाग

- नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरूको मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- MDAC, NDAC meeting को लागि आवश्यक विवरण तयार गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरेको ।
- पूँजीगत खर्चहरूको विवरण अद्यावधिक गरी उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा समयमै पेश गरेको ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत विभिन्न निकायहरूबाट माग भएको विवरणहरू तयार गरी समयमै उपलब्ध गराएको ।

- आ.व २०८०/८१ को लागी आवश्यक वैदेशिक ऋण तथा सहयोग,नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. को बजेट मस्यौदा तयार गर स्वीकृतिको लागी पेश भएकोमा आवश्यक सशोधन सहित स्वीकृत भएको ।
- ने.वि.प्रा.का आयोजनाहरुको आ.व २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम माग गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको ।

३) विद्युत व्यापार विभाग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग रहेको छ । यस विभागको मुख्य कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (च) बमोजिम निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० (घ) अनुसार विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद तथा विदेशी मुलुकलाई विद्युत बिक्री कार्य गर्ने अधिकार समेत यस विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

यस विभागलाई कारोवार विकास, निर्माण कार्यान्वयन, व्यापार तथा अर्थ र संसाधन व्यवस्थापन गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ र सोही बमोजिम यस विभागले गर्ने मुख्य कार्यहरु निम्नानुसार वर्गीकरण गरिएका छन्:

१. कारोवार विकास:

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले प्रवर्द्धन गर्ने विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने उर्जा खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्द्धक कम्पनीहरुविच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने ।

२. निर्माण कार्यान्वयन:

विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म निज आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

३. व्यापार तथा अर्थ

व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरुको सम्पूर्ण व्यापारिक कार्यहरु गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

४. संसाधन व्यवस्थापन

विभागको आवश्यक प्रशासनिक कार्य ।

हालको मिति सम्ममा (मिति: २०८०।०३।३१) यस विभागबाट ४०२ विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल ८३४६ मे.वा. जडित क्षमताका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । जस मध्ये कुल २१०७.७२ मे.वा. जडित क्षमताका १६३ विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको उर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भैसकेका छन् भने बाँकी कुल ६२३८.०७ मे.वा. जडित क्षमताका २३९ विद्युत आयोजनाहरु निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

IPPs' Hydro Power Projects (Operation) as of Baishak to Asar 2080

S.N.	Developer	Projects	Location	Capacity (kW)	PPA Date	Commercial Operation Date
1	Saurya Bidhyut Power Pvt. Ltd.	Grid Connected Solar Project, Nawalparasi	Nawalparasi	2000	2077.12.20	2080.01.02
2	Pure Energy Pvt. Ltd.	Solar PV Project (1033), Nainapur, Banke, Block-2	Banke	10000	2078.08.12	2080.01.18
3	Peoples' Hydropower Company Pvt. Ltd.	Super Dordi 'Kha'	Lamjung	54000	2071.11.13	2080.02.08
4	Beni Hydropower Project Pvt. Ltd.	Upper Solu	Solukhumbu	18236	2069.09.16	2080.03.01
5	Maya Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd.	Maya Khola	Sankhuwasabha	14900	2070.08.30	2080.03.22
			TOTAL	99,136.00		

४) सूचना प्रविधि विभाग

- १) सूचना प्रविधि विभागले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट digitalized गरी स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न अग्रगामी-भूमिका खेल्दै आएको छ ।
- २) २१ औं शताब्दीको सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रुपान्तरण गर्न NEA IT Policy (Guidelines) अनुसार NEA IT Roadmap तयार गरिसकेको छ । जसबाट सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी तदनुरूपको Software, Hardware तथा Network Systemहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
- ३) Personal Information System (PIS), Darbandi Management System (DMS) लाई पुरानो प्रणालीबाट Software मार्फत digitize गरी स्तरबृद्धि गरिने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै हाल ने.वि.प्रा.मा सञ्चालनमा रहेको Vacancy Software मा Performance Appraisal Module तथा Promotional Management Module लाई Automate गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
- ४) Centralized E-Attendance Softwareलाई उत्पादन, प्रसारण तथा विभिन्न वितरण केन्द्र/Project Office मा जोडिने कार्य पनि शुरु भै अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै Device Integration Application (DIA) पनि जडान गर्ने कार्य शुरु भैसकेको छ । जसबाट Real time attendance data उपलब्ध हुनेछ । Centralized E-Attendance Software लाई Centralized Payroll System संग API को माध्यमबाट हाजिरी प्रतिवेदन लिने ब्यवस्थाको परिक्षण गरिसकेको

र आगामी दिनमा सोही अनुसार हुने कार्य अगाडी बढीसकेको छ । जसबाट Real time attendance data उपलब्ध हुनेछ ।

- ५) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हरेक युनिट अफिस (वितरण केन्द्र तथा सो अन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरु), प्रादेशिक कार्यालयहरु तथा ने.वि.प्रा. का अन्य कार्यालयहरुलाई Inter connection गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी Network Communication अझ चुस्त दुरुस्तगर्न Service Division WAN जस्ता कार्य पनि अगाडी बढाइएको छ ।
- ६) Internal Audit प्रक्रियालाई Software मार्फत Digitize गरी संचालन गर्न Software निर्माणको कार्य सम्पन्न भई Testing को क्रममा रहेको छ ।
- ७) CRM (Customer Relationship Management System) मा Three Phase Application Module थप गरी ग्राहकहरुले Online मार्फत निवेदन दर्ता गराउन मिल्ने व्यवस्था भैसकेको छ भने Single Phase Meter ग्राहकहरुको लागि पनि कार्य शुरु गर्ने पहल भैरहेको छ । साथै Centralized Customer Call Center -No-Light Response System, Customer Care Center) संचालन भै हालको लागि काठमाडौंको विभिन्न वितरण केन्द्रहरुलाई उक्त Call Center मा जोडी ग्राहकहरुको गुनासो समाधान गर्ने कार्य अघि बढिसकेको छ । साथै निकट भविष्यमा देशव्यापि रुपमा उक्त Call Center लाई संचालनमा ल्याउने कार्यको लागि आवश्यक पहल तथा तयारी भैरहेको छ ।
- ८) ग्राहकहरुको स्थान पहिचान गरी भविष्यमा कुन स्थानको ग्राहक हो भन्ने यकिन गर्नको लागि यस CRM Portal मा GIS Map Integration गर्ने कार्य को लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ ।
- ९) Security Event and Information Management (SEIM) तथा Endpoint Protection System संचालन गरी NEAको Intranet/Internet Network लाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने कार्य अगाडी बढेको छ ।
- १०) नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा रहेका सबै किसिमका सवारी साधनहरुको विवरण बैज्ञानिक एवं भरपर्दो रुपमा व्यवस्थित गर्न Vehicle Management System तयार भै हाललाई देशभरीको सम्पूर्ण सवारी साधनहरुको विवरण राख्ने कार्य भैरहेको छ, साथै CAIS संग Link गरी सम्पूर्ण सवारीहरुको खर्चलाई पारदर्शी बनाउनको लागि कार्य सुचारु भईसकेको छ ।
- ११) Retirement Fund Management System (RFMS)लाई समयसापेक्ष Upgradation गरी Centralized गर्ने कार्यको पनि आवश्यक तयारी अगाडी बढाइएको छ ।
- १२) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको Loan Service लाई centralized गरी व्यवस्थित software बनाउनको लागि प्रारम्भिक छलफल गरी software निर्माणको कार्य अघि बढाइसकेको छ ।

- १३) ने.वि.प्रा. केन्द्रिय कार्यालय परिसरभित्र कार्य सहज गर्नका लागि Internet /Intranet प्रयोगकर्ताहरूका लागि Access Point प्रविधि लागू गर्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- १४) ने.वि.प्रा. कानून विभागको लागि मुद्दाहरूको Record Keeping गर्न Kanoon Management System तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ ।
- १५) ने.वि.प्रा. वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको लागि टिप्पणीहरूलाई केन्द्रिकृत रूपमा टिप्पणीको Workflow Management गर्नका लागि Tippani Management System तयार गरी लागू गर्ने प्रकृयामा रहेको छ ।

५) आर्थिक विश्लेषण विभाग

१. **Capital Investment Plan-** आगामी १० वर्षका लागि लगानी चाहिने मुख्य क्षेत्रहरू, उत्पादन, प्रसारण र वितरण, तर्फका आयोजनाहरूको लगानीको श्रोत सम्बन्धि अध्ययन कार्यको तालिका तयार गरी मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी भइरहेको ।
२. **Financial Analysis-** प्राधिकरणको आर्थिक योजना एवम् वित्तिय विश्लेषण सम्बन्धी विभिन्न निकायका विवरण अध्ययन कार्य भएको ।
३. **Consumption Pattern-** Consumption Pattern को अध्ययन गर्न विवरण संकलन कार्य गरिएको ।
४. **Regulatory Compliance** - नियमन आयोग तथा उर्जा मन्त्रालयबाट माग भए बमोजिमको आवश्यक Regulatory Compliance सम्बन्धी विवरण तयार गरिएको ।
५. **Cost of Service-** Cost of Service को लागि उपभोक्ता वर्गिकरण अनुसार ग्राहस्थ, औद्योगिक, व्यापारिक वर्गको विवरण संकलन तथा विश्लेषण गरि अध्ययन कार्य गरिएको ।
६. **विद्युत महशुल अध्ययन सम्बन्धी कार्य-** विद्युत महशुलका विवरण सम्बन्धी अध्ययन कार्य भएको ।
७. आगामी ५ वर्षको लागि उर्जा क्षेत्रका विभिन्न indicator हरूको तथ्याङ्क संकलन तथा विश्लेषण सम्बन्धि कार्य भइरहेको ।
८. **Strategic Action Plan-** नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परिदृश्य (Mission), दिर्घकालिन दृष्टिकोण (Vision), लक्ष्य (Goal), उद्देश्य (objective), सबल-दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौती (SWOT analysis) आदि संलग्न गरि तयार गरिएको Strategic Action Plan सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको ।

५.७. आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

५.७.१. परिचय :


नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय विशेष गरि एशियाली विकाश बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता अभिवृद्धि, वितरण लाइन एवं वितरण सवस्टेशन क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले ने.वि.प्रा. संचालक समितिको ६७८ औं बैठकबाट मिति २०७१/०३/२४ मा स्थापना भएको हो । यस निर्देशनालयले आयोजनाहरुको तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ने.वि.प्रा.का सम्बन्धित ग्रिड तथा वितरण केन्द्रहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

५.७.२. निर्देशनालयको प्रमुख कार्यहरु:

- क) एशियाली विकाश बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गर्ने एवं तिनको अनुगमन तथा मुल्यांकनको कार्य गर्ने ।
- ख) एशियाली विकाश बैंकको ऋण नं. २५८७, २८०८, ३५४२, ३१३९, २९९०, २९९१ तथा अनुदान नं. ०३६१, ५२० अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणतर्फ आवश्यक आयोजनाहरु तर्जुमा गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
- ग) आयोजनाहरुको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, कार्यक्र मतयार गरि स्वीकृत गराउने, आबधिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने तथा आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।
- घ) आयोजनाहरुको उपलब्धि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने ।
- ङ.) आयोजनाहरुको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायएवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने ।
- च) आयोजनाहरुको लेखापरीक्षण गराई सो को प्रतिवेदनतयार गरी तालुक निकायएवं एशियाली विकाश बैंकमा पेश गर्ने ।
- छ) निर्देशनालय तथा अन्तर्गतका आयोजनाहरुको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु संचालन गर्ने ।

५.७.३. निर्देशनालयको संगठनात्मक संरचना :

PROJECT MANAGEMENT DIRECTORATE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

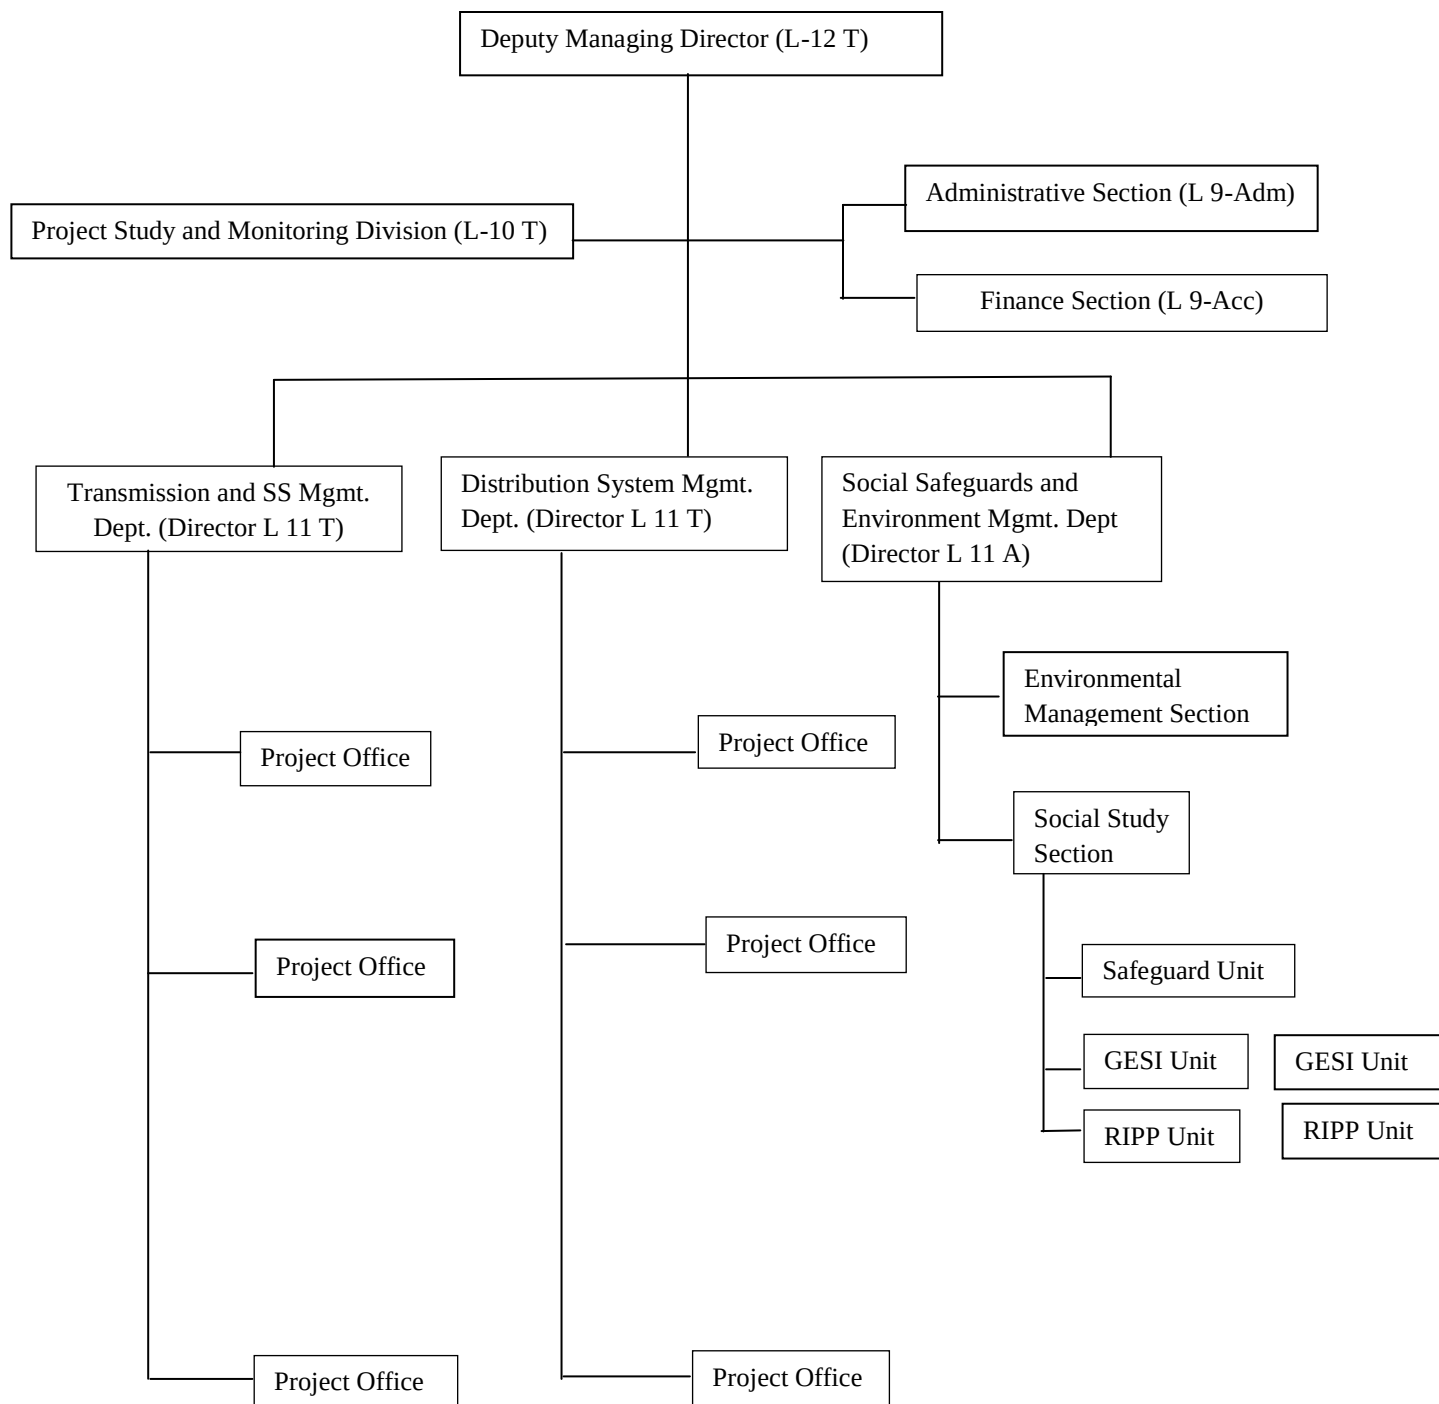

५.७.४आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालय तथा आयोजनाहरुको प्रमुखहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बर :

सि.नं.	पद	नाम	कार्यालय/आयोजनाको नाम	सम्पर्क नं.
१	उप कार्यकारी निर्देशक	तारा प्रसाद प्रधान	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८४१३३७०६८ ९८५१३३७०६८
२	निर्देशक	राजनऋषि कंडेल	सामाजिक सुरक्षण तथा वातावरण व्यवस्थापन विभाग	९८४१३४५४२३
३	निर्देशक	चन्धा न्यौपाने	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२४८२४०
४	प्रबन्धक	बोधराज ढकाल	वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा बिस्तार आयोजना	९८४१२३९७७७
			तनहुँ विद्युतिकरण आयोजना	
			प्रदेश नं २ ग्रामिण विद्युतिकरण आयोजना	
			विद्युत वितरण विस्तार आयोजना	
५	प्रबन्धक	लक्ष्मीनारायण मुखिया	बोरांग भर्लांग रातमाटे नैविसे २२० के.भी. प्रसारण लाइनआयोजना	९८५५०५७६५९
६	प्रबन्धक	रञ्जन राज गुरूङ्ग	कोहलपुर नेपालगंज १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	९८५११५५७५२
			अरुणखोला दुम्किवास १३२ के.भी. सव्स्टेशन आयोजना	
७	प्रबन्धक	नितिश पौडेल	तामाकोशी काठमाण्डौ २००/४०० के.भि. तथा १३२ के.भि.प्रसारण लाइनआयोजना	९८५११५३१४६
८	प्रबन्धक	जुजुरत्न शाक्य	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना	९८४००५०१०६
			लप्सीफेदी तथा चांगुनारायण सव्स्टेशन निर्माण आयोजना	
९	प्रबन्धक	चन्दनकुमार घोष	कालीगण्डकी प्रसारण कोरिडोर आयोजना	९८५१०८५१११
१०	प्रबन्धक	थर्कवहादुर थापा	समुन्द्रटार त्रिशुली ३ वी हव १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना	९८४१२२४९३९
११	प्रबन्धक	विवेन्द्र कुमार भ्ना	नयाँ वुटवल लमहि कोहलपुर ४०० के.भी.प्र.ला. आयोजना	९८५११२२९३२
१२	प्रबन्धक	रमणराज शर्मा	आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय	९८५१२३२९९५
१३	प्रबन्धक	नारायण रेग्मी	मर्स्याङ्दी कोरीडोर २२० के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना	९८५५०५७६५९
१४	उप निर्देशक	सुसान्त वास्तोला	अर्थ महाशाखा	९८५१२१५२५९
१५	उप निर्देशक	सिताराम तखाछे	प्रशासन महाशाखा	९८४१४७६३६६
१६	उप प्रबन्धक	अभय प्रसाद न्यौपाने	काठमाण्डौ उपत्यका सव्स्टेशनअटोमेशन आयोजना	९८४१२९५६३०
			हेटौडा परवानिपुर पोखरिया १३२ के.भि.प्र.ला.आयोजना	
			वितरण प्रणाली/ग्रामीण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना	
१७	उप प्रबन्धक	अभिषेक अधिकारी	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना	९८४१३२४३९०
			काठमाण्डौ उपत्यका मध्य तथा उत्तर वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना	
			ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना	

१८	उप प्रबन्धक	सुमन श्रेष्ठ	प्रसारण तथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना	९८५११८१६६६
			काठमाण्डौ उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वि.प्र.सुदृढीकरण आयोजना	
१९	उप प्रबन्धक	रविन्द्र श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका स्मार्ट मिटरिंग आयोजना	९८५११५७४२८
			डाटा तथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना	
२०	उप प्रबन्धक	उकेश श्रेष्ठ	काठमाण्डौ उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजना (फेज २)	९८५१०७७७१२
			चोभार-पाटन-चापागाउँ भूमिगत १३२ के.भी. प्र.ला.आ.	
२१	उप प्रबन्धक	प्रकाश पौडेल	खिम्ति बाह्रविसे लप्सीफेदी ४०० के.भि. सबस्टेशन आयोजना	९८५११७६५७१
			प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परामर्श आयोजना	
२२	उप प्रबन्धक	विश्वरञ्जन मिश्र	न्यू वुटवल-वर्दघाट २२० के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना	९८५११४०६२३
२३	उप प्रबन्धक	रोशन अग्रवाल	डाँडाखेत राहुघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	९८४९४८४९०३
२४	उप प्रबन्धक	राजन ढुंगेल	पाङ्गताड १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५१२०२३०९
२५	उप प्रबन्धक	बलभद्र अधिकारी	घोराही माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना	९८१३६७७९२३
२६	सहायक प्रबन्धक	बोधनाथ न्यौपाने	वितरण तथा ट्रांसफार्मर खरिद आयोजना	९८५११२६७००
			अरुणपुल तिडलन हव न्युखिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हव ढल्केवर ४०० के.भि. प्र.ला. आयोजना	
२७	सहायक प्रबन्धक	पियुष मालाकार	काठमाण्डौ उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१२८५३१२
२८	सहायक प्रबन्धक	अमित भगत	ग्रिड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २	९८५२०५९०४४
२९	सहायक प्रबन्धक	विजयकुमार श्रेष्ठ	स्मार्ट मिटरिंग आयोजना (फेज २ समेत)	९८४१२४५६०७
३०	सहायक प्रबन्धक	सागरमणी ज्ञवाली	चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण आयोजना	९८५११४०२३०
३१	सहायक प्रबन्धक	लक्ष्मण फुयाल	मर्स्याङ्दी काठमाण्डौ २२० के.भी. प्र. ला. आयोजना	९८४१३३८२०१
			दुधकोशी जलविद्युत ४०० के.भी. प्र.ला. आयोजना	
३२	सहायक प्रबन्धक	योगेन्द्र ठाकुर	ललितपुर भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८५१३४३५३७
३३	सहायक प्रबन्धक	दर्शन राय यादव	केरौन १३२ के.भी. सबस्टेशन आयोजना	९८५१०७३२७३
३४	सहायक प्रबन्धक	सुमित श्रेष्ठ	अमलेखगञ्ज सबस्टेशन निर्माण आयोजना	९८४१५३४९३७
३५	सहायक प्रबन्धक	राजेन्द्र कोईराला	१३२ के.भी कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना	९८५११४९२४४
३६	ईन्जिनियर	आनन्द सुवेदी	भरतपुर पोखरा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना	९८४१९७४४५५

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय

नेपाल सरकार तथा ने.वि.प्रा. द्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बजेट शीर्षक नं.	आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक प्रगति विवरण			अवधि लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रतिशत	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	शुरुदेखि यस अवधि सम्मको प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			भारित प्रगति प्रतिशत	बजेट (रकम रु. हजारमा)	खर्च (रकम रु. हजारमा)				
				जम्मा बजेट	जम्मा खर्च				
क	१३२ के.भी तथा अन्य भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरू	५०१०८१०१							
१	समुद्रटार-त्रिशुली ३"वी" हब १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना		९३.१२	१०२५००	७५८१२	७३.९६	१०६.६८	९९.९८	निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको । EIB तर्फको ऋण प्राप्त नभएकोले नेपाल सरकारबाट खर्च गरिएकाले नेपाल सरकारतर्फ विनियोजित बजेट भन्दा बढी खर्च देखिएको ।

२	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सदृढिकरण आयोजना		२७.३५	३५००००	१०९८४१	३१.३८	२९.४३	३४.५६	चोभारमा निर्माण हुने सवस्टेशनमा Soil Investigation सम्पन्न भईसकेको, फुटुङ्गमा निर्माण हुने सवस्टेशनको Boundry Wall तथा च्मतवप्लप्लन धर्वा निर्माण कार्य करिव ५०५ सम्पन्न भएको । सवस्टेशनको जग्गा प्राप्तीको लागी ने.वि.प्रा.को स्रोतबाट खर्च गरिएको ।
३	प्रसारणतथा वितरण सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		९७.५७	११५०००	११०८२६	९६.३७	५१.६४	५२.७८	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको । GIS Mapping कार्य सम्पन्न भएको ।
४	काठमाण्डौं उपत्यका सवस्टेशन अटोमेशन आयोजना		६५.३१	३१००००	१९४६६३	६२.७९	८३.८२	८५.८३	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री साईटमा आईपुगी पाटन र बनेपा सवस्टेशनमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर सवस्टेशनमा निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको छ । बनेपा सवस्टेशन लाई बानेश्वरमा रहेको MCC मा पनि Integrate गरि हेर्ने कार्य गरिएको ।
५	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढिकरण आयोजना फेज २		८१.७३	१३२०००	१०६४९५	८०.६८	१.७२	१.४८	बालकुमारी सवस्टेशनको Estimate तथा बोलपत्र कागजात तयार भै ADB बाट स्वीकृतीको चरणमा रहेको । भक्तपुर थिमी प्र.ला. को ठेक्का सम्झौता भई डिजाईन चरणमा रहेको ।

६	हेटौडा परवानीपुर पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		५.१३	२४८०००	२०७६८	८.३७	३.३७	२.२१	हेटौडा- परवानीपुर- पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना अन्तर्गत पोखरीया सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्र मुल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई Concurrence को लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पठाईएको । परवानीपुर-पोखरीया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माणको लागि परामर्शदातबाट क्याडस्ट्रल सर्भे तथा Design कार्य भईरहेको । पथलैया-परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अन्तर्गत HTLS अपग्रेडीङ्ग कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्कन कार्य चालु । निजगढ-पोखरीया ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको IEE, रमौली तथा निजगढ सबस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणको कार्य भईरहेको ।
७	१३२के.भी. प्रसारण कन्डक्टर अपग्रेड आयोजना		९९.१०	७०००००	६०३२५६	८६.१८	३२.२१	३४.७२	चौकिटोल सबस्टेशन देखी कमाने क्षेत्र सम्मको सर्भे कार्य सम्पन्न भएको। चौकिटोल सबस्टेशन देखी कमाने क्षेत्र सम्मको पहिलो सर्किट तार फेर्ने कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको साथै दोस्रो सर्किट तार फेर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
८	ग्रीड सबस्टेशन अटोमेशन आयोजना फेज २		९७.३५	३२००००	३०५९३४	९५.६०	१४.५३	१५.५५	GE T & D India Limited संग आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई सर्भे कार्य सम्पन्न,

									Design, Drawings Review भईरहेको ।
९	काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन तथा सब्सटेशन आयोजना		०.००	१२५००	०	०.००	०.००	०.००	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।
१०	डाडाखेत राहूघाट १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		९९.०२	१००००००	७३६८९१	७३.६९	४३.३०	३८.९६	बालकुमारी सबस्टेशनको Estimate तथा बोलपत्र कागजात तयार भै ADB बाट स्वीकृतीको चरणमा रहेको । भक्तपुर थिमी प्र.ला. को ठेक्का सम्झौता भई डिजाईन चरणमा रहेको ।
११	घोराही-खुम्दी-माडीचौर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना		९४.९४	३५०००००	२९४४४८	६९.२७	९४.५५	९७.५७	हेटौंडा- परवानीपुर- पोखरिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन आयोजना अन्तर्गत पोखरिया सबस्टेशन निर्माणको बोलपत्र मुल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई Concurrence को लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पठाईएको । परवानीपुर-पोखरिया १३२ के.भी. प्रसारण लाईन निर्माणको लागि परामर्शदातवाट क्याडस्ट्रल सर्भे तथा Design कार्य भईरहेको । पथलैया- परवानीपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाईन अन्तर्गत HTLS अपग्रेडीङ्ग कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्कन कार्य चालु । निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको IEE, रमौली तथा निजगढ

									सवस्टेशनको जग्गा अधिग्रहणको कार्य भईरहेको ।
१२	पन्गताङ 132 के.भी. सबस्टेशन आयोजना		२२.१२	२९००००	४००	०.१४	९.३२	१७.५९	चौकिटोल सवस्टेशन देखी कमाने क्षेत्र सम्मको सर्भे कार्य सम्पन्न भएको। चौकिटोल सवस्टेशन देखी कमाने क्षेत्र सम्मको पहिलो सर्किट तार फेर्ने कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको साथै दोस्रो सर्किट तार फेर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
१३	केरौन १३२ के.भी. सवस्टेशन आयोजना		१२.८१	५४००००	१०१४०८	१८.७८	३२.२०	३०.०२	कर्मचारी आवास भवन तथा गार्ड हाउसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । सवस्टेशन निर्माणको लागि निर्माण सामग्री परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको तथा विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा रहेको । ईक्युपमेन्ट फाउन्डेशनको लागि सिभिल निर्माण कार्य भईरहेको ।
१४	कोहलपुर-नेपालगञ्ज 132 के.भी. प्रसारण लाइन आयोजना		७३.५७	१८००००	२२६०८	१२.५६	९.२८	१७.८४	सवस्टेशन तथा प्रसारण लाईन निर्माण कार्यको लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ।
१५	अरुणखोला-दुम्कीबास 132 के.भी. सबस्टेशन आयोजना		१९.०६	४७६७२०	९७७०२	२०.४९	१८.५९	१८.४४	आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सिभिल निर्माण कार्य सुरु भएको ।
१६	प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढिकरण सुपरिवेक्षण		९३.२६	६००००	५७५६०	९५.९३	२३.०४	२४.८३	परामर्शदाता बाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।

	परामर्श आयोजना								
१७	मूलपानी १३२ के.भी सब्सटेशन आयोजना		५०.२२	३१५०००	१३७९७७	४३.८०	८.९३	१०.२१	ठेक्का सम्झौता भई मोबिलाईजेसन पेशकी भुक्तानी भएको, आयोजनाको प्राविधिक कार्य अन्तर्गत माटो परीक्षण, सर्भे, डिजाइन लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भई डिजाइन कार्य थालनी भएको ।
१८	चोभारपाटन चौपागाउँ भुमिगत १३२ के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		४४.०१	१०७५००	६८४५	६.३७	०.१२	०.४७	पाटन सबस्टेशनको बोलपत्र आब्हान भएको र चोभार पाटन भुमिगत प्रसारण लाईनको प्राविधिक बोलपत्र मुल्यांकन प्रक्रियामा रहेको ।
१९	कालीगण्डकी २२० केभी प्रसारण कोरिडर आयोजना		१००.००	७१००००	६५६८४९	९२.५१	९९.६५	९६.६१	आयोजनाको प्रसारण लाईन तर्फको निर्माण कार्य चालु रहेको ।
२०	मसुर्याङ्दी २२० केभी कोरिडर आयोजना		९७.०८	२००००००	१६७५६८	८३.५८	४९.५०	५६.१८	उदिपुर - भरतपुरको कुल १९३ मध्ये ९० वटा टावर फाउण्डेशन, २४ वटा टावर इरेक्सन कार्य पुरा भएको । उदिपुर र भरतपुर सबस्टेशनको निर्माणको लागि करिव ९७% सामान आपूर्ति भएको ।

२१	मर्स्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना		९५.९३	१२३००००	१३५५७५६	११०.२२	८५.१४	८२.००	प्रसारण लाईन (८२ कि.मी.) अन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भई लाईन चार्ज भएको । मर्स्याङ्दी र मातातीर्थमा निर्माण भईरहेको सबस्टेशन तर्फ स्टाफ क्वार्टर, कन्ट्रोल बिल्डिङ Equipment Foundation तथा Gantry को निर्माण कार्य चालु अवस्थामा रहेको । विगत अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएकोले वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
२२	लप्सीफेदी-चाँगुनारायण सबस्टेशन निर्माण आयोजना		१००.००	१४४००००	१३९५०५०	९६.८८	६६.७५	६७.५९	टेकु सबस्टेशनमा PEB र GIS जडान भई Testing कार्य भईरहेको । चाँगुनारायण, स्युचाटार तथा टेकु सबस्टेशनको लागि आवश्यक Transformer हरु आपूर्ति भएको ।
२३	सुपरीवेक्षण परामर्श सेवा आयोजना		१२५.११	७५०००	८३११४	११०.८२	०.३०	१.६५	फेज १ को विगत अवधिको भुक्तानी समेत यस अवधिमा भएको कारण वित्तीय प्रगती बढी देखिएको ।
२४	न्यू बुटवल-बर्दघाट २२० के.भी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजना		९०.१४	९७००००	५२३९००	५४.०१	७२.७३	८२.०२	न्यू बुटवल सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेको । न्यू बुटवल बर्दघाट खण्डको टावर फाउण्डेशन तथा प्रसारण लाईनको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान कार्य समानान्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको । न्यू बुटवल कुश्मा सबस्टेशन

									विस्तारको लागि लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्र तयारीको कार्य चलिरहेको ।
२५	बोरंग-झर्लाङ-रातमाटे-नोविसे २२० के.भी प्रसारण लाईन आयोजना		५७.६०	८५००००	४५३०००	५३.२९	१८.२०	११.०३	Contract Award भई Advance Payment भुक्तानी भएको ।
२६	नयाँ बुटवल-लमही-कोहलपूर-नयाँ अतरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना		५१.५६	४००००	२५५००	६३.७५	१६.५९	१३.३६	परामर्शदाताले १३२ के.भी. सुर्खेत सबस्टेशन र ४०० के.भी. दोधारा सबस्टेशनको डिजाइन गरी सोको रिपोर्ट पेश गरेको छु यसैगरी परामर्शदाताले नयाँ बुटवल देखि लमही सम्मको ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ (Detail Transmission Line Route Survey, Transmission Line Tower and Foundation Design) का कार्यहरु गरि रिपोर्टहरु आयोजनालाई पेश गरेको ।
२७	अरूणपूल तिडला न्यू खिम्ति तामाकोशी ३ सुनकोशी हब ढल्केवार ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना		३८.७४	८६१५००	३४१५६०	३९.६५	२८.०२	२५.६८	सबस्टेशन तथा प्रसारण लाईनको विस्तृत Design प्रतिवेदन तथा लागत तयार ।
२८	तामाकोशी-काठमाण्डौ २२०/४०० के.भी. प्र.ला.आयोजना		९३.३६	२९५००००	१६८०६२६	५६.९७	६०.०३	६६.२९	बाह्रबिसे- काठमाण्डौ ४०० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण तर्फ ११५ वटा टावर फाउण्डेशन तथा १०७ वटा टावर इरेक्सन कार्य सम्पन्न भई १४ कि.मी.

									तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको यसैगरी खिम्ती- बाह्रबिसे ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको ९७ वटा टावर फाउण्डेशन तथा ८३ वटा टावर ईरेक्सन कार्य भई करिव २३ कि.मी. तार तान्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
२९	अमलेखगञ्ज सबस्टेशन निर्माण आयोजना		१००.००	३६००००	२६७०००	७४.१७	१३.३१	१९.६४	सबस्टेशन निर्माणको ठेक्का सम्भौता सम्पन्न भएको । सबस्टेशन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ३ बिघा मध्ये २ बिघा जग्गा प्राप्त कार्य सम्पन्न भएको ।
३०	EGMP सुपरिवेक्षण परामर्श आयोजना		२६.७४	११००००	३२७७३	२९.७९	१९.८१	२१.००	परामर्शदाताबाट परामर्श सेवा उपलब्ध भईरहेको ।
३१	काठमाण्डौ उपत्यका २२० के.भी. रिङ्गमेन आयोजना		०.००	१२५००	०	०.००	०.००	०.००	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।
ख	अन्य ३३ के.भी. लाईन तथा सबस्टेशन आयोजनाहरु	५०१०८१०३	०.००						
१	वितरणप्रणाली सुद्विडिकरण तथा विस्तार आयोजना		१२.४६	४१५०००	२६३००	६.३४	८८.७६	९५.४९	३३ के.भी. र ११ के.भी. लाईन निर्माण अन्तर्गत अधिकांश लाईन निर्माण सम्पन्न भई सबस्टेशन सञ्चालनमा आई चालु अवस्थामा रहेको ।

२	काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना		७०.२७	८७००००	६३६५२१	७३.१६	७३.११	७२.८४	हालसम्म महाराजगंज स/स अर्नात बुढानिलकण्ठ, चपली, गोल्फुटार, हात्तीगौडा, महाराजगंज लागयतका विभिन्न स्थानमा भुमिगत कार्य हुदै र हालसम्म उक्त सवस्टेशन अन्तर्गत १६५९ वटा सर्भिस फिडर प्यानल ५५४ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको Foundation निर्माण कार्य भएको, १४६८ वटा सर्भिस फिडर प्यानल, ४९७ वटा फिडर प्यानल र २१ वटा RMU प्यानल जडानको कार्य सम्पन्न भएको । वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने क्रममा ४९९ कि.मि. HDPE Pipe Laying गरेको र १५१.९ कि.मि. PLB HDPE Pipe Laying, २९८.१ कि.मी. LT(XLPE) र १५९ कि.मी. HT(XLPE) को Cable Laying कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । १८.६ कि.मी. OFC Cable Layingको कार्य भईसकेको छ । हालसम्म महाराजगंज सवस्टेशन अन्तर्गत ११ कि.मी. HT(XLPE), १ कि.मी. LT(XLPE), १ वटा RMU र ३ वटा सर्भिस फिडर प्यानल Commissioning कार्य भईसकेको । महाराजगंज, पानीपोखरी र गोल्फुटार, मण्डीखाटार, बालुवाटार
---	--	--	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--

									आसपासका सडकमा Road Restoration को कार्य भईरहेको, बुढानिलकण्ठ र पानीपोखरीको सडकखण्डमा Road Restoration भई सडक विभागलाई तथा विभिन्न आन्तरिक सडकहरु का.म.पा. तथा बुढानिलकण्ठ न.पा. लाई हस्तान्तरण भईसकेको ।
३	काठमाडौँ उपत्यका पुर्व तथा दक्षिण वितरण वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना		६६.७५	१०५००००	७०७५१६	६७.३८	७६.२२	६७.२५	रत्नपार्क बि.के. को वितरण प्रणाली भुमिगत गर्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत दोस्रो लटको XLPE, ABC Cable, HDPE/PLB, HDPE Pipes, Feder Pannel लगायतका सामग्री प्राप्त भईसकेको र चुच्चेपाटी चावहिल र मित्रपार्क क्षेत्रमा, नयाँ बजार, लैनचौर, लाजिम्पाट, धोबिखोला कोरिडोर, सामाखुसी, महाकाल, टेकु क्षेत्रमा भुमिगत कार्य भएको । अन्य क्षेत्रमा सडक खन्नु अनुमतिको लागि सडक विभागसँग आवश्यक समन्वय भईरहेको ।

४	काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना		९६.२१	१४२००००	१३७८२८६	९७.०६	४३.५३	६९.८३	१०० कि.मी. ११ के.भी. XLPE Cable तथा ११० कि.मी. ४०० भोल्ट XLPE Cable जडान भईसकेको छ । कालिमाटी-कलंकी, कालिमाटी-बलुवा-चोभार, जडिबुटी-पेप्सीकोला, बागमती कोरिडोर, किर्तीपुर एरिया तथा कलंकी-थानकोटमा एकतर्फको कार्य सम्पन्न भईसकेको
५	वितरण ट्रांसफरर्मर खरीद आयोजना		०.००	१०००	०	०.००	०.०७	०.००	आयोजनाको चालु आ.ब. मा कुनै लक्ष्य नरहेको ।
६	ग्रिडजडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना ग्रिड जडित सौर्य विद्युत उत्पादन आयोजना (VGF)		०.००	३२९०००	५३४	०.१६	०.०५	०.०२	प्रस्तावकहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको । ५ वटा (२४ मे.वा.) प्रस्तावकहरु सबैले ने.वि.प्रा. सँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको । विद्युत खरिद सम्झौता गरेका ३ कम्पनीको (११ मे.वा.) निर्माण सम्पन्न भएको ।
७	ग्रामिण विद्युतीकरण गुरु योजना आयोजना		१००.००	१०५००	९४९७	९०.४५	९२.४९	१००.००	आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई यसै अवधिमा सबै भुक्तानी भएको ।
८	तनहुँ विद्युतीकरण आयोजना		९२.५४	१३५०००	२६३००	१९.४८	८७.७४	९४.२५	निर्माणका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई सबस्टेशन चार्ज भईसकेको ।

९	ललितपूर भक्तपूर वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना		९९.९२	७८५०००	४७७४५७	६०.८२	१५.४६	२५.२५	भक्तपुर, ठिमीमा १८८ वटा Feeder Pillar Foundation र ६२ वटा Feeder Pillar Erection कार्य सम्पन्न भएको । पाटन सबस्टेशन र मध्यपुर ठिमी क्षेत्रमा ११ के.भी. १० कि.मी. तथा LT लाईन ५ कि.मी. भूमिगत कार्य सम्पन्न भएको ।
१०	पोखरा भरतपूर वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना		५६.१६	१३०००००	५१६०२४	३९.६९	२३.६०	३७.६२	सर्भे Soil Investigation र GPR Survey को काम सम्पन्न भएको । Design र Drowing कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । पेखरा कुँडहर सबस्टेशन र ईलाका वन कार्यालयको कम्पाउन्ड भित्र पाईप विच्छयाउने कार्य सम्पन्न भएको, भरतपुरमा ३३ के.भी. को पाईप तथा केबलको कार्य सम्पन्न, ११ के.भी. तथा ४०० भोल्टेजको कार्य चलिरहेको ।
११	विद्युतवितरण विस्तार आयोजना		९४.१७	१०२०००	६७३०३	६५.९८	९५.००	९८.००	निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आईसकेको ।
१२	औधोगिक क्षेत्र कोरिडोर आयोजना		०.००	२५००	०	०.००	०.००	०.००	चालु आ.व.मा आयोजनाको कुनै लक्ष्य नरहेको ।

ग	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना	५०१०८१११५	०.००	०					
१	संस्थागत सुदृढीकरण आयोजना		६.९०	१८९००००	१३५९११	७.१९	२.५२	२.८७	Package-1: Supply and Installation of Enterprise Resources Planning (ERP) को लागत अनुमान स्वीकृतीको लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पठाएको । Package -2 : Supply and Installation of Revenue Management System (RMS) को 9th January 2023 मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई Advance Payment भुक्तानी भएको। Package-3 Project Management Consultant (PMC) को लागि प्राप्त बोलपत्रहरुको सम्पूर्ण मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी एशियाली विकास बैङ्कमा बुझाइएको र न्यूनतम कबोलदातासँग Negotiation गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।
घ	विद्युत विकास दशक सम्बन्धि कार्य योजना	५०१०८१२७	०.००						
१	स्मार्ट मिटरिङ्ग आयोजना		६०.००	४१५०००	२३१७८३	५५.८५	९३.०५	१००.००	आयोजना सम्पन्न भई Capitalization को प्रक्रियामा रहेको । Completion

									Certificate जारी गरिसकिएको ।
२	स्मार्ट मिटर्रीडिंग आयोजना (फेज २)		०.००	३४००००	०	०.००	०.००	०.००	बोलपत्र कागजात Concurrence को लागी एशियाली विकास बैङ्कमा पठाईएको ।
३	डाटातथा नियन्त्रण केन्द्र निर्माण आयोजना		९२.५६	७५००००	६७१३९५	८९.५२	५०.४७	७५.००	Pre Fabricated Data Center Building निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । IT Equipments को सामाग्रीहरु डेलिभरी भईसकेको । सिभिल कार्य अन्तर्गत केवल ट्रेन्चहरु, पम्प हाउस, अर्थिङ तथा ट्रान्सफर्मर जडानको कार्य सम्पन्न भई डाटा सेन्टर चार्जिङ गरी हाल टेस्टिङमा रहेको छ ।
४	विद्युतिय सवारी चार्जिङ स्टेशन पूर्वाधार तथा विकास आयोजना		९४.२६	४५१७८०	१८५५३५	४९.०७	०.४०	९५.००	देशका विभिन्न स्थानमा गरी कुल ५१ मध्ये ४६ वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको । थप ११ वटा चार्जर अर्डर गरिएको ।
ड	सासेक विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना	५०१०८१२८							
१	प्रदेशानं. २ ग्रामिण विद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुद्विडिकरण आयोजना		५३.००	११७००००	६४००२३	५४.७०	२५.८४	३०.५६	,३२,००० PSC Pole मध्ये १२,५०० थान PSC Pole गाड्ने कार्य सम्पन्न भएको १० वटा सबस्टेशन मध्ये १० वटै सबस्टेशनको सिभिल निर्माण कार्य चालु रहेको ।

२	खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सिफेदी ४०० केभी सबस्टेशन आयोजना		५२.३२	३०४००००	११४६५४५	३७.७२	२७.४९	३६.२४	न्यू खिम्ती तथा बाह्रबिसे सबस्टेशनमा Land Development, Counterfort Wall , २२० kV GIS Installation, Transformer Foundation लगायतका कार्य भईरहेको ।
	जम्मा :-		६७.३३	३१६९५०००	१८२४७०६०	५७.५७			


स्रोत	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
ADB Loan	२४,७१०,०००	१३,३८०,०६१	५४.१५
ADB Grant	२,३९०,०००	१,३८०,६४७	५७.७७
GON	१,५०२,५००	१,२७०,२९१	८४.५५
NEA	३,०९२,५००	२,२१६,०६१	७१.६६
Total	३१,६९५,०००	१८,२४७,०६०	५७.५७

५.८. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयः

५.८.१. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालयको कार्य विवरण :

१. पूर्वाधार तथा जलविद्युत विकास सम्बन्धी कार्यहरु,
२. जलविद्युत, पानीको बहुपक्षीय उपयोग वा अन्य पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ईन्जिनियरिङ्ग, वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्य,
३. ट्रान्सफर्मर तथा अन्य महत्वपूर्ण विद्युत सम्बन्धी यन्त्रहरुको परीक्षण र मर्मत सम्बन्धी कार्य,
४. गुणस्तरीय कंक्रीट पोलको उत्पादन र विक्री गर्ने सम्बन्धी कार्य,
५. जलविद्युतसंग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने कार्य,
६. जलविद्युत ईन्जिनियरिङ्ग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवसायिक सेवा व्यापारिक रुपमा प्रदान गर्ने कार्य,
७. प्राधिकरणको काममा बाधा नपुग्ने गरी विभिन्न उपकरण तथा भौतिक साधन/सुविधा पूर्वनिर्धारित दरमा अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने कार्य,
८. निर्देशनालय अर्न्तगतका विशेषज्ञ दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई निर्धारित पारिश्रमिक, ओभरहेड आदि लिई कामको विवरण र कार्यविधि तोकी सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराउने कार्य,
९. जलविद्युत विकास र सो संग सम्बन्धित काम संयुक्त रुपमा गर्ने कार्य,
१०. निर्देशनालय अर्न्तगतका सम्पूर्ण कार्यालय तथा आयोजनाहरुको अध्ययन अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य आदि ।

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय, सांगठनिक संरचना

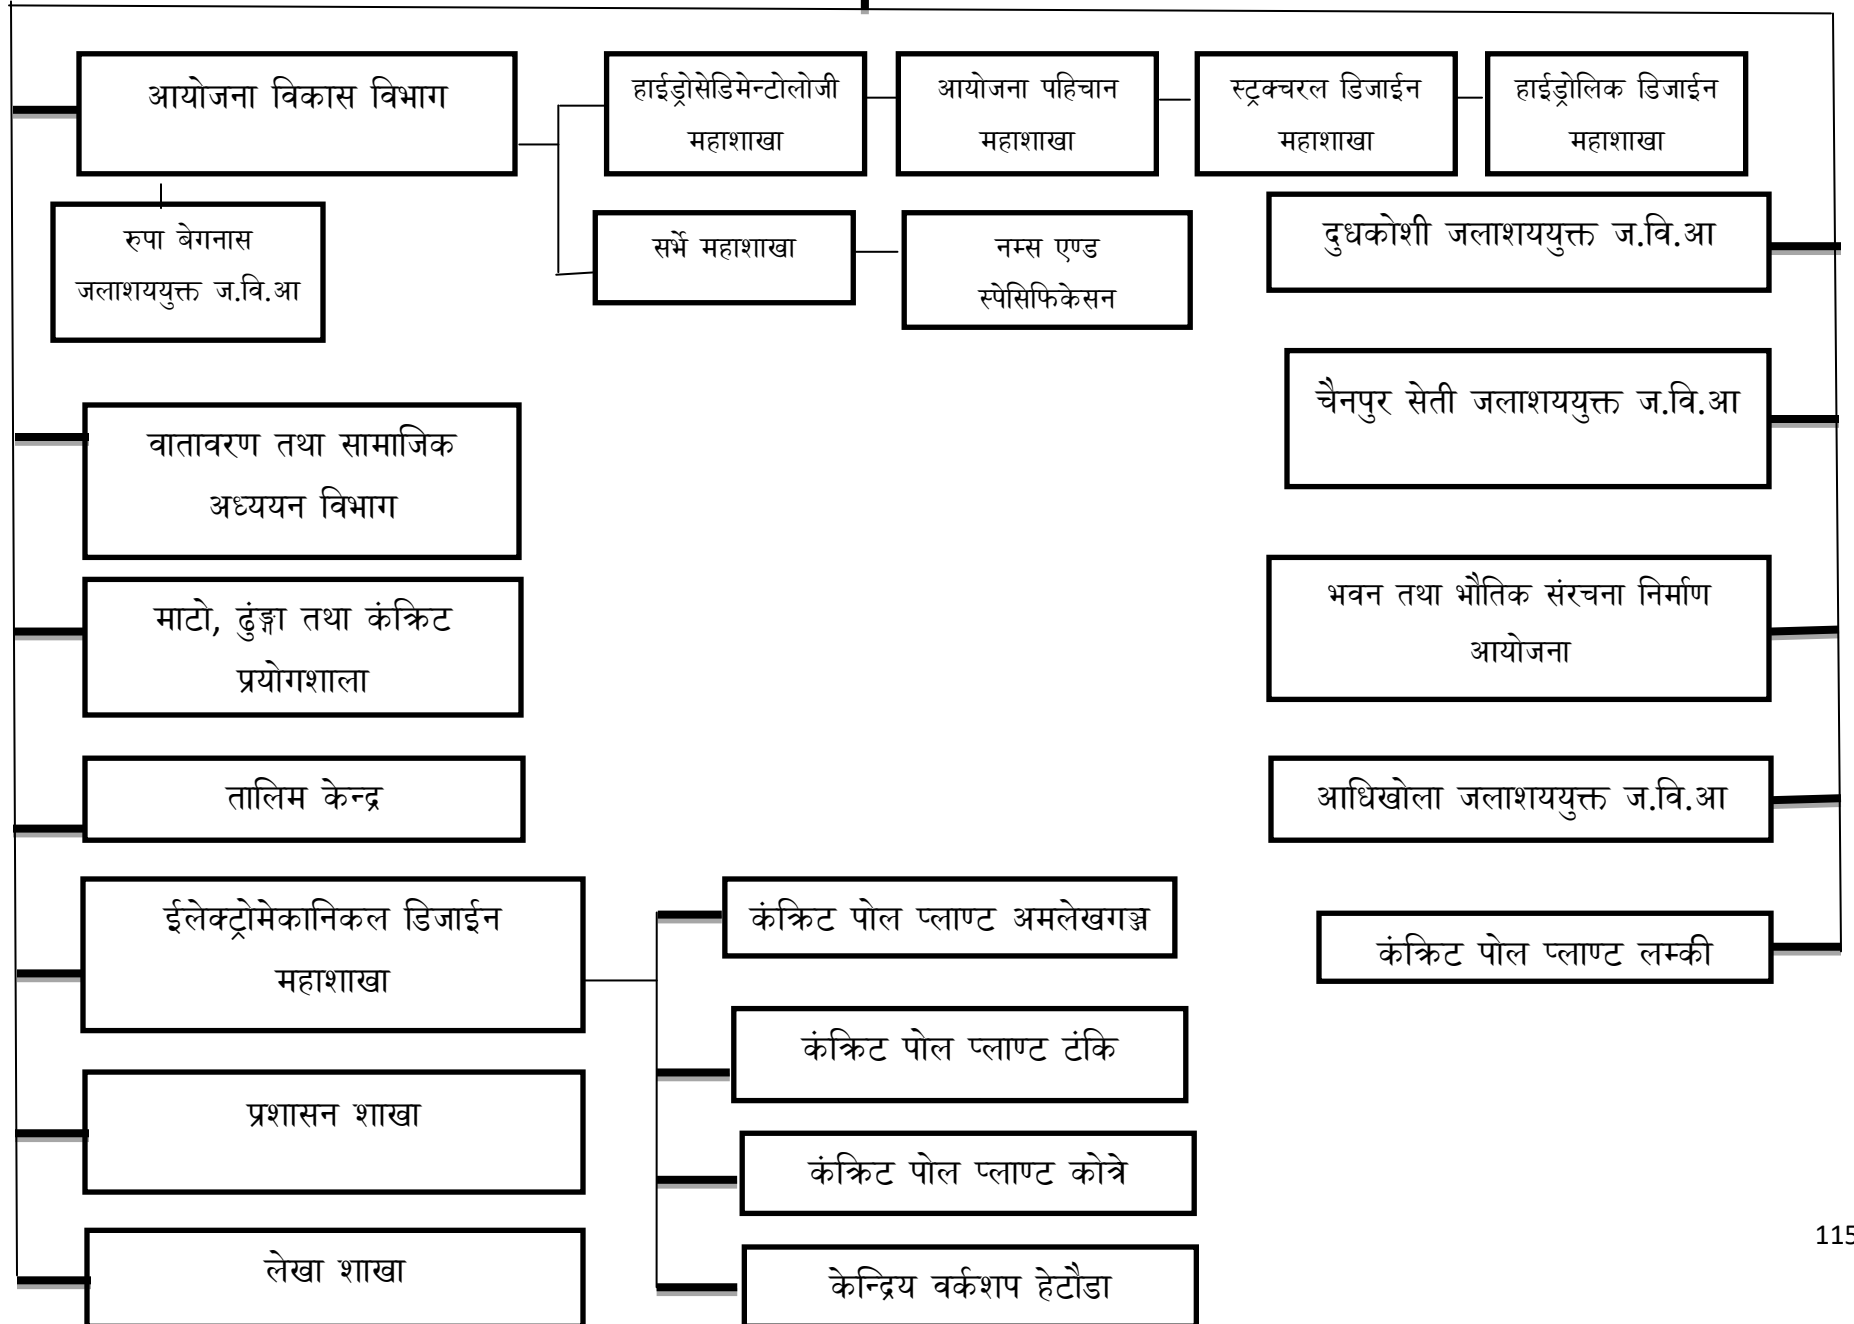

ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका आयोजनाहरुको नाम :

१. दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
२. भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आयोजना ।
३. चैनपुरसेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
४. रुपा बेगनास जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।
५. कुलेखानी-सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ।

५.८.४. ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय अर्न्तगतका कार्यालय प्रमुखहरु :

सि.नं.	कार्यालयको नाम	कार्यालय प्रमुखको नाम	फोन नं	मेल ठेगाना
१	श्री ईन्जिनियरिङ्ग सेवा निर्देशनालय	श्री रामजी भण्डारी	९८५६०२७६०८	engineering@nea.org.np
२	श्री आयोजना विकास विभाग/रुपा बेगनास जलाशययुक्त जविआ	श्री नसिवमान प्रधान	९८५११३२८७६	pdd@nea.org.np
३	श्री वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,	श्री अनिरुद्ध पौडेल	९८५१०८६७६४	env.social@nea.org. np
४	श्री माटो ढुङ्गा तथा कंक्रीट प्रयोगशाला, ने.वि.प्रा.।	श्री टिकाराम पौडेल	९८४१३९१७२०	srcl@nea.org. np
५	श्री तालिम केन्द्र, खरिपाटी	श्री मोतिलाल महतारा	९८५११७९२८३	trainning@nea.org. np
६	श्री ईलेक्ट्रो मेकानिकल डिजाइन महाशाखा			electromech@nea.org. np
७	श्री केन्द्रीय वर्कशप हेटौडा	श्री बुद्धिनाथ झा	९८४६०४१७९७	central.workshop@nea.org. np
८	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, अमलेखगञ्ज	श्री शम्मी कर्ण	९८५५०२४७०४	poleplant.amlekhganj@nea.org . np
	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, लम्की आयोजना	श्री परमार धिरसेन	९८५११९११८८	
९	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट, कोत्र तनह	श्री दिलिप यादव	९८५५०७५११३	poleplant.kotre@nea.org. np
१०	श्री दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना	श्री बसन्तध्वज श्रेष्ठ	९८१३४५८०१८	dkoshi@nea.org. np
११	श्री भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण आ	श्री सुबोध कुमार साह	९८४३२६३४५८	
१२	श्री कंक्रीट पोल प्लान्ट टंकि	श्री विमल चौधरी	९८५१०४२०६५	
१३	श्री चैनपुर सेती जलविद्युत आ.	श्री अनिल भक्त श्रेष्ठ	९८५१११४७८८	

Chainpur Seti Hydroelectric Project (210MW)

Chainpur Seti Hydroelectric Project (CSHEP) is Peaking Run off River type Hydropower project being developed in Seti River that is located in Saipal, Talkot and Mastha Rural-Municipality in the Bajhang District of Sudurpaschim Province. The project features includes 40 m high concrete gravity dam with four number of radial gates, three intake gate each of width 8 m and 3.5 m high are proposed. Three Underground desending basin each of length 130m and width 15m are proposed. Headrace Tunnel has total length of 12468m and finished diameter is 5.4 m. A surge shaft of 87.3 m high with 12.5m internal diameter is provided. Project has Penstock pipe of length 1575 m of 3.5 m diameter also steel lined pressure shaft of length 161.30m and diameter 2m is proposed. A semi surface powerhouse consisting of 3 units of Pelton turbine each of rated capacity of 70 MW and tailrace structures is proposed. The proposed headworks site is located about 150 m downstream from the confluence of the Seti River and Ghatganga River while the proposed powerhouse site lies near the Basti village on the right bank of Seti River. The project will generate a capacity of 210MW utilizing a net head of 474.49m and design discharge of 50.68 m³/s. Annual energy is about 1158.02 GWh with 6 hours daily peaking during dry period with dry peak energy generation of 219.50 GWh. The B/C Ratio is 1.53 and IRR of Project is 17.48%. The power generated from the project shall be connected to proposed 400/132 KV Bajhang Substation.



PROPOSED HEADWORKS AREA

The Project site is accessible via Attariya- Chainpur black topped road and an earthen track road of about 16 km connecting Chainpur to the proposed powerhouse site. The road connecting Chainpur Bazar to Taklakot is under construction with the fund of Government of Nepal (GoN). This road passes near project headworks area.

A review of feasibility study has been completed and Preparation of Engineering Procurement and Construction (EPC) tender document of the project is being carried out by Chilime Engineering Services Company Limited (ChesCo) and is at completion stage. The geotechnical investigation works like MASW, 2D-ERT, Core Drillings at proposed headworks site were completed. The Environmental Impact Assessment (EIA) Report of CSHEP has been approved by Ministry of Forests and Environment (MoFE). Access road to powerhouse and camp area is under Construction. Mobilization of contractor for construction of adit 3,5 and 6 tunnel of the project. The review of tender document of camp area is ongoing for bidding process. Distribution of compensation for land, house, fruits, trees and other acquired for Powerhouse and camp area is ongoing.

Building and Physical Infrastructure Construction Project

1. Introduction

The Nepal Electricity Authority, one of the largest organizations in Nepal, was formed by merging the Electricity Department, the Nepal Electricity Corporation, and various Development Boards in 1985. At the central level, NEA is divided into various Directorates consisting of Departments and Divisions. The existing office space in the NEA head office complex at Durbarmarg is not adequate to accommodate all the central offices due to haphazard space planning and the layout of existing old buildings.

For optimum utilization of land located at prime locations, NEA established the new project named Building and Physical Infrastructure Construction Project (BPICP) on 2074/06/09. The main objective of this project is to construct the corporate office building at Durbarmarg and other similar infrastructure all over Nepal.

Corporate Office Building (COB)

BPICP has revised the architectural drawing of COB in accordance with the instruction of then Managing Director, Mr. Hitendra Dev Shakya, of Nepal Electricity Authority, to meet the by-laws of Ministry of Urban Development (MOUD) by limiting the total height of the building to 30 m. In this Design, The MoUD had approved the Initial Environmental Examination (IEE) Report. BPICP had presented slide about design and drawing at the 881st Board Meeting of NEA, held on 31st Bhadra 2078. The Board had instructed to resubmit the design after an in-depth discussion with concerned bodies ie. Kathmandu Metropolitan City, MoUD, etc.

New Office Buildings at Bhagwanpau and Lainchaur

NEA Board Meeting held on 31st Bhadra 2078, had decided to initiate the construction of NEA Office buildings at Lainchaur and Bhagwanpau. BPICP published the notice of Invitation for Bid (IFB) in the national daily Gorakhapatra on 2078/10/21. The Bid Evaluation Committee had submitted the Evaluation report on 9 th Baishakh 2079. BPICP had published the Notice of Price Bid Opening on National Daily Gorkhapatra of 2079/01/13. The Contract Agreement between BPICP and Contractor had been endorsed on 3rd July 2022. Due to hindrance in site clearance at Swayambhu and lainchaur, the site mobilization is work is not yet commenced. However, BPICP is trying to clear the site before 14th Aswin 2079.

प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष २०७९।०८०

१.आयोजना विकास विभागबाट सम्पादन गरीएका कामको विवरण २०७९-०८०:

१. सुनकोशी-३, जवा तिला र Syarpu Pumped Storage Project को सर्वेक्षण लाईसेन्स प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा निवेदन दर्ता ।
२. सुनकोशी-३ को परामर्शदाता नियुक्तीका लागि EoI Document तयार गर्ने कार्य सम्पन्न ।
३. कर्णाली चिसापानीको EoI Document Reviewed गर्ने कार्य भईरहेको ।
४. १५ वटा Pumped Storage Project को Identification र Ranking गर्ने कार्य ।
५. विभिन्न निर्देशनालयसंग सम्बन्धित Survey सम्बन्धित ३०/३५ आयोजनाहरुको Survey सम्पन्न गरीएको ।
६. Need Assessment of Pumped storage project सम्बन्धि कार्य ।
७. वि.ग्रा.से.नि., प्रशासन र अरु निर्देशनालयहरुलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाहरु उपलब्ध गराईएको ।

२. तालिम केन्द्रको कार्य विवरण: आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा तालिम केन्द्रले अधिकृतस्तर ६२९ र सहायक स्तर १४५६ गरी जम्मा २०८५ जनालाई तालिम प्रदान गरेको ।

३. माटो ढुंगा तथा कंक्रीट प्रयोगशालाबाट समपन्न कार्य विवरण २०७९-०८० :

१. अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन कार्य ८०% सम्पन्न
 - i) ड्रिलिङ कार्य तर्फ २८ वटा Hole गरि जम्मा ३३००मि.
 - ii) Test Audit Tunnel को बाँकी १६० मि. मध्ये ६३ मि. निर्माण भई अब ९२ मि. मात्र बाँकी रहेको ।
 - iii) Geophysical Survey, Televier Scan तथा भौगर्भिक नक्साहरू बनाउने काम सम्पन्न भएको।
२. विभिन्न Transmission Line र Substation हरूको भौगर्भिक अध्ययन कार्य पुरा भएको।
 - धरान, बोदेबसाईन, सुखिपुर, लहान, चन्द्रपुर, केरौँ substation को अध्ययन पुरा भएको।
३. चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको बांधस्थल (Dam), विद्युत गृह तथा सर्जिङ क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन पुरा भएको।
४. उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको भौगर्भिक अध्ययन गत वर्षनै सम्पन्न भएको।
५. निजिक्षेत्रबाट अनुरोध भए अनुसारका भौगर्भिक अध्ययन तथा प्रयोगशाला परीक्षणका कामहरू सम्पन्न भईसकेको।
६. Lower Solu जलविद्युत आयोजनाको Drilling तथा Televier गरि सबै काम समयमै सम्पन्न गरेको।
७. Kathmandu Valley प्रसारण लाईनको भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पन्न हुनै लागेको

४.नेपाल विद्युत प्राधिकरण वातावरण-तथा सामाजिक अध्ययन विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न गरेका कार्यहरूको विवरण :

- विभागले ४८ वटा आयोजनाको अध्ययन/अनुगमनको कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
- यस बाहेक दातृ निकायको लगानी रहेको मर्स्याङ्गदी करिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको समिष्टगत प्रभाव मूल्याङ्कन (BIA)/जनजाती (IP)

सम्बन्धी अध्ययन र उर्जा दक्षता आयोजनाको ESMP तयार भई सम्बन्धीत बैंक मार्फत clearance पनि प्राप्त भइसकेको छ ।

- यो अवधिमा एउटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृत हुने अवस्थामा रहेको छ। दुई वटा आयोजनाको SEIA स्वीकृत भएको छ भने एउटाको SEIA तयार हुँदैछ। सोही अवधिमा आठ वटा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन्।
- दश वटा आयोजनाहरूको IEE को कार्यसूची (ToR) स्वीकृत भइसकेका छन्।

५. अन्य कार्यालयबाट सम्पादित कार्य

१. चारवटा पझल प्लाण्टबाट ८ मिटर, ९ मिटर र ११ मिटरको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जम्मा ३५९८३ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जम्मा ६०६८८ पोल उत्पादन तथा बिक्रि भएको ।

केन्द्रिय वर्कसप हेटौँडाको कार्य विवरण:

- आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा वितरण ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १५०१ थान पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार जम्मा १० थान वितरण ट्रान्सफरमर टेष्टिङ्ग जम्मा ९२५१ थान सिटी पिटी टेष्ट ११८ थान
- केन्द्रिय वर्कसप हेटौँडामा 63MVA, 220KV सम्मका पावर ट्रान्सफरमर मर्मत संभार तथा टेष्टिङ्ग कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मेशिन उपकरण खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान भई अप्रिल ५, २०२३ मा ठेक्का सम्झौता भैसकेको । हाल ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत ठेकेदारबाट आपूर्ति गरिने उपकरणहरू Design Drawing पेश भैरहेको ।
- CT/PT तथा HT Metering Unit Testing का लागि आवश्यक टेष्टिङ्ग उपकरण खरीद, जडान तथा संचालन गरिएको ।
- मर्मत संभार हुन नसक्ने भई किटान भएका २० थान पावर ट्रान्सफरमरहरूको लिलाम बिक्री मार्फत रु. ५१०,७५,९९८।८७ आम्दानी गरिएको ।
- भौतिक परीक्षणबाट लिलाम बिक्री गर्न ठहरिएका लिलाम योग्य स्थिर सम्पत्ति र स्क्र्याप मालसामानको बिक्रि मार्फत रु. ७५९,९४,४५६।५३ आम्दानी भएको ।

६. ऐन, नियम एवं विनियमहरूको सूची

ने.वि.प्रा.का प्रचलित ऐनहरू

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१
- विद्युत ऐन, २०४९
- विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४
- विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८

अन्य प्रासंगिक ऐनहरू

- जलश्रोत ऐन, २०४९
- सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
- श्रम ऐन, २०७४
- जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
- वन ऐन, २०७६
- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४

नियमावली तथा विनियमावली :

- विद्युत नियमावली, २०५०
- विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ (संसोधन सहित)
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०७५
- ने.वि.प्रा. विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९
- ने.वि.प्रा. विद्युत दुर्घटना क्षतिपुर्ति विनियमावली, २०६७
- ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७८
- ने.वि.प्रा. भ्रमण खर्च विनियमावली, २०६५
- ने.वि.प्रा. विद्युत चुहावट नियन्त्रण विनियमावली, २०५०
- ने.वि.प्रा. सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण विनियमावली, २०७१

अन्य प्रासंगिक नियमावली

- जलश्रोत नियमावली, २०५०
- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
- वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
- श्रम नियमावली, २०७५
- सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) नियमावली, २०६५
- सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५
- वन नियमावली, २०७९

